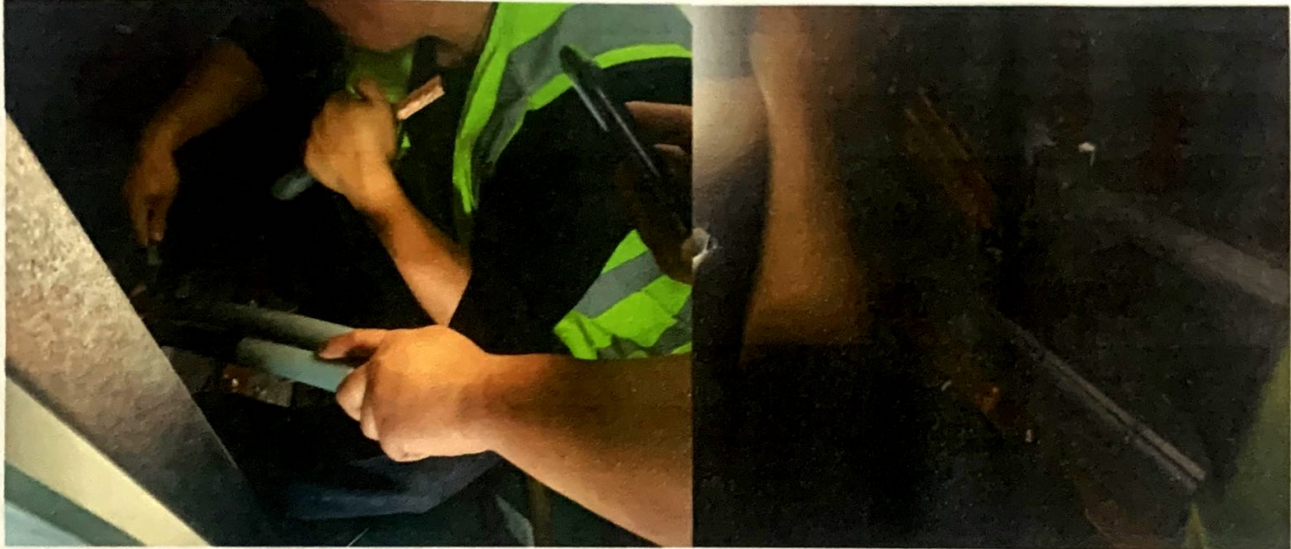


旁站监理记录表

工程名称:星恒电源(滁州)有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-PZJL-014

日期及气候: 2021 年 5 月 15 日	工程地点: 星恒电源(滁州)有限公司
旁站监理的部位或工序: 3*240 电缆头制作(并网柜)	
旁站监理开始时间: 2021.05.15 8:30	旁站监理结束时间: 2021.5.15 11:00
施工情况: 准备: 1、浙江西子联合工程有限公司负责人徐江, 施工人员 6 人。2、主要设备: 电缆剥皮削刀、铜接头、压钳、锯钢甲; 施工工艺: 电缆头防潮→手、工具、材料清洁→电缆附件预先试装→剥皮绝缘层→铜屏蔽层处理→清洁主绝缘层表面→安装半导体管→接线。	
	
监理情况: 1、施工前对班组进行安全技术交底; 2、检查施工方人料机准备情况; 3、电缆敷设接线时要求施工方按施工方案组织施工, 管理人员到位; 4、检查施工材料是否完好; 5、制作旁站监督工作, 要求制作人员持证上岗。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备 注:	
施工项目部: 浙江西子联合工程有限公司 质 检 员: 徐军 日 期: 2021年5月15日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 唐剑 日 期: 2021年5月15日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。
