


旁站监理记录表

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目


编号：GFDZJBM30-TJCC-JLPZ-03

日期及气候：2021.12.15 晴. -1° -8°	施工地点： 3#车间厂房
旁站监理的部位或工序：3#车间低压电缆敷设	
旁站监理开始时间：2021.12.15 09:00	旁站监理结束时间：2021.12.15 16:00
施工情况： 1、电缆桥架高出地面 2.2m 以上。 2、电缆桥架水平敷设支撑在 1.5-3m 之间，垂直敷设固定支撑小于 2m，符合有关要求。 3、缆线布放自然平直，无扭绞、挤压和损伤现象。 4、缆线两端贴有标签、、标明编号。 5、施工现场安全监护人到位，施工人员 5 人。	
监理检测结果： 1、电缆弯曲半径符合规范要求。 2、电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔 1.5m 处已固定在桥架上。 3、水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及间隔 5-10m 已固定。	
发现问题：部分桥架连接处存在毛刺。	
处理意见：要求施工现场人员进行整改，否则不得进行电缆敷设。	
备注（包括处理结果）：已进行打磨。	
施工项目部： 质检员：  日期：2021年12月15日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：  日期：2021年12月15日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份



扫描全能王 创建

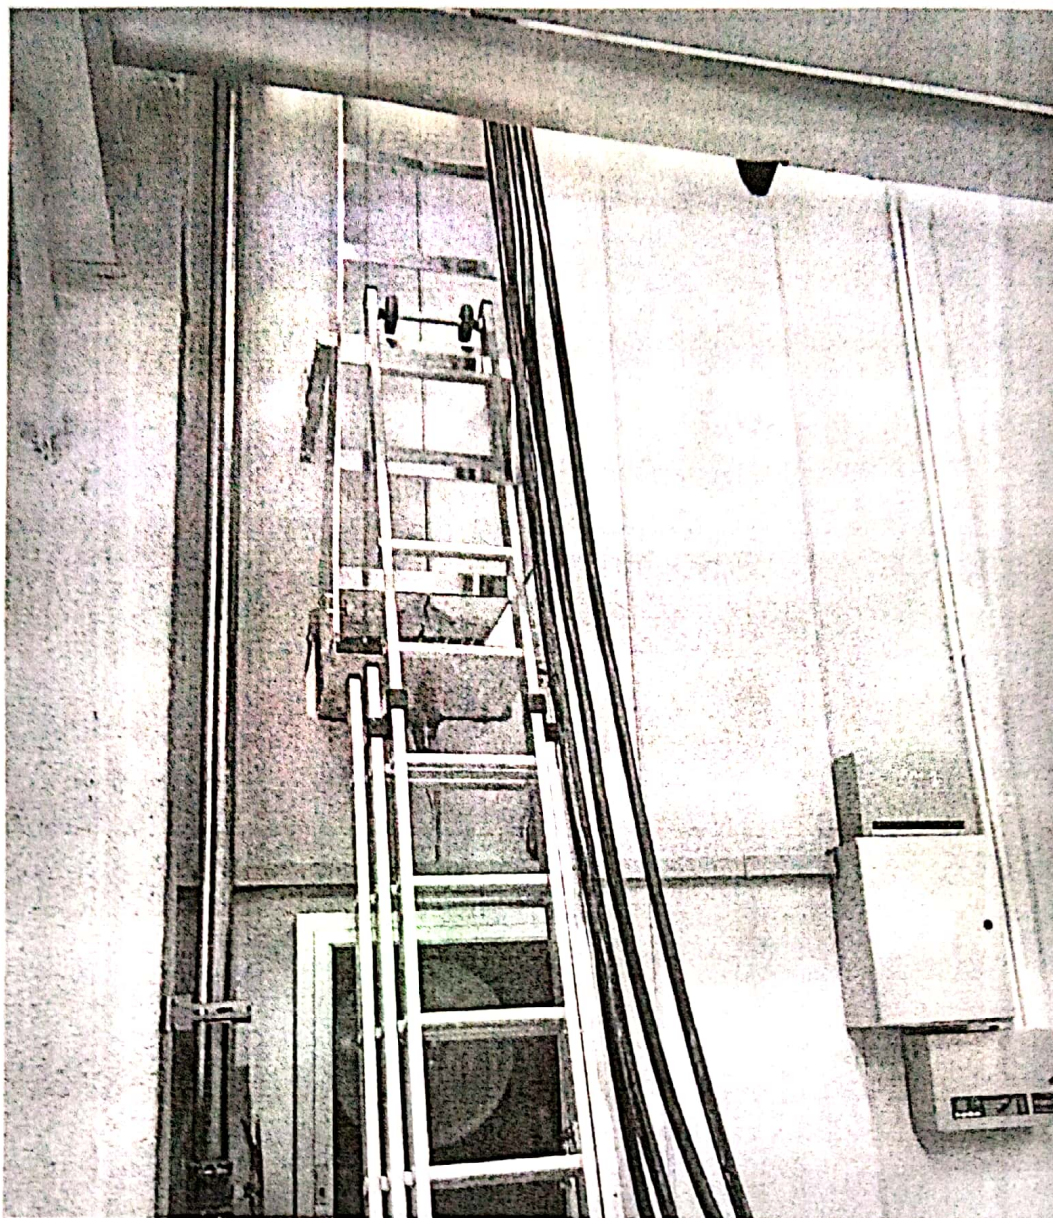

3#电缆敷设

