

旁站监理记录表

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目


编号：GFDZJBM30-TJCC-JLPZ-08

日期及气候：2021.12.30 晴，-5° 6°	施工地点：3#车间厂房
旁站监理的部位或工序：3#车间低压电缆敷设	
旁站监理开始时间：2021.12.30 13:00	旁站监理结束时间：2021.12.30 17:10
施工情况： 1、电缆桥架高出地面 2.2m 以上。 2、电缆桥架水平敷设支撑在 1.5-3m 之间，垂直敷设固定支撑小于 2m，符合有关要求。 3、缆线布放自然平直，无扭绞、挤压和损伤现象。 4、缆线两端贴有标签、标明编号。 5、施工现场安全监护人到位，施工人员 8 人。	
监理检测结果： 1、电缆弯曲半径符合规范要求。 2、电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔 1.5m 处已固定在桥架上。 3、水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及间隔 5-10m 已固定。	
发现问题：无。	
处理意见：无。	
备注：低压电缆敷设时对电缆桥架三通、弯头处做保护处理。	
施工项目部： 质检员 日期：2021年12月30日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 日期：2021年12月30日

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存 1 份



扫描全能王 创建

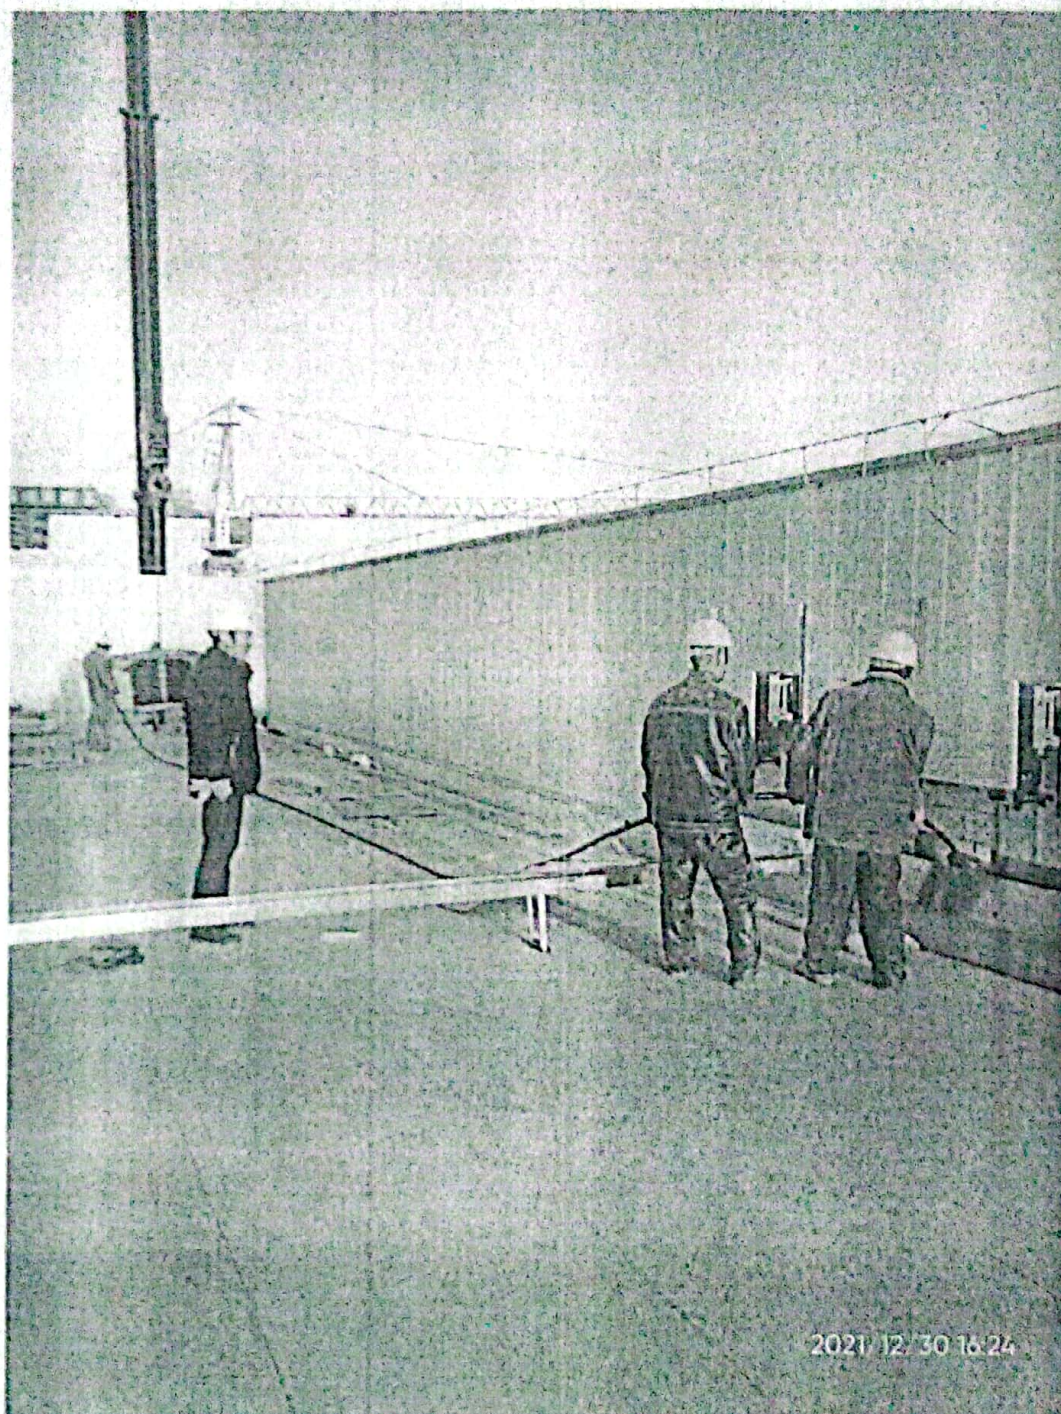

3#电缆敷设

