

旁站监理记录表

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号:

JXM9-JLPZ-GF-001

日期及气候: 2021.04.15 阴 0℃-15℃	施工地点: 9#方阵
旁站监理的部位或工序: 9#支架基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2021.04.15 8:20	旁站监理结束时间: 2021.04.15 12:50
施工情况: 1、施工人员 24 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; 2、砼为商品混凝土 c30, 装载机二次转运, 连续浇筑; 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估。 4、混凝土浇筑过程符合设计要求; 5、设备投入: 水泥罐车一辆、钻机一台、铲车一辆及其它小型辅助工具。	
监理情况: 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30; 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; 3、现场检查塌落度实测值为 200mm; 4、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况, 快插慢提, 振捣密实; 6、留试块 10 组。	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果):	
项目监理机构: 常州正衡电力工程 监理有限公司 旁站监理人员: 张建忠 日期: 2021 年 6 月 15 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



精心施工



复查



细心测量



精心振捣



检查



复测

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-JLPZ-004

日期及气候: 2021.04.15 阴 0℃-15℃	施工地点: 9#
旁站监理的部位或工序: 9#支架基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2021.04.15 8:20	旁站监理结束时间: 2021.04.15 12:50
施工情况: 1、施工人员 24 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; 2、砼为商品混凝土 c30, 装载机二次转运, 连续浇筑; 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估。 4、混凝土浇筑过程符合设计要求; 5、设备投入: 水泥罐车一辆、钻机一台、铲车一辆及其它小型辅助工具。	
监理情况: 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30; 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; 3、现场检查塌落度实测值为 200mm; 4、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况, 快插慢提, 振捣密实; 6、留试块 10 组。	
发现问题: 预埋钢管内有混凝土	
处理意见: 钢管底部进行封堵	
备注 (包括处理结果): 符合要求	
项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 张建忠 日期: 2021年04月15日	

填报说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存 1 份



精心施工



复查



细心测量



精心振捣



检查



复测

旁站监理记录表

工程名称:北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号:JXM9-JLPZ-GF-002

日期及气候: 2021.04.16 雪转多云 1℃-13℃	施工地点: 5#方阵
旁站监理的部位或工序: 5#支架基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2021.04.16 14:20	旁站监理结束时间: 2021.04.16 17:10
施工情况: 施工情况: 1、施工人员 18 人, 质检员进行施工前技术交底; 2、砼为商品混凝土 c30, 人工连续浇筑; 3、安全员到岗检查安全措施落实; 4、混凝土浇筑过程符合设计要求; 5、设备投入: 砼罐车 2 辆、装载机 2 台、小型震动棒 2 台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法: 布料→振实→平整→压实→压光→养护; 7、浇筑时, 布料与振捣配合工作由熟练技工担当, 振捣棒快插慢拔, 每个振捣点振捣时间为 10-30s, 当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。	
监理情况: 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30, 配合比、塌落度符合要求; 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; 3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况, 快插慢提, 振捣密实; 4、留试块 3 组。	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果):	
项目监理机构: 常州正衡电力工程 监理有限公司 旁站监理人员: 张建志 日期: 2021 年 4 月 16 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____



振捣



收光



测量



施工



检查



复测

旁站监理记录表

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号：JXM9-JLPZ-002

日期及气候：2012/04.16 雪转多云 1℃-13℃	施工地点：5#方阵
旁站监理的部位或工序：5#支架基础浇筑	
旁站监理开始时间：2021.04.16 14:20	旁站监理结束时间：2021.04.16 17:10
施工情况： 施工情况： 1、施工人员 18 人，质检员进行施工前技术交底； 2、砼为商品混凝土 c30，人工连续浇筑； 3、安全员到岗检查安全措施落实； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：砼罐车 2 辆、装载机 2 台、小型震动棒 2 台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护； 7、浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30，配合比、塌落度符合要求； 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况，快插慢提，振捣密实； 4、留试块 3 组。	
发现问题：砼振捣不均	
处理意见：砼浇筑快插慢提，不翻气泡停止振捣	
备注（包括处理结果）：符合要求	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张建忠 日期：2021年4月16日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存一份



振捣



收光



测量



施工



检查



复测

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-JLPZ-GF-003

日期及气候: 2012. 04. 19 晴 0℃-28℃	施工地点: 17#方阵
旁站监理的部位或工序: 17#支架基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2021. 04. 19 8:20	旁站监理结束时间: 2021. 04. 19 11:50
施工情况: 施工情况: 1、施工人员 19 人, 质检员进行施工前技术交底; 2、砼为商品混凝土 c30、人工连续浇筑; 3、安全员到岗检查安全措施落实; 4、混凝土浇筑过程符合设计要求; 5、设备投入: 砼罐车 1 辆、装载机 2 台、小型震动棒 2 台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法: 布料→振实→平整→压实→压光→养护; 7、浇筑时, 布料与振捣配合工作由熟练技工担当, 振捣棒快插慢拔, 每个振捣点振捣时间为 10-30s, 当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。	
监理情况: 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30、配合比、塌落度符合要求; 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; 3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况, 快插慢提, 振捣密实; 4、留试块 3 组。	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果):	
项目监理机构 : 常州正衡电力工程 代理有限公司 旁站监理人员: <u>张进忠</u> 日 期: 2021 年 4 月 19 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____



叫做



检查



测量



施工



灌注



振捣

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-JLPZ-GF-004

日期及气候: 2012.04.20 晴 5℃-24℃	施工地点: 1#方阵
旁站监理的部位或工序: 1#支架基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2021.04.20 8:30	旁站监理结束时间: 2021.04.20 12:00
施工情况: 施工情况: 1、施工人员 20 人, 质检员进行施工前技术交底; 2、砼为商品混凝土 c30、人工连续浇筑; 3、安全员到岗检查安全措施落实; 4、混凝土浇筑过程符合设计要求; 5、设备投入: 砼罐车 2 辆、装载机 2 台、小型震动棒 2 台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法: 布料→振实→平整→压实→压光→养护; 7、浇筑时, 布料与振捣配合工作由熟练技工担当, 振捣棒快插慢拔, 每个振捣点振捣时间为 10-30s, 当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。	
监理情况: 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30、配合比、塌落度符合要求; 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; 3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况, 快插慢提, 振捣密实; 4、留试块 3 组。	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果):	
项目监理机构: 常州正衡电力工程 监理有限公司 旁站监理人员: 张通志 日期: 2021 年 0 月 20 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-JLPZ-001-04

日期及气候: 2021.04.20 晴 5℃-24℃	施工地点: 1#方阵
旁站监理的部位或工序: 1#支架基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2021.04.20 8:30	旁站监理结束时间: 2021.04.20 12:00
施工情况: 施工情况: 1、施工人员 20 人, 质检员进行施工前技术交底; 2、砼为商品混凝土 c30、人工连续浇筑; 3、安全员到岗检查安全措施落实; 4、混凝土浇筑过程符合设计要求; 5、设备投入: 砼罐车 2 辆、装载机 2 台、小型震动棒 2 台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法: 布料→振实→平整→压实→压光→养护; 7、浇筑时, 布料与振捣配合工作由熟练技工担当, 振捣棒快插慢拔, 每个振捣点振捣时间为 10-30s, 当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。	
监理情况: 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30、配合比、塌落度符合要求; 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; 3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况, 快插慢提, 振捣密实; 4、留试块 3 组。	
发现问题: 个别桩基表面浮浆清理不干净	
处理意见: 按图施工, 浮浆清理至原始地貌	
备注 (包括处理结果): 合格	
项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 张立忠 日期: 2021年04月26日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1份




收光



振捣



灌注

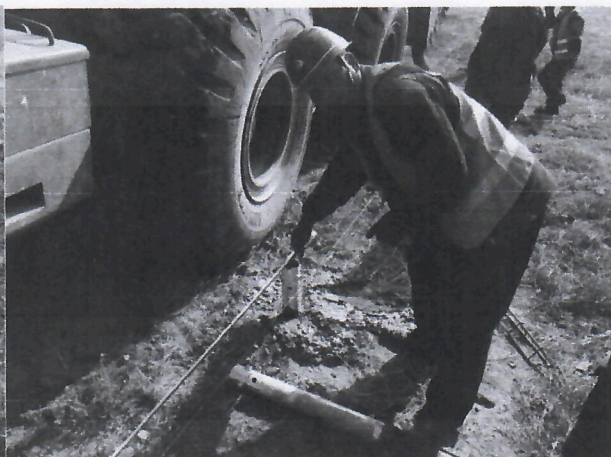

质量控制



浇筑



施工

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-JLPZ-GF-005

日期及气候: 2012.04.25 晴 6℃-19℃	施工地点: 7#方阵
旁站监理的部位或工序: 7#支架基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2021.04.25 08:20	旁站监理结束时间: 2021.04.25 12:00
施工情况: 施工情况: 1、施工人员 20 人, 质检员进行施工前技术交底; 2、砼为商品混凝土 C30、人工连续浇筑; 3、安全员到岗检查安全措施落实; 4、混凝土浇筑过程符合设计要求; 5、设备投入: 砼罐车 1 辆、装载机 2 台、小型震动棒 2 台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法: 布料→振实→平整→压实→压光→养护; 7、浇筑时, 布料与振捣配合工作由熟练技工担当, 振捣棒快插慢拔, 每个振捣点振捣时间为 10-30s, 当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。	
监理情况: 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 C30、配合比、塌落度符合要求; 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; 3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况, 快插慢提, 振捣密实; 4、留试块 3 组。	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果):	
项目监理机构: 常州正衡电力工程 监理有限公司 旁站监理人员: 张进志 日期: 2021 年 4 月 21 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____

旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-JLPZ-067 05

日期及气候: 2021.04.25 晴 6℃-19℃	施工地点: 16#方阵
旁站监理的部位或工序: 16#支架基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2021.04.25 13:20	旁站监理结束时间: 2021.04.25 18:30
施工情况: 施工情况: 1、施工人员 19 人, 质检员进行施工前技术交底; 2、砼为商品混凝土 C30、人工连续浇筑; 3、安全员到岗检查安全措施落实; 4、混凝土浇筑过程符合设计要求; 5、设备投入: 砼罐车 1 辆、装载机 2 台、小型震动棒 2 台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法: 布料→振实→平整→压实→压光→养护; 7、浇筑时, 布料与振捣配合工作由熟练技工担当, 振捣棒快插慢拔, 每个振捣点振捣时间为 10-30s, 当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。	
监理情况: 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 C30、配合比、塌落度符合要求; 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; 3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况, 快插慢提, 振捣密实; 4、留试块 3 组。	
发现问题: 振捣时间不够	
处理意见: 适当延长振捣深度	
备注 (包括处理结果):	
项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 张连安 日期: 2021年4月25日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1份



旁站



振捣

