

旁站监理记录表


工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号：JXM9-JLPZ-002

日期及气候：2021.04.23 晴 5℃-20℃	施工地点：ABN68#铁塔
旁站监理的部位或工序：ABN68#铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：2021.04.23 8:20	旁站监理结束时间：2021.04.23 12:20
施工情况： 施工情况： 1、施工人员 15 人（木工 5 人、浇筑人员 10 人）； 2、砼为商品混凝土 c30、人工连续浇筑； 3、安全员到岗检查安全措施落实、质检员进行施工前技术交底； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：砼罐车 3 辆、泵车 1 辆、50 震动棒 2 台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护； 7、浇筑时，砼罐车到场，泵车布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。混凝土配比手续齐全； 2、检查商品混凝土 c30、配合比符合要求，现场检测砼塌落度，符合要求； 3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况，快插慢提，振捣密实； 4、要求木工时刻检查模板，防止涨模； 5、留试块 2 组。	
发现问题：砼振捣不均，塔座柱振捣时间不够	
处理意见：要求振捣时，砼不翻浆时停止	
备注（包括处理结果）：符合要求	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张立建 日期：2021 年 04 月 23 日	


填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份



检查试块制作

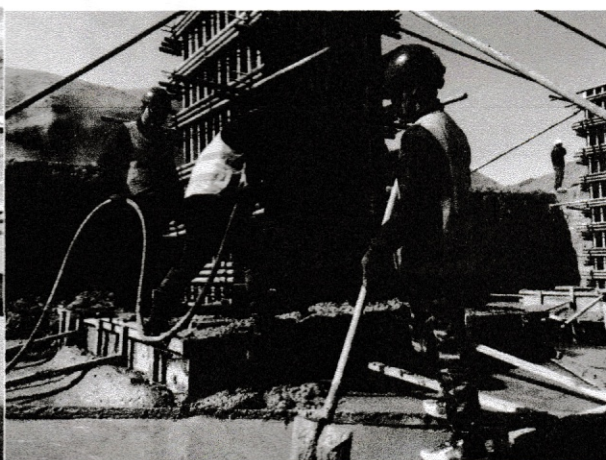


振捣

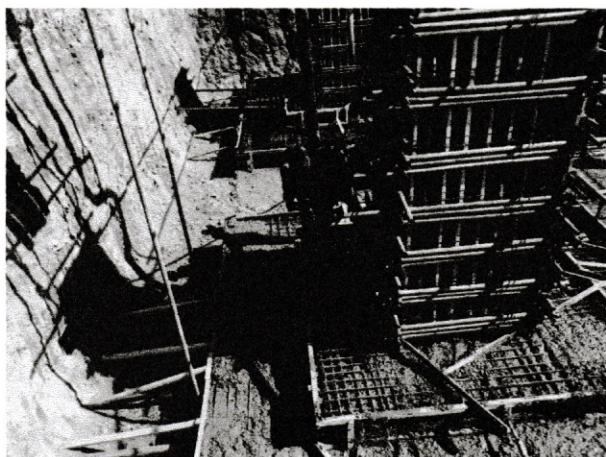


浇筑



旁站

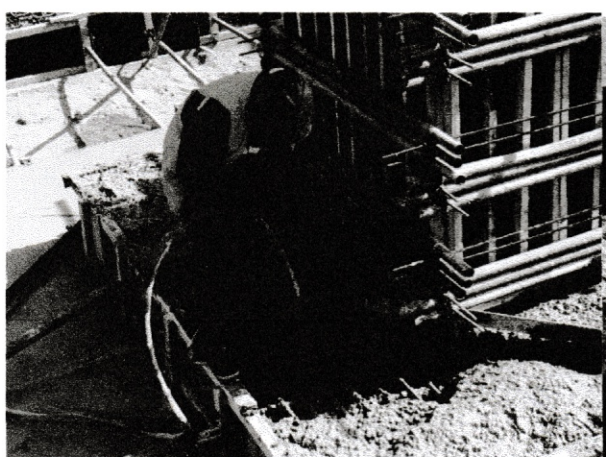


精心施工

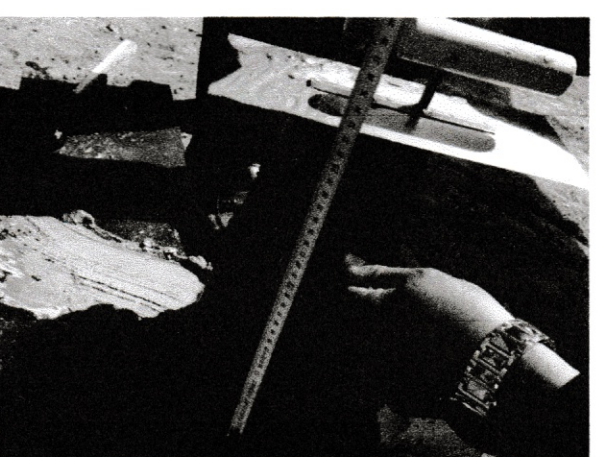


塌落度检查



收光

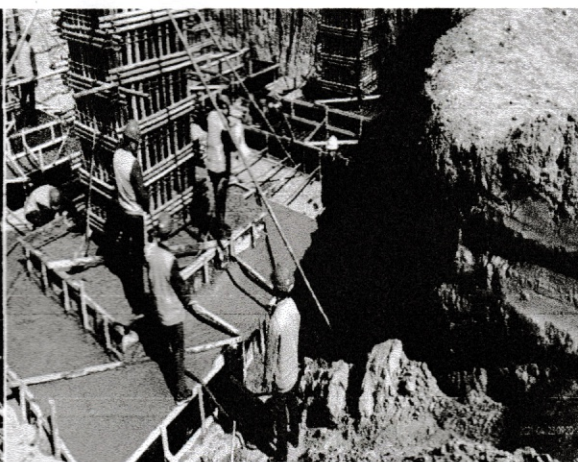

配合

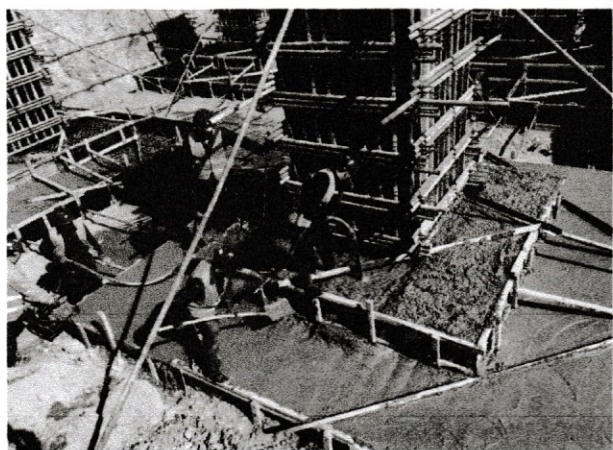

密实振捣



塌落度 12cm



浇筑



试块制作
