


旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-JLPZ-005

日期及气候: 2021.04.24 晴 5℃-18℃	施工地点: BN4#铁塔
旁站监理的部位或工序: BN4#铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2021.04.24 14:20	旁站监理结束时间: 2021.04.24 18:20
施工情况: 1、施工人员 12 人 (木工 4 人、浇筑人员 7 人); 2、砼为商品混凝土 c30、人工连续浇筑; 3、安全员到岗检查安全措施落实、质检员进行施工前技术交底; 4、混凝土浇筑过程符合设计要求; 5、设备投入: 砼罐车 1 辆、吊车 1 辆 50 震动棒 2 台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法: 布料→振实→平整→压实→压光→养护; 7、浇筑时, 砼罐车到场, 布料与振捣配合工作由熟练技工担当, 振捣棒快插慢拔, 每个振捣点振捣时间为 10-30s, 当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。	
监理情况: 1、浇筑申请已批复。混凝土配比手续齐全; 2、检查商品混凝土 c30、配合比符合要求, 现场检测砼塌落度, 符合要求; 3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况, 快插慢提, 振捣密实; 4、要求木工时刻检查模板, 防止涨模; 5、留试块 2 组。	
发现问题: 砼振捣不均匀, 砼浇筑振捣时间不足	
处理意见: 要求立即延长振捣时间	
备注 (包括处理结果): 塌落度 180mm	
项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 张建东 日期: 2021 年 04 月 24 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1/1

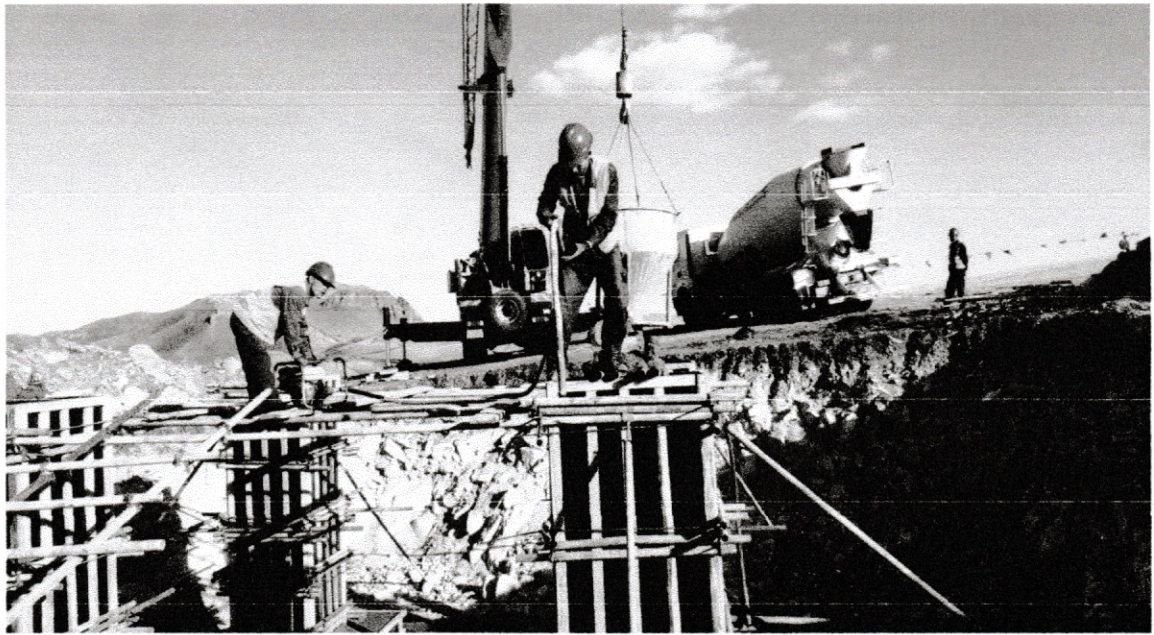

震搗



收光



塌落度测试



试块制作
