

旁站监理记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目


编号:JXM9-ZLPZ-134

| | | | |
|---|-------------------|--------|-------------------|
| 旁站的关键部位、工序 | 15#箱变高压电缆头制作 | 施工单位 | 湖南鸿源电力建设有限公司 |
| 旁站开始时间 | 2021年11月30日15时40分 | 旁站结束时间 | 2021年11月30日16时00分 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： <p>施工前监理人员检查施工单位资质和作业人员资格情况，检查施工单位作业指导书报审情况，检查施工单位安全和技术交底情况，检查施工设备、工具、材料准备情况，检查电缆型号、电压等级和绝缘情况，检查现场的安全措施落实情况，经检查以上均符合要求。</p> <p>施工人员2人、安全员、技术员各1人已到位，液压钳、线鼻子、3M管、胶带等工具和材料已到位，由施工单位负责人对现场施工人员进行安全和技术交底，然后开始施工，施工严格按规范设计、工艺要求和安装说明书制作（制作顺序为：电缆预处理→安装接地线→安装三叉手套→安装冷缩直管→终端安装准备→安装接线端子→安装冷缩式终端），制作过程符合规范设计和工艺要求，制作完成后检查电缆头制作质量，符合要求。</p> | | | |
| 发现的问题及处理情况： <p>无</p> | | | |
| 旁站人员（签字） <u>李鹤军</u> 日期 2021年11月30日 | | | |

注：本表一式一份，监理机构留存。



扫描全能王 创建

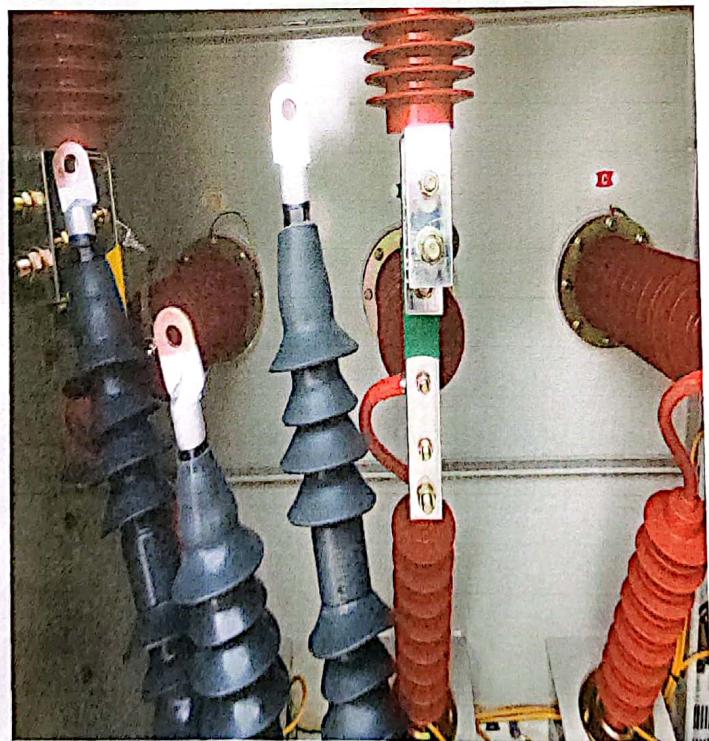

扫描全能王 创建
