

旁站监理记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM9-ZLPZ-146

旁站的关键部位、工序	27 区箱变高压接头制作	施工单位	安徽元正新能源电力有限公司
旁站开始时间	2021 年 12 月 9 日 8 时 0 分	旁站结束时间	2021 年 12 月 9 日 12 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工前监理人员检查施工单位资质和作业人员资格情况，检查施工单位作业指导书报审情况，检查施工单位安全和技术交底情况，检查施工设备、工具、材料准备情况，检查电缆型号、电压等级和绝缘情况，检查现场的安全措施落实情况，经检查以上均符合要求。

施工人员 2 人、安全员、技术员各 1 人已到位，液压钳、线鼻子、3M 管、胶带等工具和材料已到位，由施工单位负责人对现场施工人员进行安全和技术交底，然后开始施工，施工严格按规范设计、工艺要求和安装说明书制作（制作顺序为：电缆预处理→安装接地线→安装三叉手套→安装冷缩直管→终端安装准备→安装接线端子→安装冷缩式终端），制作过程符合规范设计和工艺要求，制作完成后检查电缆头制作质量，符合要求。

发现的问题及处理情况：

制作工艺符合要求

旁站人员（签字）

秦福章


日

期 2021 年 12 月 09 日

注：本表一式一份，监理单位留存。



扫描全能王 创建

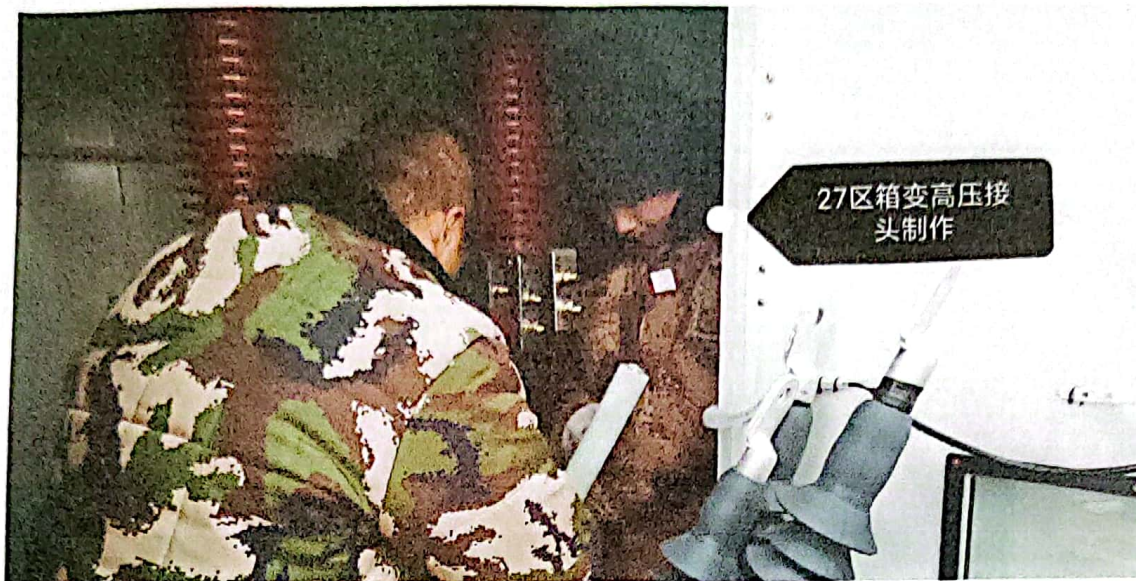

扫描全能王 创建
