

旁站监理记录表

工程名称: 公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: GAWH-ZHJL-PZJL-003

日期及天气: 2021 年 8 月 1 日

施工单位: 湖北东臣泰新能源建设有限公司


旁站监理的部位或工序: 厂区所有箱变基础浇筑

旁站监理开始时间:

旁站监理结束时间:

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 箱逆变基础垫层浇筑, 施工前, 我部对各尺寸进行测量, 隐蔽工程进行拍照留档。
2. 对现场进行安全、施工技术交底
3. 现场采用商用混凝土 (C25 标号), 现场施工人数 9 人, 2 人管理, 三台砼车。

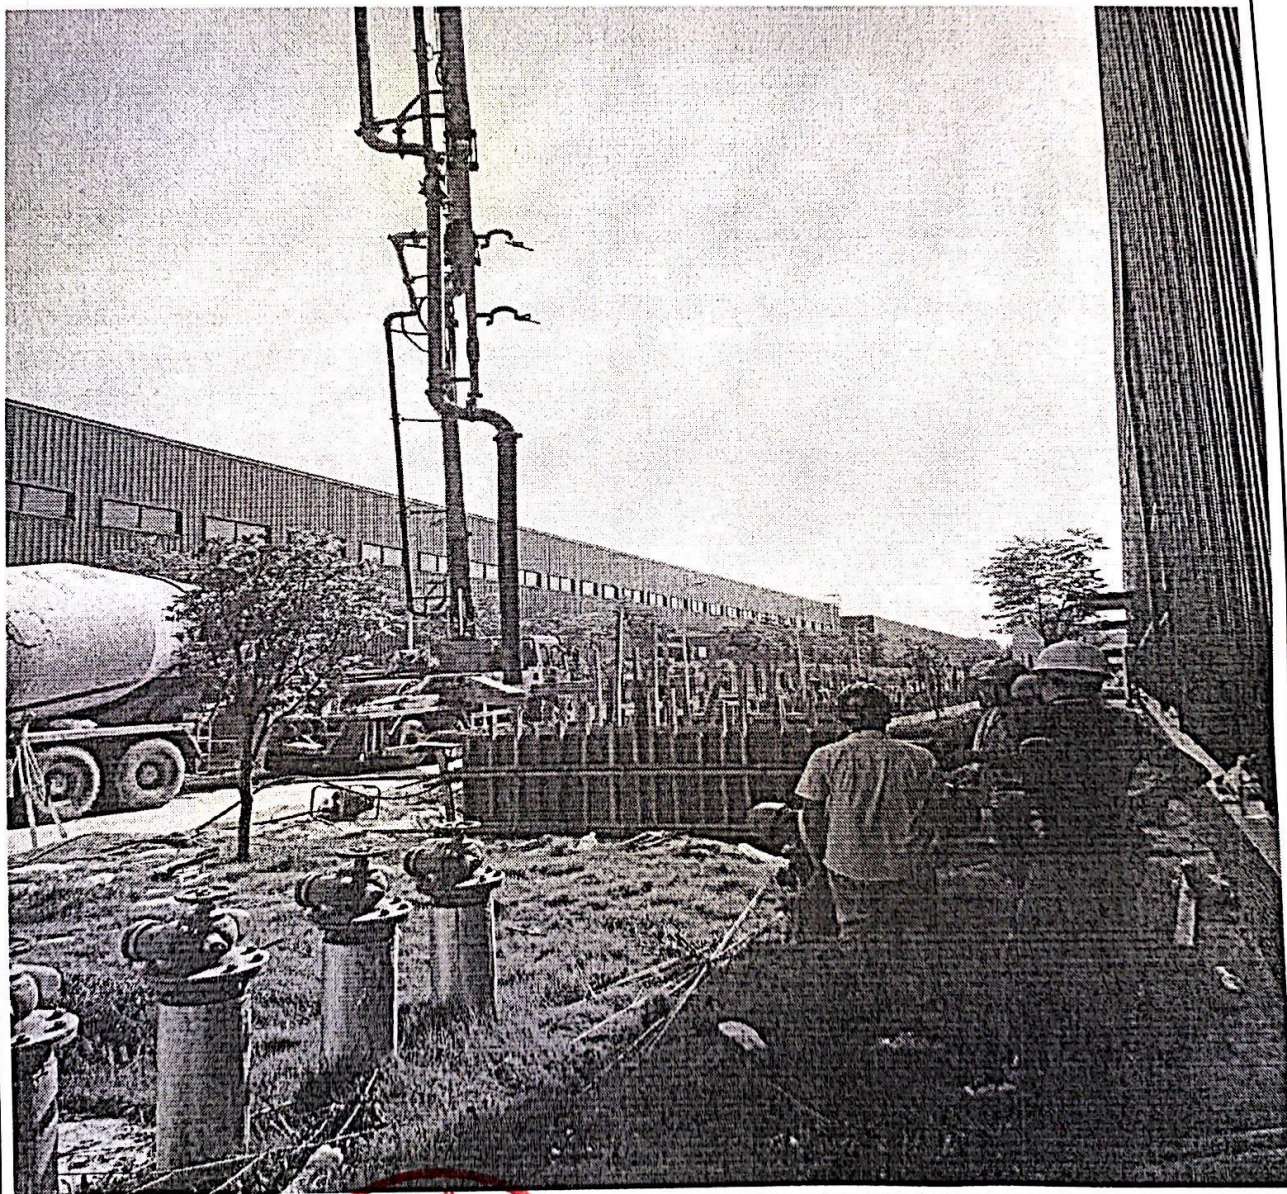

发现的问题及处情况:

放置好预埋件, 将混凝土表面处理。

旁站监理人员 (签字)

2021 年 8 月 / 日



扫描全能王 创建
