


旁站监理记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-


日期及天气： 阴转多云 24℃-29℃ 2021年 7月27日	施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司
旁站监理的部位或工序： 110kV站综合楼基础垫层C15混凝土浇筑	
旁站监理开始时间： 13:25	旁站监理结束时间： 19:43
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员 18 人，施工机械：混凝土灌车、吊车 1 辆、料斗 1 个、振捣器 2 台、发电机 2 台，浇筑顺序及方法：按照施工方案、操作工艺施工。 2、施工工具：插入式振动棒 1 根、铁锹、木抹子、钢抹子； 3、质检员、安全员、技术员及施·工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求；	
发现的问题及处理情况： 1、质检员已到位。 2、施工机械良好。 3、混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子试验报告齐全。 4、混凝土塌落值 符合要求。 5、振捣方法：紧插慢拔，振捣点布置成梅花形，振捣间距不大于 500mm；振捣点时间及移位符合要求。 6、模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象。	
旁站监理人员（签字）： 许青松 2021年 7月27日	

注： 本表一式一份，监理项目部留存。

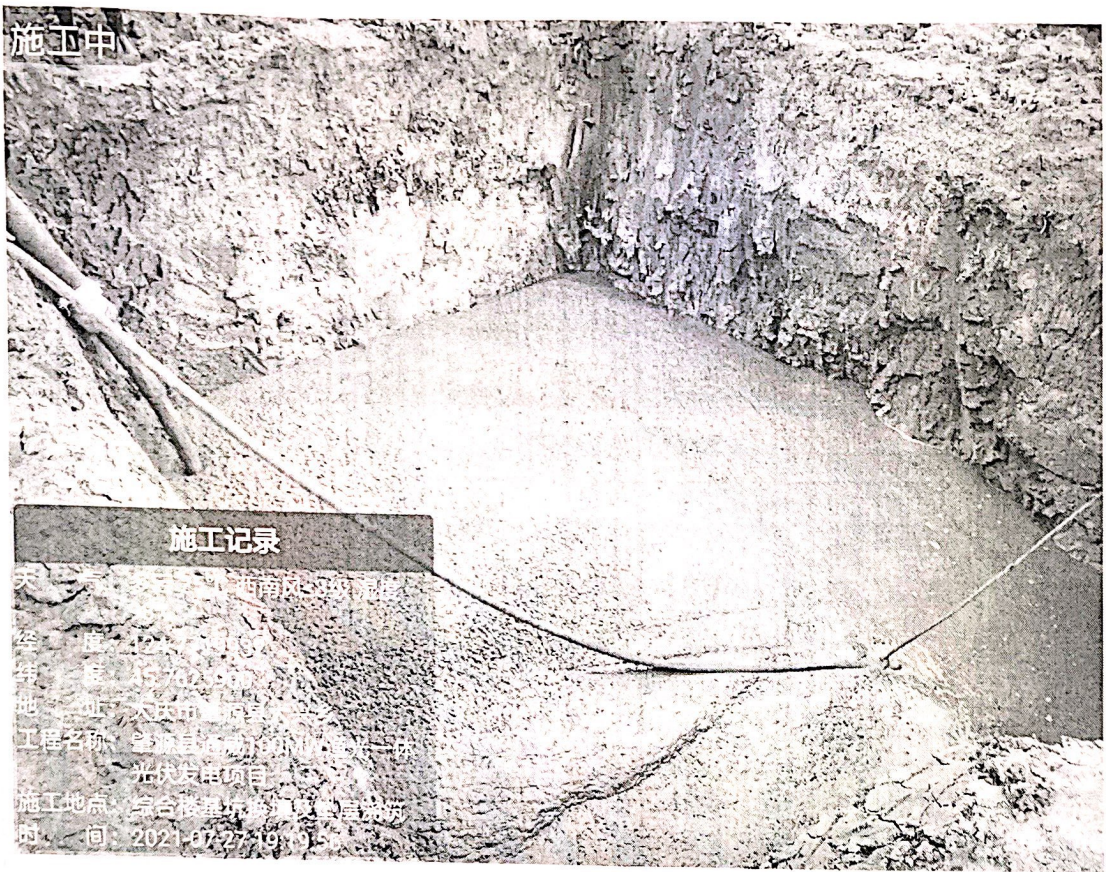

施工记录

天气: 多云 25°C 西南风≤3级 湿度 98%
经纬度: 124.7724893
地址: 大庆市肇源县大兴乡
工程名称: 肇源县通威100MW渔光一体光伏发电项目
施工地点: 综合楼基坑换填及垫层浇筑
时间: 2021-07-27 19:09:03

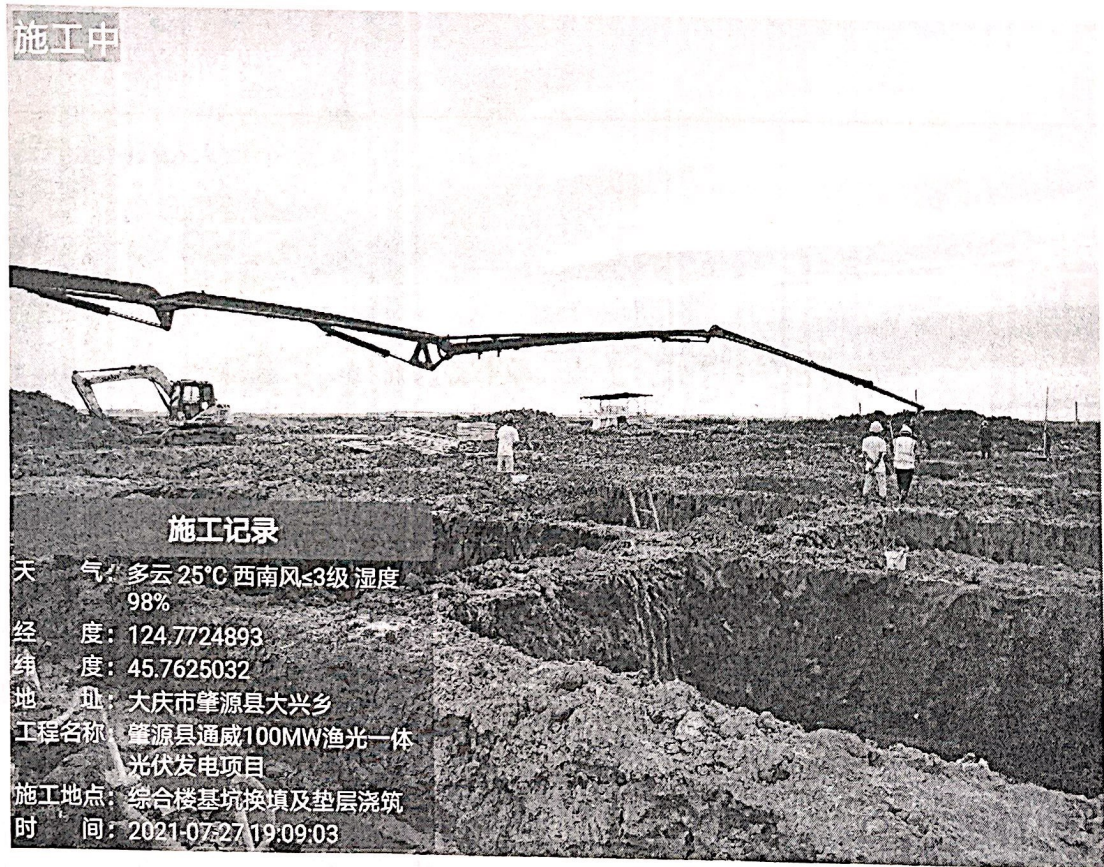

施工记录

天气: 多云 25°C 西南风≤3级 湿度 98%
经纬度: 124.7724893
地址: 大庆市肇源县大兴乡
工程名称: 肇源县通威100MW渔光一体光伏发电项目
施工地点: 综合楼基坑换填及垫层浇筑
时间: 2021-07-27 19:09:03
