

表 A.0.6 旁站记录 ★


工程名称: 通威广西宾阳 120MW 渔光一体项目通威宾阳 220KV 升压站新建工程

编号: ZH-BYXM-PZJL-002

旁站关键部位、关键工序	综合楼基础板块地基毛石、砂砾石回填	承包单位	湘能楚天电力科技有限公司
旁站开始时间	2021 年 11 月 25 日 8 时 30 分	旁站结束时间	2021 年 11 月 25 日 17 时 30 分
天气情况	11-23 晴	气温	11-23°C

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

升压综合楼板块地基回填采用毛石、砂砾石铺垫回填,毛石回填厚度每层为 500mm,分层压实;回填砂砾石厚度为 500mm,分 2 层铺垫压实。现场机械设备、施工人员充足,已进行技术、安全交底。回填采用挖掘机进行铺垫,人工辅助平整,压实采用压路机进行碾压。

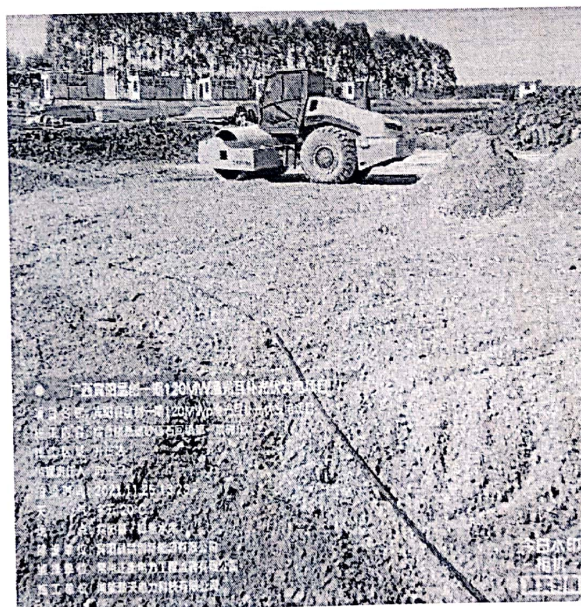

监理人员已经检查地基内无积水、杂物,回填过程中一直在现场旁站监督管理,地基回填已要求施工单位按照设计及规范要求分层压实,已检查回填毛石、砂砾石符合设计要求。已要求施工单位做好压实系数试验及地基承载力试验。

发现的问题及处理情况:

回填时发现个别处回填厚度不符合设计要求,已令整改,经复查,达到合格要求。

旁站监理人员(签字): 时金宝

日期: 2021.11.25
