

表 A.0.6 旁站记录 ★


工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：ZH-PZJL-

旁站关键部位、关键工序	一标段 17#、18#方阵箱变基础平台浇筑砼	承包单位	四川仕麟建筑工程有限公司
旁站开始时间	2024年12月8日 15时01分	旁站结束时间	2024年12月8日 17时29分
天气情况	晴	气温	11-23℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程砼采用广西华润红水河水泥有限公司供应的混凝土，强度为 C30、坍落度 180±30；浇筑总计方量约 16m³；采用挖机铲斗自卸至基础模板内；施工机械设备及人员准备齐全，发电机带动插入式振捣器振捣，连续浇筑，砼浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；施工单位质检员、安全员在岗值班；并按浇筑方量留置了见证取样送检试块。

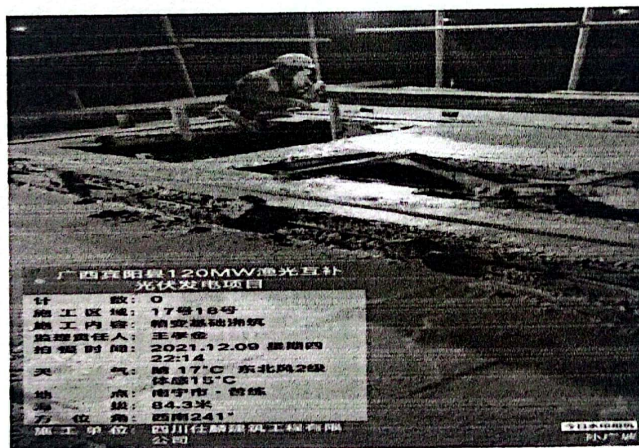

监理人员已经检查了钢筋绑扎及模板安装情况，符合图纸设计及规范要求；检查了商砼出厂证明、合格证情况，模板尺寸偏差均符合设计及规范要求。已要求现场制作试块，标准养护、同条件试块作为验证配合比依据。混凝土振捣时，做到快插慢拔，振捣器插点均匀，连续振捣时间约为 25S-40S，以混凝土表面出现浮浆为止，没有漏浆、跑浆现象。已要求施工方浇筑完成后对混凝土进行养护。

发现的问题及处理情况：

基础浇筑时，发现个别处振捣不到位，已令整改，经复查，达到合格要求。

旁站监理人员（签字）：

高宗海

日

期：

2024.12.09
