

旁站监理记录

工程名称：苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

编号：SKQN-SKMYGF02-JLPZ-01

日期：2021.12.02	工程地点：工地现场
旁站监理的部位或工序：交流电缆敷设	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 1、现场施工人员 8 人，班组长 2 人。叉车 1 台。 2、电缆敷设方式为卷扬机牵引。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域，安排专人看守。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机械安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场警戒区域设置合理到位，符合安全文明工作要求。 3、检查电缆铭牌与设计相符，电缆外观完整，出厂文件齐全，符合设计要求。 4、检查现场施工过程中电缆经过电缆管口、桥架转角处确保有保护措施不会被破损。 5、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法：	
备注： 	
项目部：_____ 质检员： <u>李似心</u> 2021年12月2日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>刘德江</u> 2021年12月2日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

工程名称：苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

编号：SKQN-SKMYGF02-JLPZ-02

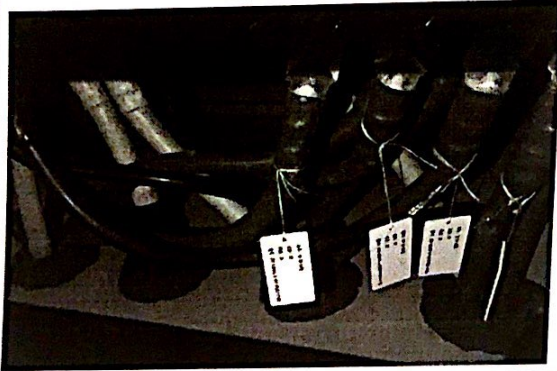
日期：2021.12.05	工程地点：工地现场
旁站监理的部位或工序：电缆头制作	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 1、现场施工人员 3 人，班组长 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场设有效期内的灭火器，符合安全文明工作要求。 3、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法：无	
备注： 	
项目部：_____ 质检员： <u>李以心</u> 2021年12月5日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>刘德发</u> 2021年12月5日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

工程名称：苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

编号：SKQN-SKMYGF02-JLPZ-03

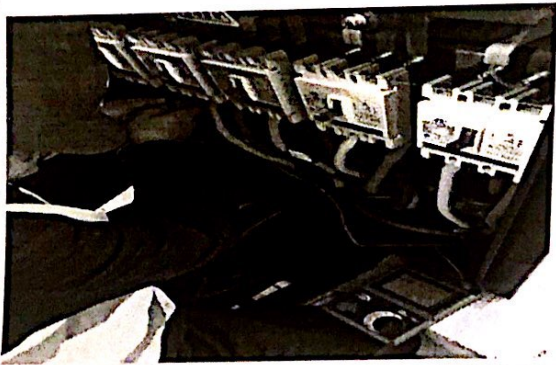
日期：2021.12.11	工程地点：工地现场
旁站监理的部位或工序：电缆防火阻燃	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：12:00
施工情况： 1、现场施工人员 8 人，班组长 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。 4、现场有灭火器。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、检查盘柜孔洞封堵、耐火衬板安装牢固、防火堵料密实无缝隙。阻火隔墙设置符合设计规定，防火包、防火堵料填实无缝隙，不透光，符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法：无	
备注： 	
项目部：_____ 质检员：李红心 2021 年 12 月 11 日	项目监理单位：_____ 旁站监理人员：孙德文 2021 年 12 月 11 日

本表一式 3 份，由项目监理单位填写，建设管理单位存 1 份，项目监理单位存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

工程名称：苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

编号：SKQN-SKMYGF02-JLPZ-04

日期：2021.12.08	工程地点：工地现场
旁站监理的部位或工序：低压电缆绝缘电阻测试	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：10:00
施工情况： 1、现场施工人员 8 人，班组长 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。 4、现场有灭火器。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、检查现场绝缘电阻测试值符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法：无	
备注： 	
项目部：_____ 质检员： <u>李红心</u> 2021 年 12 月 8 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>刘继文</u> 2021 年 12 月 8 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

工程名称：苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

编号：SKQN-SKMYGF02-JLPZ-05

日期：2021.12.08	工程地点：工地现场
旁站监理的部位或工序：组串回路测试	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：12:00
施工情况： 1、现场施工人员 3 人，班组长 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。 4、现场有灭火器。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、检查现场组串开路电压符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法：无	
备注： 	
项目部：_____ 质检员： <u>刘心</u> 2021 年 12 月 8 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>刘德波</u> 2021 年 12 月 8 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。
