

旁站监理记录表


工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程60MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-021

日期及气候：2021年12月26日	多云	工程地点：大屯镇小城子村-罗柏富-平房屋顶
旁站监理的部位及工序：光伏支架底座膨胀螺栓拉拔试验		
旁站监理开始时间：13:30		旁站监理结束时间：14:50

施工情况：

1. 膨胀螺栓的选用必须符合设计要求，经过监理确认到场实物与样品一致，并提供产品合格证明资料；
2. 根据膨胀螺栓长度需要的钻孔深度，在电锤上设置限位；
3. 打孔时电锤应垂直用力，不要摆动，防止孔洞直径偏大，而造成膨胀螺栓锚固不牢；
4. 膨胀螺栓安装完成后套管不得外露、按照图纸要求进行防水处理，加支架底座并将螺母紧固牢固；
5. 拉拔试验仪器选用可显示试验拉力数据的电子测量仪。

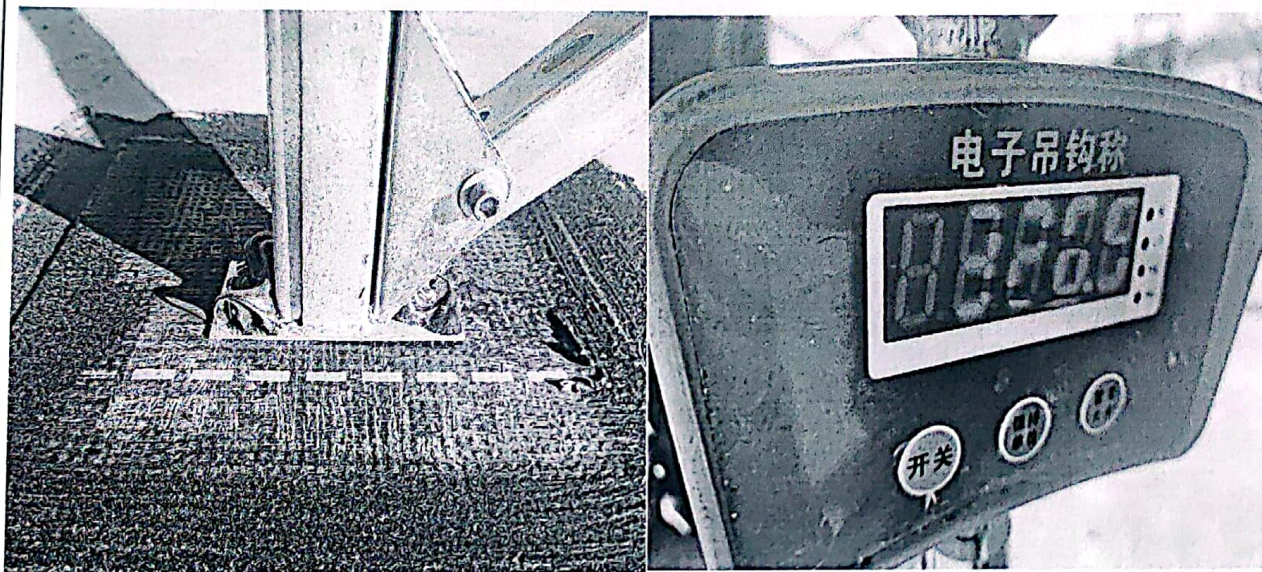

监理情况：

1. 试验前检查螺母安装是否紧固，用记号笔做好标记；
2. 试验时对电子测试仪的读数进行拍照，作为依据；
3. 试验后检查紧固螺母位置是否有松动和旋转，膨胀螺栓是否有拉出现象；
4. 拉拔试验结果符合设计要求。

发现问题：无

处理意见：无

施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：

王磊

2021年12月26日

旁站监理人员（签字）：

李健

2021年12月26日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建
