

## 旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：禹州市晶能50MW光伏发电项目 编号：CZZH-YZJN-PZJL-030

日期及天气：2022/06/22晴 26℃~38℃	施工单位：山东力诺电力设计咨询有限公司
---------------------------	---------------------


旁站监理的部位或工序：外线N19塔基基础混凝土浇筑

旁站监理开始时间：09: 00 旁站监理结束时间：10:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工情况：现场施工人员5人，施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备罐车1台、三轮车一台，人工配合浇筑，满足施工要求，施工过程顺利，未出现质量问题和安全事故，砼标号C25、商混、砼方量共22.40m<sup>3</sup>。

监理情况：监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，砼配合比符合要求，现场提取砼试块1组，砼坍落度180mm。

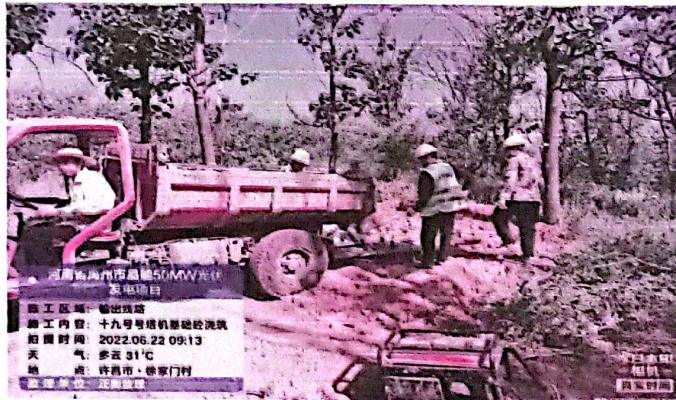

发现的问题及处理情况：

旁站监理人员（签字）：王彦彬

2022年6月22日

注：本表一式\_\_\_\_份，由监理项目部留存。
