

旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PZJL-036

日期及气候：2023.02.28 晴：5℃-19℃

施工地点：升压站内

旁站监理的部位或工序：

升压站 35KV 预制舱压顶圈梁、构造柱，GIS、龙门架基础混凝土浇筑

旁站监理开始时间：2023.02.28 14:10

旁站监理结束时间：2023.02.28 16:30

施工情况：

- 1、现场管理人员 4、技术员 1 名、安全员 1 名，施工人员 15 人。
- 2、砼为商品混凝土 C30、人工连续浇筑；
- 3、安全员到岗检查安全措施落实、质检员进行施工前技术交底；
- 4、混凝土浇筑过程符合设计要求；
- 5、设备投入：砼罐车 3 辆、泵车 1 辆、50 震动棒 2 台及其它小型辅助工具。
- 6、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护；
- 7、浇筑时，砼罐车到场，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。

监理情况：

- 1、浇筑申请已批复。混凝土配比手续齐全；
- 2、检查商品混凝土 C30、配合比符合要求，现场检测砼塌落度，符合要求；
- 3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况，快插慢提，振捣密实；
- 4、要求木工时刻检查模板，防止涨模；
- 5、混凝土坍塌度检测，留试块 3 组。

发现问题：

处理意见：

备注（包括处理结果）：

项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：王同有


日

期：2023 年 02 月 28 日

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存 1 份




扫描全能王 创建

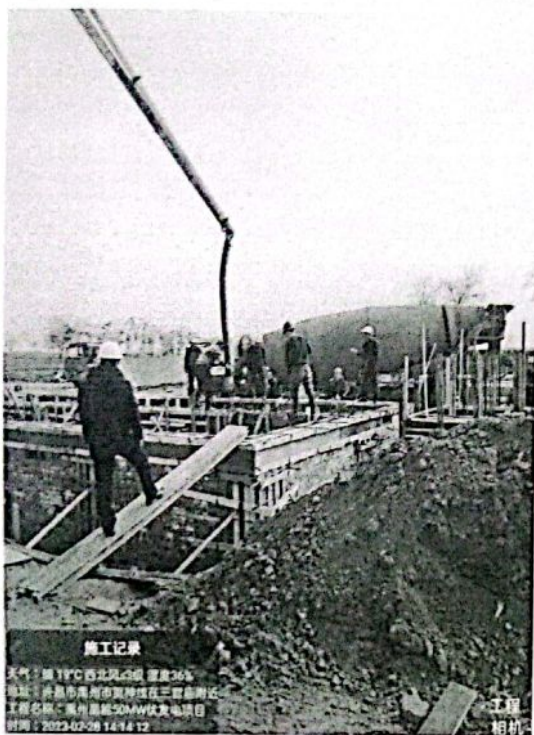


35KV 基础压圈顶梁、构造柱混凝土浇筑



GIS 基础混凝土浇筑

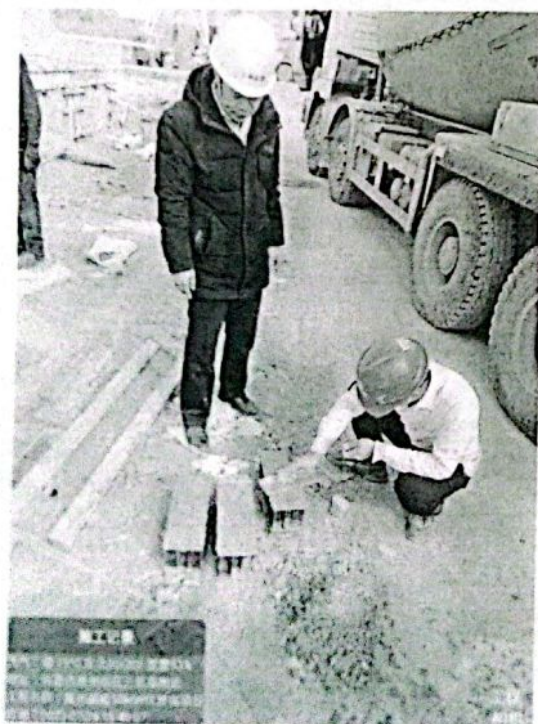

留置商砼试块监理见证取样

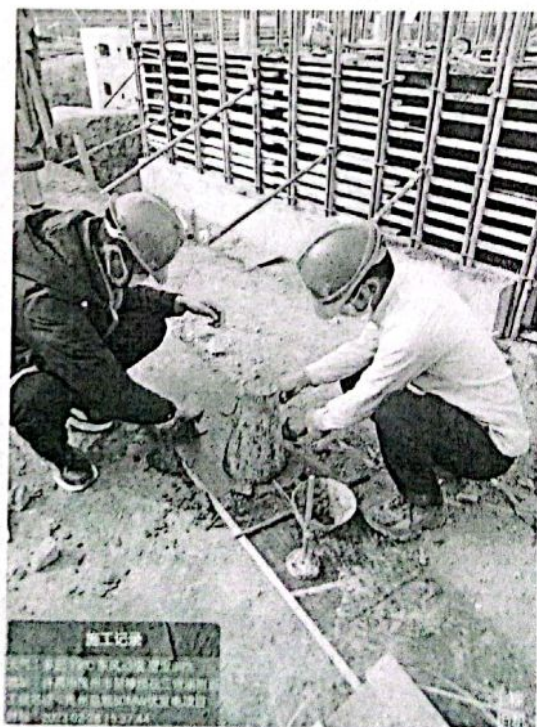

商砼塌落度测试

