

旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目


编号：CZZH-YZJN-PZJL-038

日期及气候：2023.03.01 晴：2℃-15℃		施工地点：升压站内	
旁站监理的部位或工序： 升压站基础混凝土浇筑			
旁站监理开始时间：2023.03.01 18:50		旁站监理结束时间：2023.03.01 21:20	
施工情况： 1、现场管理人员 4、技术员 1 名、安全员 1 名、施工人员 10 人。 2、砼为商品混凝土 C30、人工连续浇筑； 3、安全员到岗检查安全措施落实、质检员进行施工前技术交底； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：砼罐车 3 辆、泵车 1 辆、50 震动棒 2 台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护； 7、浇筑时，砼罐车到场，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。			
监理情况： 1、浇筑申请已批复，混凝土配比手续齐全； 2、检查商品混凝土 C30、配合比符合要求，现场检测砼坍落度，符合要求； 3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况，快插慢提，振捣密实； 4、要求木工时刻检查模板，防止涨模； 5、混凝土坍落度检测，留试块 3 组。			
发现问题： 			
处理意见： 			
备注（包括处理结果）：			
项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：  日 期：2023年03月01日			


填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存 1 份




扫描全能王 创建

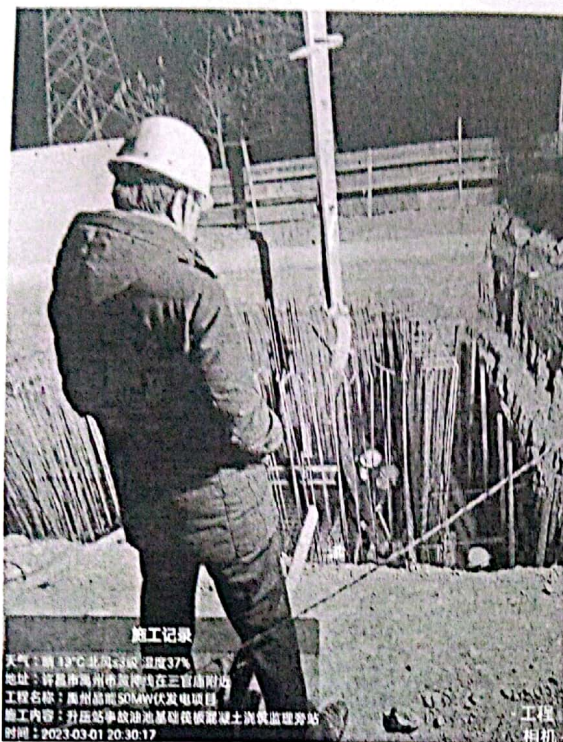

浇筑监理旁站

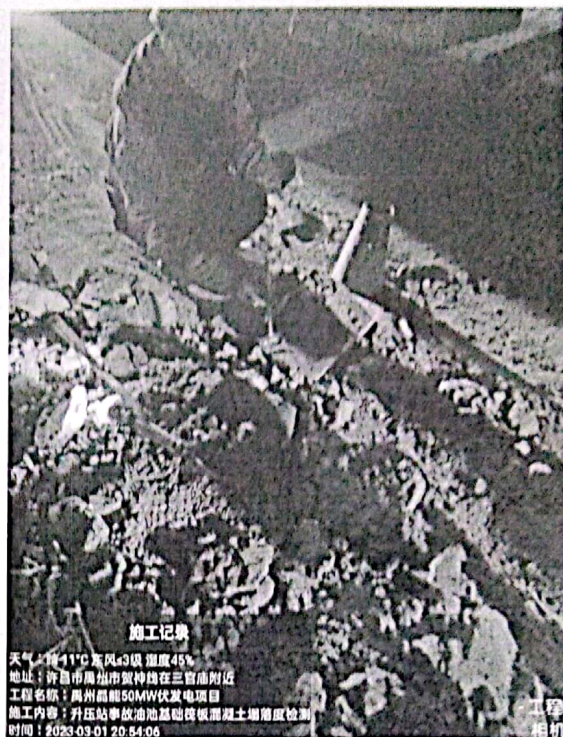

商砼塌落度测试

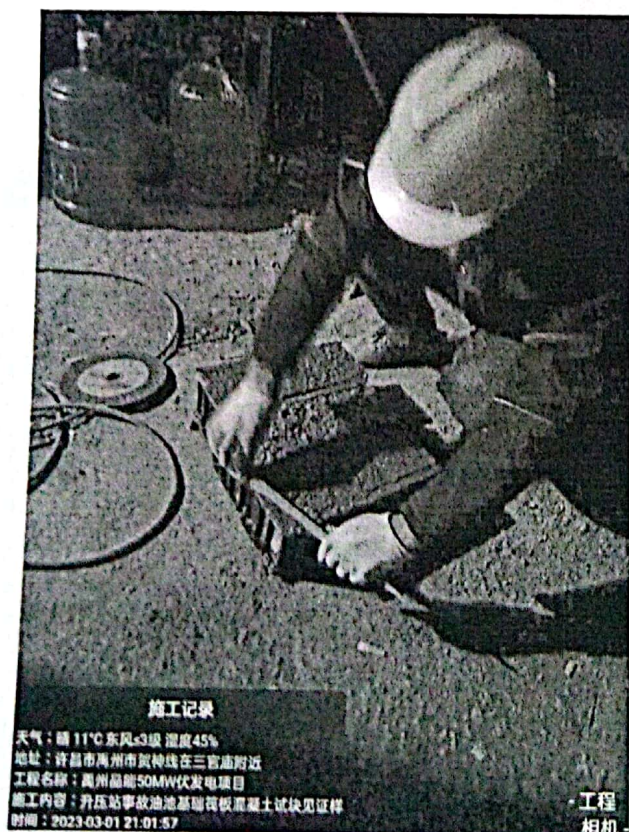

留置商砼试块监理见证取样

