

# 旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目


编号：CZZH-YZJN-PZJL-082

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 日期及天气：2024.01.07 晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 施工单位：山东力诺电力设计咨询有限公司                |
| 旁站监理的部位或工序：6#/-12#--05# 高压电缆耐压试验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| 旁站监理开始时间：10:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 旁站监理结束时间：17:30                     |
| <p>施工情况：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、试验人员 4 人, 安全监护 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗；</li><li>2、试验电缆型号 3*95/3*240；</li><li>3、施加电压 52kV, 持续时间 60min；</li><li>4、试验前后测量绝缘电阻分别大于 50GΩ ；</li><li>5、导体电阻测量三相数据平衡，屏蔽层直流电阻做为原始数据。</li><li>6、电缆线路相位检测准确</li><li>7、试验结论:合格。</li></ul> <p>试验设备：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、MS5202 绝缘电阻测试仪 编号：17239</li><li>2、3310 变压器直流电阻测试仪 编号：1B1120301</li><li>3、HZXZ-540/270kV 串联谐振测试仪 仪器编号：20082208</li></ul> |                                    |
| <p>监理情况：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职；</li><li>2、检查试验设备对比报告报审；</li><li>3、检查各项试验数据是否合格；</li><li>4、检查试验过程电压有无突变。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| <p>发现问题：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| <p>处理意见：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 施工项目部：山东力诺电力设计咨询有限公司<br>质检员：赵山                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司<br>旁站监理人员：周月 |
| 日期：2024 年 01 月 07 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 日期：2024 年 01 月 07 日                |



### 施工记录

天气: 阴 4°C 东南风≤3级 湿度25%  
地址: 许昌市禹州市党建路在黄村附近  
工程名称: 禹州市晶能光伏50MW光伏发电项目  
施工内容: 6#、12#箱变设备电缆耐压试验监理旁站  
时间: 2024-01-07 13:20:15

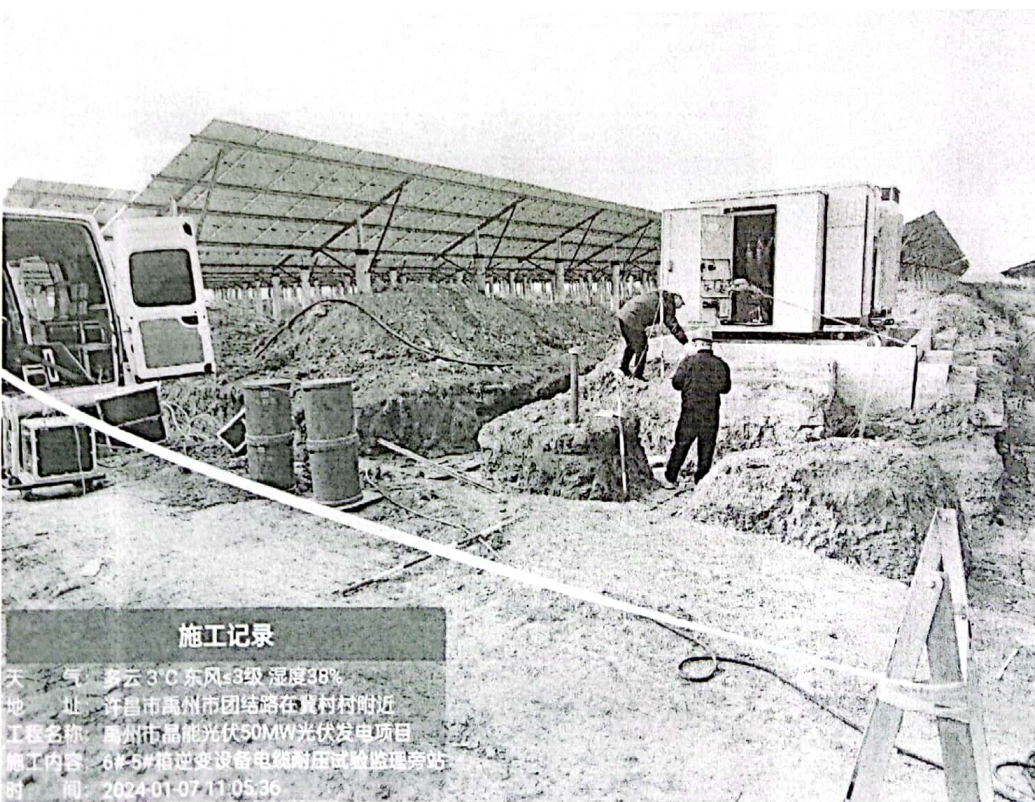

### 施工记录

天气: 多云 3°C 东风≤3级 湿度38%  
地址: 许昌市禹州市团结路在黄村附近  
工程名称: 禹州市晶能光伏50MW光伏发电项目  
施工内容: 6#、5#箱变设备电缆耐压试验监理旁站  
时间: 2024-01-07 11:05:36
