


旁站监理记录表

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号: CZZH-YZJN-PZJL-084

日期及气候：2024.01.08 晴：-2℃-8℃	施工地点：光伏区
旁站监理的部位或工序：10#光伏方阵打桩；	
旁站监理开始时间：2024.01.08 08:00	旁站监理结束时间：2024.01.08 17:30
施工情况： 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位现场管理人员 1 人，施工人员 3 人，打桩机 1 台。 2、桩为建华建材（河南）有限公司生产的预制管桩，长度 6 米，型号规格为 300*60*A。 3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。 4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范，符合安全文明施工的要求。 5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高和桩距，符合图纸设计要求。	
监理情况： 1、符合预制管桩规格型号； 2、预制管桩外观是否有裂纹、破损等符合要求； 3、桩顶标高、垂直度符合设计要求； 4、安全监护人到场；	
发现问题：无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：田同有 日期：2024 年 01 月 08 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份

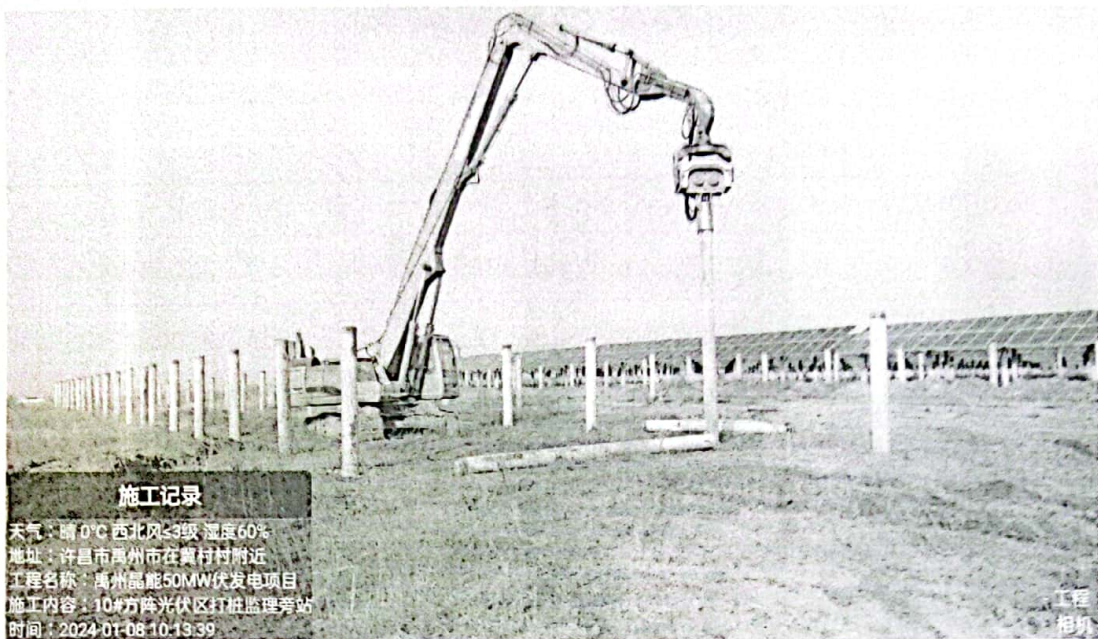

施工记录

天气：晴 0℃ 西北风≤3级 湿度60%
地址：许昌市禹州市在黄村村附近
工程名称：禹州晶能50MW光伏发电项目
施工内容：10#方阵光伏区打桩监理旁站
时间：2024-01-08 10:13:39

工程
相机
