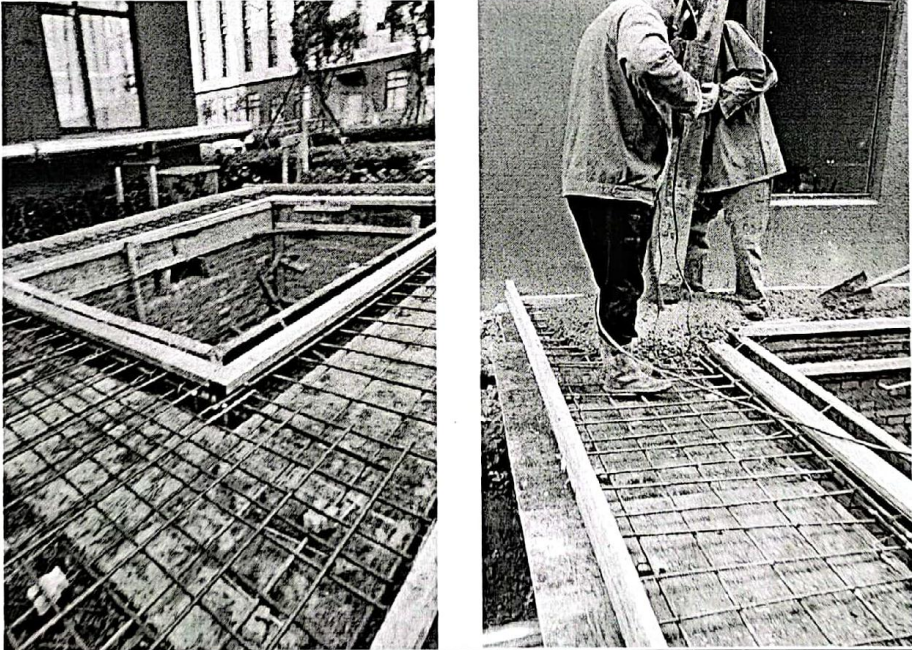


旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目5mwp分布式光伏发电项目

编 号：SZJJYQ-PZJL-20220312

日期及天气：2022年03月12日 多云	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序：数字产业经济园（一期）1#2#3#4#5#箱变开关站SVG基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：08：00，13：00	旁站监理结束时间：11:00；15：30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、数字产业经济园（一期）园区内1#、2#、3#、4#和5#箱变、开关站和SVG基础平台圈梁和立柱进行砼浇筑。 2、现场施工人员：18人，管理人员：3人。 3、施工机械：泵车1辆，商砼车1辆，震动棒2把，铁锹5辆等。 4、图纸要求混凝土强度等级达到C25强度，现场采用C25强度商品砼，符合图纸要求。现场在浇筑过程中要求工人对楼栋间设施保护好的同时进行浇筑砼，在支模具内混凝土浇筑振捣充分，表面抹灰平整，作业过程安全，施工过程符合要求。	
	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2022年03月12日	

注：本表一式 3 份，由监理项目部留存。
