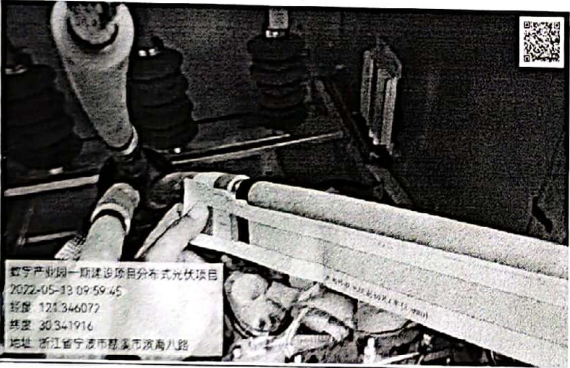


旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目5mwp分布式光伏发电项目
编号：SZJJYQ-PZJL-20220513

日期及天气：2022年05月13日 阴	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序：1#和2#开关站至配电房接入柜高压电缆终端制作	
旁站监理开始时间：09:00, 13:00	旁站监理结束时间：11:00; 15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、数字产业经济园（一期）园区内项目的1#和2#开关站至配电房高压电缆终端制作。 2、现场施工人员：8人，管理人员：3人。 3、施工机械：无。施工工具若干 4、图纸要求使用冷缩套管式终端，现场检查终端制作用套管符合图纸要求。现场在制作过程中要求工人对线缆保护好的同时进行制作，制作时按套管厂家说明书及要求尺寸严格执行。在检查半导体预留尺寸与说明书要求一致的情况下，绝缘体外表清洁符合要求的情况后进行冷缩管包扎。施工过程符合要求。	
 	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 陈 2022年 05月 13日	

注：本表一式 3 份，由监理项目部留存。
