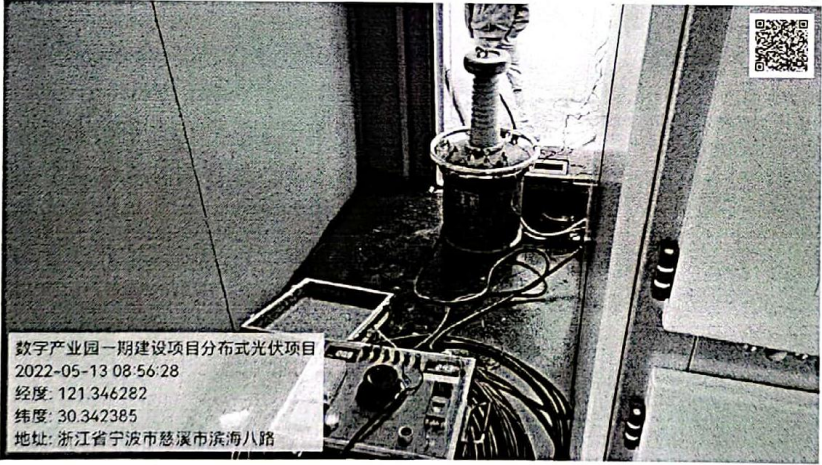


旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目5mwp分布式光伏发电项目

编 号：SZJJYQ-PZJL-20220513-2

日期及天气：2022年05月13日 阴	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序：1#和2#开关站高压电缆耐压试验	
旁站监理开始时间：08:30	旁站监理结束时间：11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、数字产业经济园（一期）园区内项目的1#和2#开关站高压电缆耐压试验。 2、现场施工人员：3人，管理人员：2人。 3、试验过程：现场对需要进行试验的设备予以确认（1#开关站和2#开关站10KV高压电缆侧）。对需进行试验的部位与试验设备进行连接线缆和有效接地保护。试验设备周边区域予以安全警示标识悬挂，监护人员、操作人员各施其职。试验升压至额定电压时持续保持3分钟后，予以降压关机，随后进行有效的接地放电确认后完成拆线撤离。整个试验过程没有发生任何人员和设备等安全意外情况。 4、监理旁站情况：首先核查试验人员资质和试验设备校准报告等，试验人员资质和试验设备校准报告与报审资料一致。对试验设备及其周边安全情况予以检查确认。督促试验单位和人员加强试验前的相关准备工作，及时做好现场的安全防护。监理对试验过程进行监督，尤其是对在设备升压过程严禁人员进入安全警示范围内，在降压关机后进行确认接地放电后再进行下一步操作。现场试验结束后督促检查安全后拆除接线和移开试验设备。	
 数字产业园一期建设项目分布式光伏项目 2022-05-13 08:56:28 经度: 121.346282 纬度: 30.342385 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海八路	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 戚平 2022年05月13日	

注：本表一式 3 份，由监理项目部留存。
