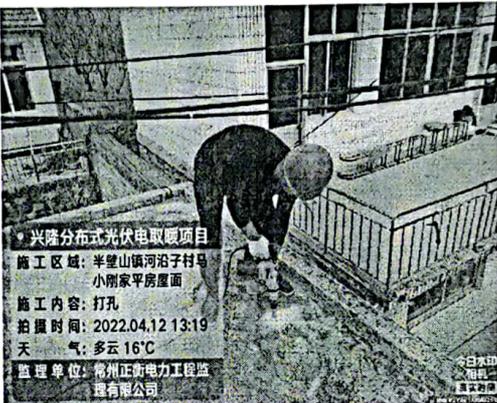


旁站监理记录表

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-PZJL-003

日期：2022.4.12	工程地点：河沿子村马小刚家
旁站监理的部位及工序：平房屋面打孔，底座安装及防水施工	
旁站监理开始时间：7:40	旁站监理结束时间：8:00
<p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 膨胀螺栓的选用必须符合设计要求，经过监理确认到场实物与样品一致，并提供产品合格证明资料； 2. 根据膨胀螺栓长度需要的钻孔深度，在电锤上设置限位； 3. 打孔时电锤应垂直用力，不要摆动，防止孔洞直径偏大，而造成膨胀螺栓锚固不牢； 4. 膨胀螺栓安装完成后套管不得外露，加支架底座并将螺母紧固牢固； 5. 吹灰，注入密封胶，安装膨胀螺栓，安装底座前涂防水胶（第一遍），固定底座，四周及底座中间打防水胶（第二遍）。 	
	
<p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 防水施工前，检查屋面打孔处是否吹灰； 2. 底座安装时，检查打孔处是否注胶（第一遍）； 3. 底座安装完成时，检查底座四周是否二遍注胶； 4. 注胶时对施工工序进行拍照； 5. 防水施工施工完成，符合设计要求。 	
发现问题：	
处理意见：	
施工单位：保定市伟达电业安装有限公司 质检员（签字）： <i>张军</i> 2022年4月12日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： <i>朱建</i> 2022年4月12日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

