

旁站监理记录表

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-PZJL-004

日期：2022.4.12

工程地点：田杖子村马刘凤国家


旁站监理的部位及工序：平房屋面打孔，底座安装及防水施工

旁站监理开始时间：7:25

旁站监理结束时间：8:10

施工情况：

1. 膨胀螺栓的选用必须符合设计要求，经过监理确认到场实物与样品一致，并提供产品合格证明材料；
2. 根据膨胀螺栓长度需要的钻孔深度，在电锤上设置限位；
3. 打孔时电锤应垂直用力，不要摆动，防止孔洞直径偏大，而造成膨胀螺栓锚固不牢；
4. 膨胀螺栓安装完成后套管不得外露，加支架底座并将螺母紧固牢固；
5. 吹灰，注入密封胶，安装膨胀螺栓，安装底座前涂防水胶（第一遍），固定底座，四周及底座中间打防水胶（第二遍）。

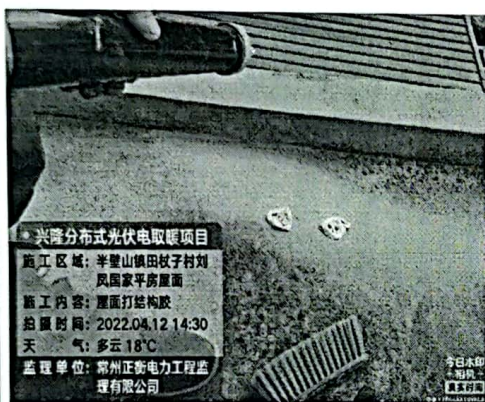

监理情况：

1. 防水施工前，检查屋面打孔处是否吹灰；
2. 底座安装时，检查打孔处是否注胶（第一遍）；
3. 底座安装完成时，检查底座四周是否二遍注胶；
4. 注胶时对施工工序进行拍照；
5. 防水施工施工完成，符合设计要求。

发现问题：

处理意见：

施工单位：保定市伟达电业安装有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：张长军

旁站监理人员（签字）：朱建

2022年4月12日

2022年4月12日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建
