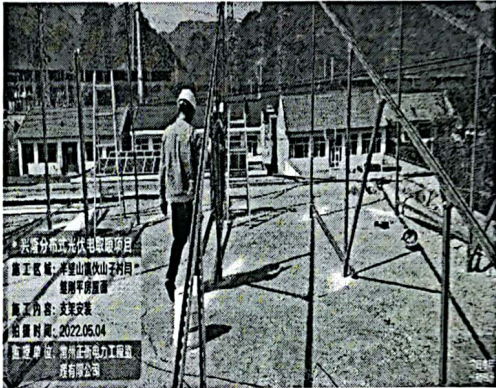


## 旁站监理记录表

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-PZJL-010

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2022.5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 工程地点：伙山子村闫纪刚家屋面                                                                                                                                                                               |
| 旁站监理的部位及工序：平房屋面打孔，底座安装及防水施工                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
| 旁站监理开始时间：8:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旁站监理结束时间：8:58                                                                                                                                                                                 |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 膨胀螺栓的选用必须符合设计要求，经过监理确认到场实物与样品一致，并提供产品合格证明材料；</li> <li>2. 根据膨胀螺栓长度需要的钻孔深度，在电锤上设置限位；</li> <li>3. 打孔时电锤应垂直用力，不要摆动，防止孔洞直径偏大，而造成膨胀螺栓锚固不牢；</li> <li>4. 膨胀螺栓安装完成后套管不得外露，加支架底座并将螺母紧固牢固；</li> <li>5. 吹灰，注入密封胶，安装膨胀螺栓，安装底座前涂防水胶（第一遍），固定底座，四周及底座中间打防水胶（第二遍）。</li> </ol> |                                                                                                                                                                                               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 防水施工前，检查屋面打孔处是否吹灰；</li> <li>2. 底座安装时，检查打孔处是否注胶（第一遍）；</li> <li>3. 底座安装完成时，检查底座四周是否二遍注胶；</li> <li>4. 注胶时对施工工序进行拍照；</li> <li>5. 防水施工完成，符合设计要求。</li> </ol>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| 发现问题：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
| 处理意见：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
| <p>施工单位：保定市伟达电业安装有限公司</p><br><br><p>质检员（签字）： </p><br><br><p style="text-align: right;">年    月    日</p>                                                                                                                           | <p>监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司</p><br><br><p>旁站监理人员（签字）： </p><br><br><p style="text-align: right;">2022年5月4日</p> |

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建
