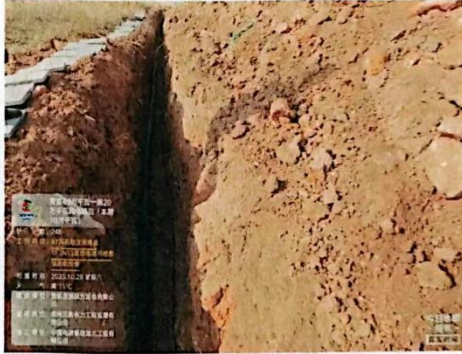



隐蔽工程监理检查记录（直埋电缆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—

电缆区域	X1 风机箱变到 1F3N13 塔基间电缆	检查依据	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50168 —2016、施工图纸	
电缆型号规格	ZC—YJY23—26/35KV—3X50	电缆根数	电缆 1 根、光缆一根，132 米/根	
序号	检 验 项 目	检 验 结 果	备 注	
1	电缆沟深度	沟深 1.2m		
2	电缆沟宽度	沟宽 0.8m		
3	沟内有无石块、建筑垃圾	无		
4	电缆上、下铺沙或软土深度	上、下 10cm		
5	盖砖和警示带	符合要求		
6	电缆与光缆间距最小距离	25cm		
7	电缆底部和上部铺沙最小距离	10cm		
8	软土回填后	符合要求		
9	电缆接头处有未设标志桩	无接头		
10	回填细土	符合要求		
11	电缆沟回填后何处设有标志桩	符合电缆敷设规范要求	30 米标志牌、标志桩	
 				
隐蔽检查结论：合格				
质检机构	验收意见	签 名		
施工单位	合格	 2023 年 10 月 28 日		
监理单位	合格	 2023 年 10 月 28 日		

旁站监理记录表（35KV 电缆耐压试验）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 10 月 28 日 天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：X1 风机箱变到塔基 1F3N13 直埋电缆耐压试验	
旁站开始时间：2023 年 10 月 28 日 15 时 40 分	旁站结束时间：2023 年 10 月 28 日 16 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆试验单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 2 人、试验人员 2 人。主要试验人员特种作业证合格有效； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线、围栏；环境空气相对湿度是否小于 80%，采取防尘、防潮措施。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 3X50，1 根，长度 132 米。 6、试验电压 50KV，试验时间 300s. 无问题，正常。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 10 月 28 日
