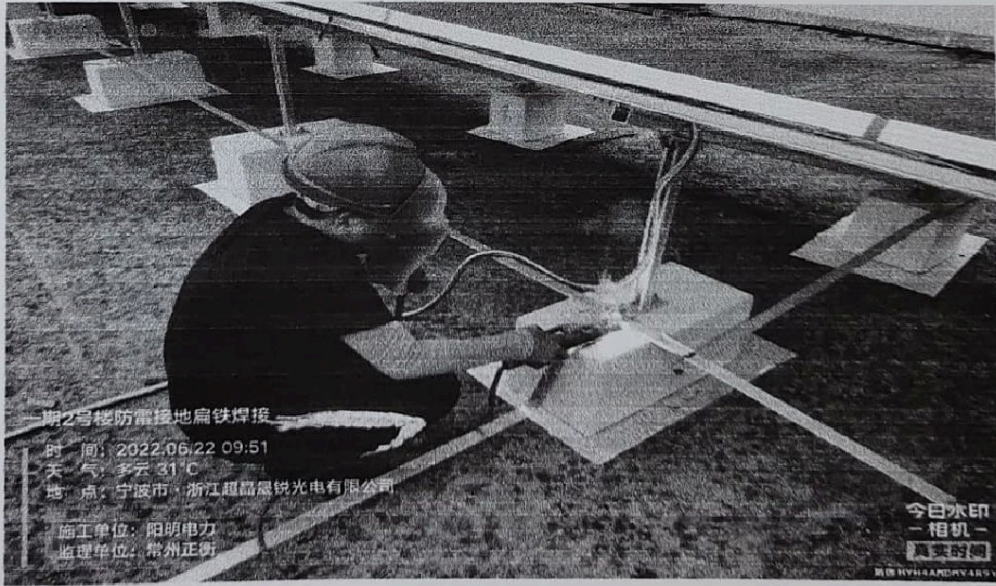


旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 余姚市姚江科技投资开发有限公司(一期) 615.6KWP分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YJKJYQ-PZJL-005

日期及天气: 2022年06月22日	施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 施工区(防雷接地扁铁焊接)	
旁站监理开始时间: 08:30	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 管理及施工人员均到位, 施工料具及机具均已准备齐全, 施工人员3人, 管理人员1人, 电焊机1台。 现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 且现场作业已配置灭火器, 符合安全文明施工的要求。 监理情况: 检查接地扁铁焊接搭接长度>2倍宽度, 且三面焊接。焊渣清理刷防腐漆, 符合要求, 与其他接地装置连接不少于2个点, 符合设计及规范要求。	
	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字):	2022年06月22日

注: 本表一式____份, 由监理项目部留存。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备
