

旁站监理记录表


工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023 年 8 月 24 日 天气: 晴	施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 升压站室外电缆沟浇筑	
旁站监理开始时间: 2:50	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 1. 施工人员 5 人, 管理人员 1 人, 技术员 1 人. 2. 采用商品混凝土 3 车, 约 28m³, 混凝土强度为 C30 3. 设计明沟宽为 160-180cm, 为原设计试浇筑 4. 插入式振捣棒后, 喂材料作台阶.	
监理情况: 1. 施工前检查对作业人员已进行安全技术交底. 2. 检查钢筋、模板、预埋件均合格 3. 商混配比、水泥、砂子、石子合格证齐全. 4. 浇筑过程中不定期抽样留样, 符合要求, 试块 2 组.	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 张明五 日期: 2023 年 8 月 24 日	



手机扫描王

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

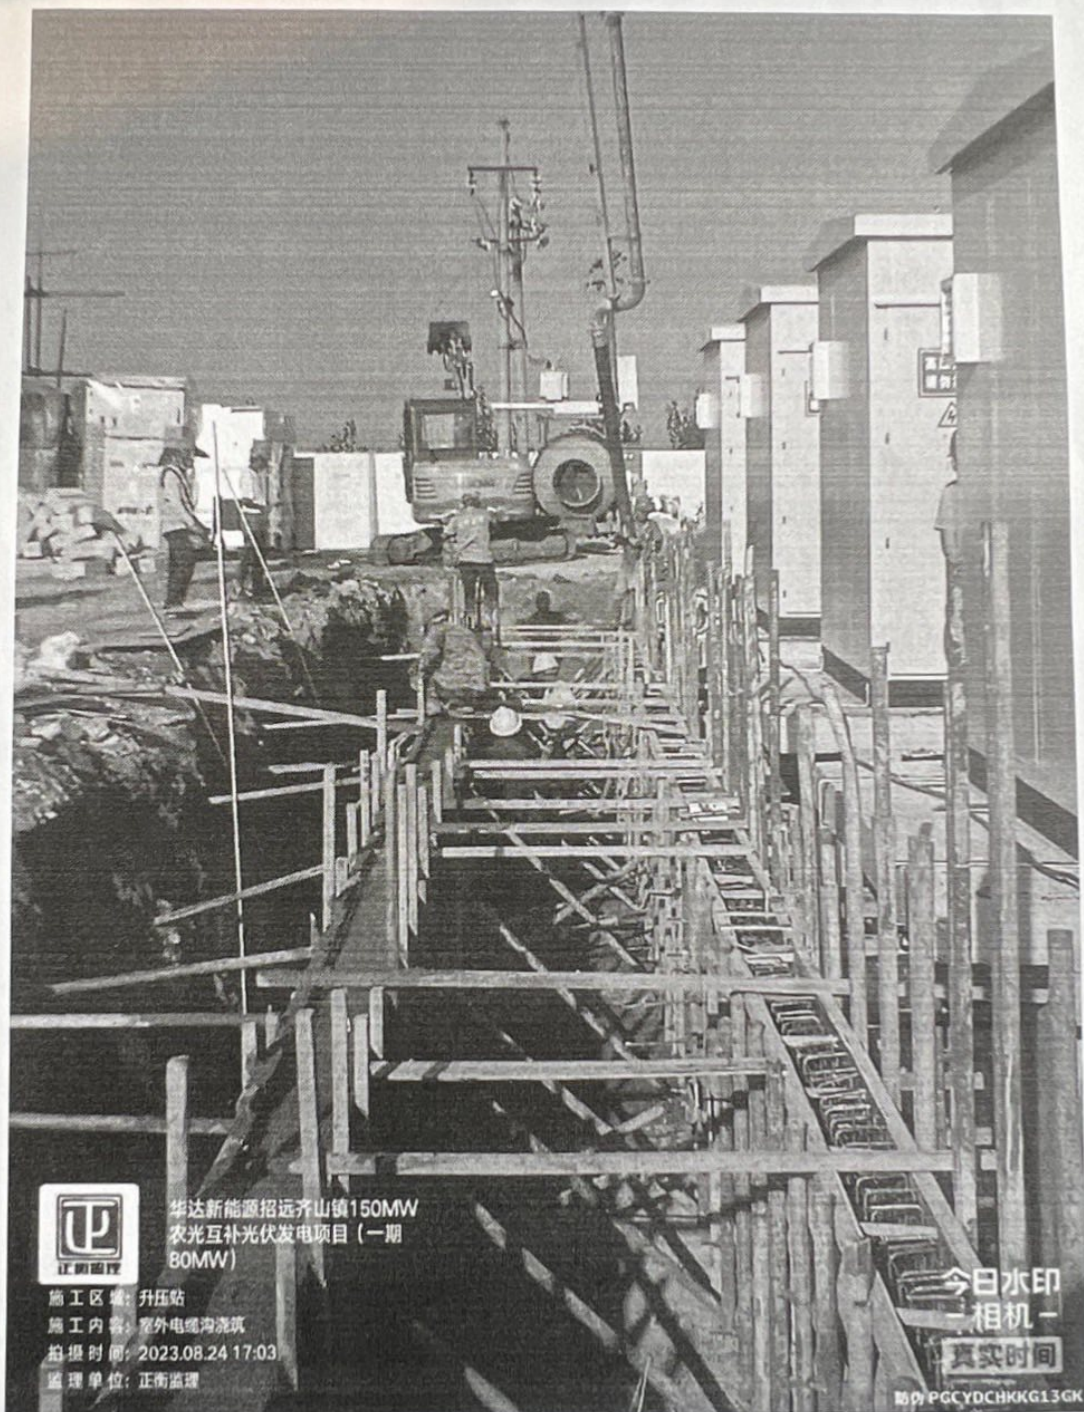

手机扫描王
