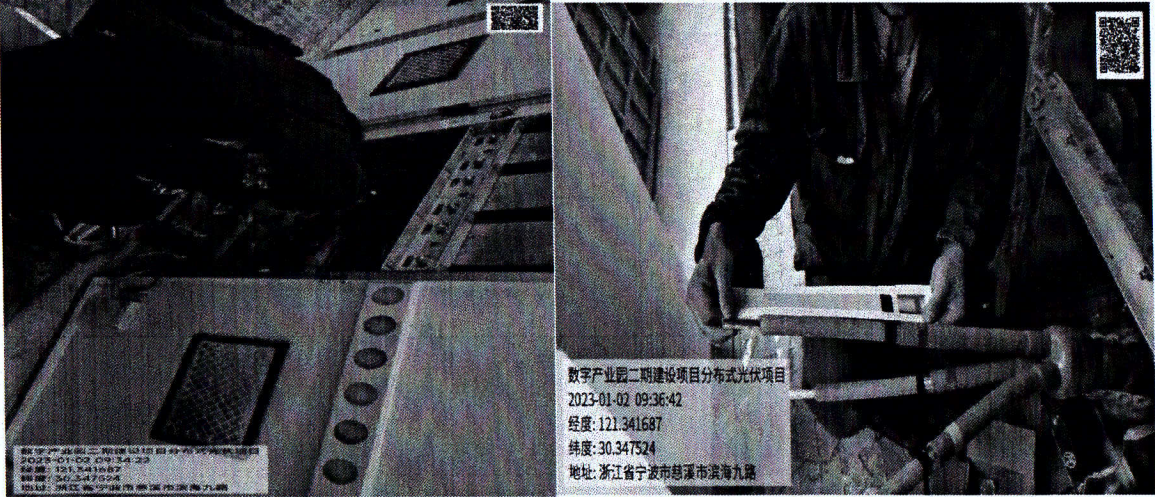



旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-PZJL-20230102

日期及天气：2023 年 01 月 02 日	多云转阴	施工单位：浙江阳明电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：项目 4#、5#配电房变压器，3#和 6#配电房高压接线柜，箱变和开关站，储能设备高压电缆终端制作		
旁站监理开始时间：09：10，12：40		旁站监理结束时间：11：30，15：30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、智能终端产业园二期园区项目的 4#、5#配电房变压器，3#和 6#配电房高压接线柜，箱变和开关站，储能设备高压电缆终端制作。 2、现场施工人员：10 人，管理人员：3 人。 3、施工机械：无。施工工具若干 4、图纸要求使用冷缩套管式终端，现场检查终端制作用套管符合图纸要求。现场在制作过程中要求工人对线缆保护好的同时进行制作，制作时按套管厂家说明书及要求尺寸严格执行。在检查半导体预留尺寸与说明书要求一致的情况下，绝缘体外表清洁符合要求的情况下进行冷缩管包扎。施工过程符合要求。		
 发现的问题及处理情况： 无		
旁站监理人员（签字）： 		
2023 年 01 月 02 日		

注：本表一式 3 份，监理项目部留存。
