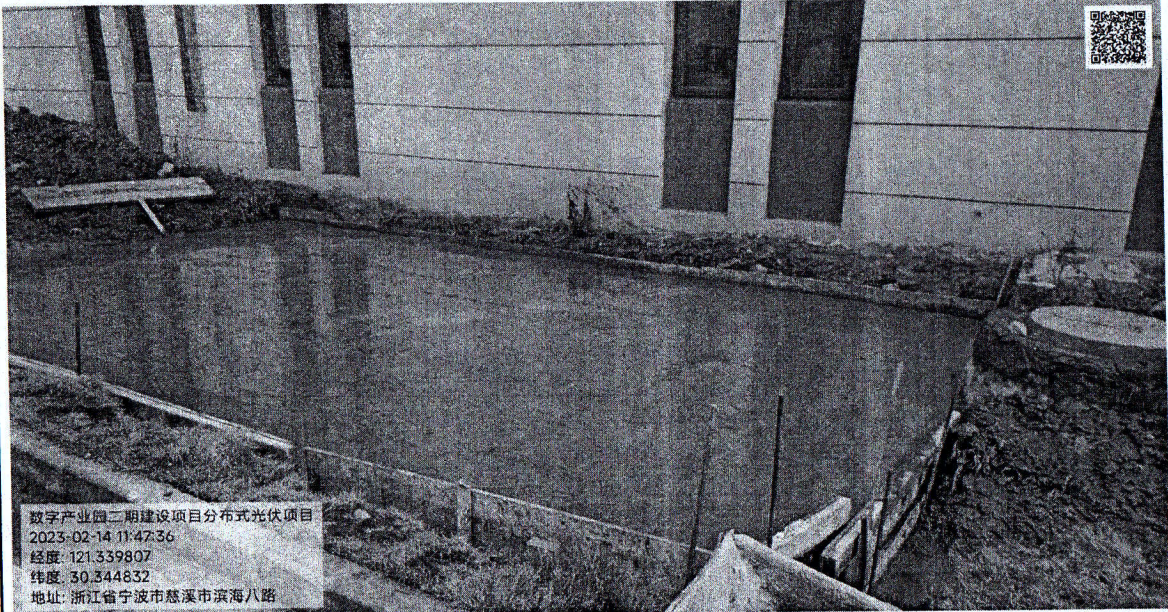


旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-PZJL-20230214

日期及天气：2023 年 02 月 14 日 晴转多云	施工单位：浙江阳明电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：智能终端产业园二期园区内 C 区开关站设备基础底板砼浇筑	
旁站监理开始时间：09：30	旁站监理结束时间：11：30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、智能终端产业园二期园区内 C 区开关站设备基础底板进行砼浇筑。 2、现场施工人员：7 人，管理人员：3 人。 3、施工机械：商砼车 1 辆，震动棒 2 把，铁锹四把等。 4、图纸要求混凝土强度等级达到 C30 强度，现场采用 C30 强度商品砼，符合图纸要求。钢筋网片绑扎符合规范要求。现场在浇筑过程中要求工人对基础周边设施保护好的同时进行浇筑砼，在基坑内混凝土浇筑振捣充分，表面抹灰平整，作业过程安全，施工过程符合要求。	
 数字产业园二期建设项目分布式光伏项目 2023-02-14 11:47:36 经度: 121.339807 纬度: 30.344832 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海八路	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 刘景瑞 2023 年 02 月 14 日	

注：本表一式 3 份，监理项目部留存。
