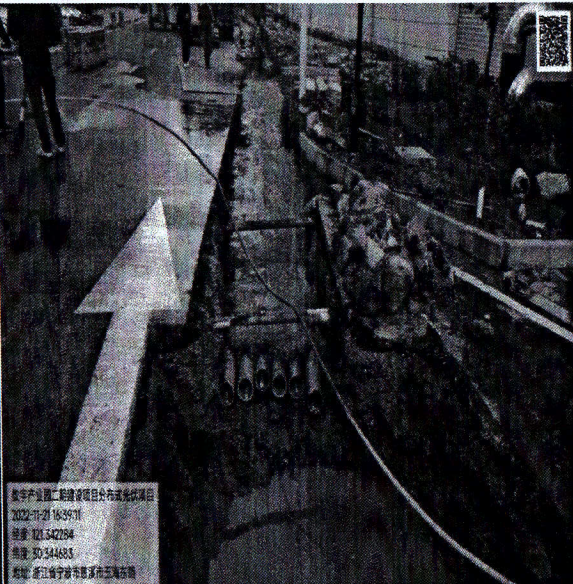



旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-PZJL-20221121

日期及天气：2022 年 11 月 21 日 多云转小雨	施工单位：浙江阳明电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：智能终端产业园二期园区内 D 区 11#厂房东侧原电缆井至 10#配电房外侧电缆井电缆沟包封砼浇筑	
旁站监理开始时间：15: 00	旁站监理结束时间：16: 50
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、智能终端产业园二期园区内 D 区 11#厂房东侧原电缆井至 10#配电房外侧电缆井电缆沟包封砼浇筑包封进行砼浇筑。 2、现场施工人员：6 人，管理人员：3 人。 3、施工机械：商砼车一辆，震动棒一把，铁锹四把等。 4、图纸要求混凝土强度等级达到 C30 强度，现场采用 C30 强度商品砼，符合图纸要求。现场在浇筑过程中要求工人对电缆沟周边设施保护好的同时进行浇筑砼，在支模模具内混凝土浇筑振捣充分，表面抹灰平整，作业过程安全，施工过程符合要求。	
 	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2022 年 11 月 21 日	

注：本表一式 3 份，监理项目部留存。
