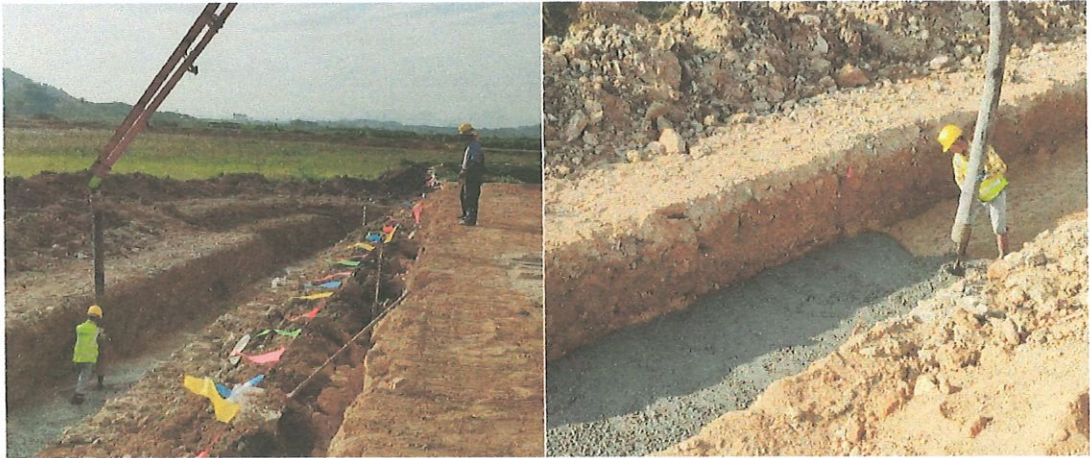


旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-001

日期及气候：2023年12月06日 多云 27/15℃	工程地点：升压站
旁站监理的部位及工序：西侧挡土墙垫层砼浇筑	
旁站监理开始时间：15:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C15 商砼 35m³； 4. 施工人员 3 名； 5. 振捣棒 1 台； 6. 现场设备配备齐全。	
	
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号：C15商砼，符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温昌树 2023 年 12 月 06 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：丁伟印 2023 年 12 月 06 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-002


日期及气候：2023年12月08日 多云 26/16℃	工程地点：升压站
旁站监理的部位及工序：西侧挡土墙砼浇筑	
旁站监理开始时间：08:30	旁站监理结束时间：13:00
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C25 商砼； 4. 施工人员 5 名； 5. 振捣棒 1 台； 6. 现场设备配备齐全。	
	
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号：C25商砼，符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温昌树 2023 年 12 月 8 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：李俊伟 2023 年 12 月 08 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-003


日期及气候：2023年12月18日 多云 21/13℃	工程地点：升压站
旁站监理的部位及工序：西侧挡土墙砼浇筑	
旁站监理开始时间：08:30	旁站监理结束时间：17:00
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C25 商砼 126m³； 4. 混凝土工 3 名，木工 4 名； 5. 泵车 1 辆，振捣棒 1 台； 6. 现场设备配备齐全。	
	
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号：C25商砼，符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： 	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 
2023年12月18日	2023年12月18日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-004


日期及气候：2023年12月23日 多云 21/13℃	工程地点：升压站
旁站监理的部位及工序：西侧挡土墙砼浇筑（50-90米）	
旁站监理开始时间：08:32	旁站监理结束时间：17:10
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C25 商砼 130m³； 4. 混凝土工 3 名，木工 2 名； 5. 泵车 1 辆，振捣棒 1 台； 6. 现场设备配备齐全。	
	
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号：C25商砼，符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023年 12月 23日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023 年12月23 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-005

日期及气候：2023年12月27日 多云 22/12℃	工程地点：升压站
旁站监理的部位及工序：西南侧挡土墙（5米+20米）x1.75米砼浇筑	
旁站监理开始时间：09:30	旁站监理结束时间：11:50
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C25 商砼 50m³； 4. 混凝土工 3 名，木工 2 名； 5. 泵车 1 辆，振捣棒 1 台； 6. 现场设备配备齐全。	
	
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号：C25商砼，符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： 	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 
2023 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 27 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-006

日期及气候：2023年12月30日 多云 25/14℃	工程地点：升压站
旁站监理的部位及工序：西南侧挡土墙（5米+20米）x2.4米砼浇筑	
旁站监理开始时间：14:30	旁站监理结束时间：17:00
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C25 商砼 70m³； 4. 混凝土工 2 名，木工 2 名； 5. 泵车 1 辆，振捣棒 1 台； 6. 现场设备配备齐全。	
 	
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号：C25商砼，符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： 	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 
2023年12月30日	2023年12月30日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-007


日期及气候：2024年09月18日 多云 25/34℃		工程地点：升压站	
旁站监理的部位及工序：储能区域基桩基础垫层和配电房基桩基础垫层			
旁站监理开始时间：08:00		旁站监理结束时间：16:30	
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C40 商砼 28m³，C15 商砼 113m³； 4. 混凝土工 6 名； 5. 泵车 1 辆，罐车 10 辆； 6. 现场设备配备齐全。			
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号：C40商砼，C15商砼，符合设计要求。			
			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2024 年 09 月 18 日		旁站监理人员（签字）：  2024 年 09 月 18 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目


编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-008

日期及气候：2024年09月25日 多云 25/34℃		工程地点：升压站	
旁站监理的部位及工序：配电房基础承台砼浇筑、消防水池基础垫层砼浇筑			
旁站监理开始时间：15:00		旁站监理结束时间：18:20	
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C30p6 砼 70m³； 4. 混凝土工 4 名； 5. 泵车 1 辆，罐车 6 辆； 6. 现场设备配备齐全。			
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号： C30p6商砼，符合设计要求。			
			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2024 年 9 月 25 日		旁站监理人员（签字）：  2024 年 9 月 25 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表


工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-009

日期及气候：2024年09月27日 多云 26/34℃		工程地点：升压站	
旁站监理的部位及工序：储能区域基础筏板、事故油池基础筏板、配电房-1.0米底板垫层			
旁站监理开始时间：09:00		旁站监理结束时间：19:30	
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C30 砼 298m³、C30p6 砼 7m³、 C15 砼 7m³； 4. 混凝土工 6 名； 5. 泵车 1 辆，罐车 10 辆； 6. 现场设备配备齐全。			
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号：C30砼、C30p6砼、 C15砼，符合设计要求。			
			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2024 年 9 月 27 日		旁站监理人员（签字）：  2024 年 9 月 27 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-010

日期及气候：2024年09月30日 多云 26/35℃		工程地点：升压站	
旁站监理的部位及工序：配电房-1.0米地梁及底板 GIS基础垫层 1#主变压器基础垫层			
旁站监理开始时间：16:00		旁站监理结束时间：20:00	
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C30p6 砼 55m³、 C15 砼 14m³； 4. 混凝土工 5 名； 5. 泵车 1 辆，罐车 6 辆； 6. 现场设备配备齐全。			
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号：C30p6砼、 C15砼，符合设计要求。			
			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2024 年 09 月 30 日		旁站监理人员（签字）：  2024 年 09 月 30 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表


工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-011

日期及气候：2024年10月01日 多云 25/32℃		工程地点：升压站	
旁站监理的部位及工序：配电房-0.5米基础垫层			
旁站监理开始时间：17:00		旁站监理结束时间：18:10	
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C15 砼 7m³； 4. 混凝土工 2 名； 5. 200 型挖机 1 辆，罐车 1 辆； 6. 现场设备配备齐全。			
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号：C15砼，符合设计要求。			
			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2024 年 10 月 01 日		旁站监理人员（签字）：  2024 年 10 月 01 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

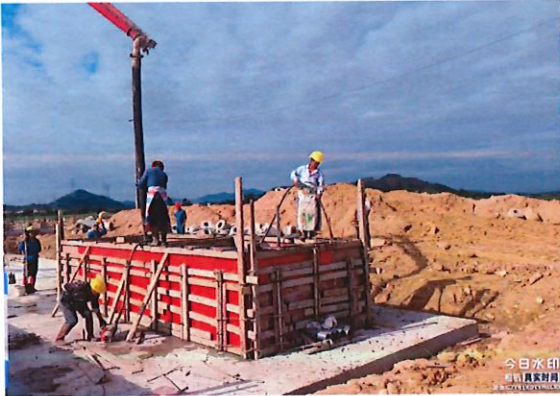
工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-012

日期及气候：2024年10月02日 多云 24/30℃		工程地点：升压站	
旁站监理的部位及工序：消防水池基础垫层			
旁站监理开始时间：15:40		旁站监理结束时间：16:30	
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C15 砼 7m³； 4. 混凝土工 2 名； 5. 200 型挖机 1 辆，罐车 1 辆； 6. 现场设备配备齐全。			
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号：C15砼，符合设计要求。			
			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2024年10月02日		2024年10月02日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-013

日期及气候：2024年10月05日 多云 22/31℃		工程地点：升压站	
旁站监理的部位及工序：电池舱基础、主变事故油池剪力墙、顶板、配电房-0.5m筏板、±0.00m基础梁 附属房基础垫层、SVG设备基础垫层、消防水池基础垫层			
旁站监理开始时间：08:30		旁站监理结束时间：17:00	
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C30 砼 42m³ C30P6 砼 63m³ C15 砼 14m³； 4. 混凝土工 5 名、木工 2 名； 5. 泵车 1 辆，罐车 6 辆； 6. 现场设备配备齐全。			
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号： C30砼 C30P6砼 C15砼，符合设计要求。			
			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2024年10月05日		旁站监理人员（签字）：  2024年10月05日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目


编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-014

日期及气候：2024年10月06日 多 云 24/33℃		工程地点：升压站
旁站监理的部位及工序：配电楼±0.00m基础垫层砼浇筑		
旁站监理开始时间：17:20		旁站监理结束时间：18:10
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C15 砼 12m³； 4. 混凝土工 3 名； 5. 200 型挖机 1 辆，罐车 2 辆； 6. 现场设备配备齐全。		
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号：C15砼，符合设计要求。		
		
发现问题：无		
处理意见：		
备 注：		
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：  2024 年 10 月 06 日		旁站监理人员（签字）：  2024 年 10 月 06 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-015

日期及气候：2024年10月07日 多 云 25/32℃		工程地点：升压站	
旁站监理的部位及工序：配电楼±0.00m基础底板及梁，储能区交流舱基础和防火墙（-0.80m段）砼浇筑			
旁站监理开始时间：16:30		旁站监理结束时间：20:10	
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C30 砼 40m³ C30P6 砼 30m³； 4. 混凝土工 5 名； 5. 泵车 1 辆，罐车 6 辆； 6. 现场设备配备齐全。			
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号：C30砼 C30P6砼，符合设计要求。			
			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2024 年 10 月 07 日		旁站监理人员（签字）：  2024 年 10 月 06 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

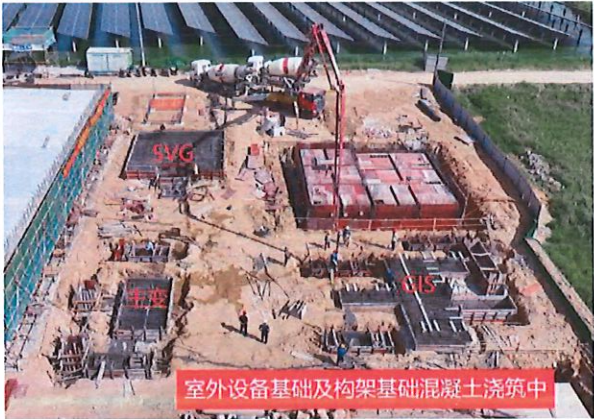
编号: ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-016

日期及气候：2024年10月16日 阴转多云 25/32℃		工程地点：升压站	
旁站监理的部位及工序：消防水池基础筏板、梁			
旁站监理开始时间：08:30		旁站监理结束时间：11:50	
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C30P6 砼 91m³； 4. 混凝土工 6 名； 5. 泵车 1 辆，罐车 6 辆； 6. 现场设备配备齐全。			
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号：C30P6 砼，符合设计要求。			
			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2024 年 10 月 16 日		旁站监理人员（签字）：  2024 年 10 月 16 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目编号：ZHJL-HFTW-SYZ-TJ-PZJL-018

日期及气候：2024年10月23日 多 云 22/29℃		工程地点：升压站	
旁站监理的部位及工序：主变压器基础、构架基础、SVG基础、GIS基础			
旁站监理开始时间：13:50		旁站监理结束时间：19:30	
施工情况：1. 施工单位现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场； 2. 技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训； 3. 采用海丰县广建混凝土有限公司 C30 砼 160m³； 4. 混凝土工 5 名； 5. 泵车 1 辆，罐车 10 辆； 6. 现场设备配备齐全。			
监理情况：1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求； 2. 对现场施工人员进行安全技术交底； 3. 检查机械运转正常； 4. 材料型号：C30砼，符合设计要求。			
 室外设备基础及构架基础混凝土浇筑中			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 温昌树 年 月 日		旁站监理人员（签字）： 王洪伟 2024年10月23日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

