

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-69

日期及气候：2023年9月13日 阵雨 32/24℃

工程地点：光伏区D地块7#方阵

旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货

旁站开始时间：08:20 旁站结束时间：09:30

旁站开始时间：14:20 旁站结束时间：15:20

施工情况：

1. 施工单位材料员和安全员均已到场；
2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx104 根；
3. 施工人员 2 名；
4. 板车 4 辆，20 吨吊车 1 辆。



监理情况：

1. 检查特种作业人员的资质符合要求；
2. 检查吊车运转正常；
3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx104根936米；
4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。

发现问题：其中2根管桩外观质量不合格，蜂窝麻面较多，不符合规范要求。

处理意见：质量不合格的管桩退场。

备 注：

总包单位：浙江阳明电力建设有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：温昌村

旁站监理人员（签字）：李佩平

2023年09月13日

2023年09月13日


注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-70

日期及气候：2023年9月14日 阴 32/24℃	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：08:50 旁站结束时间：10: 30	旁站开始时间：14: 50 旁站结束时间：15: 25
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m$\times$80 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m$\times$80根720米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：  2023年09月14日	旁站监理人员（签字）：  2023年9月14日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。

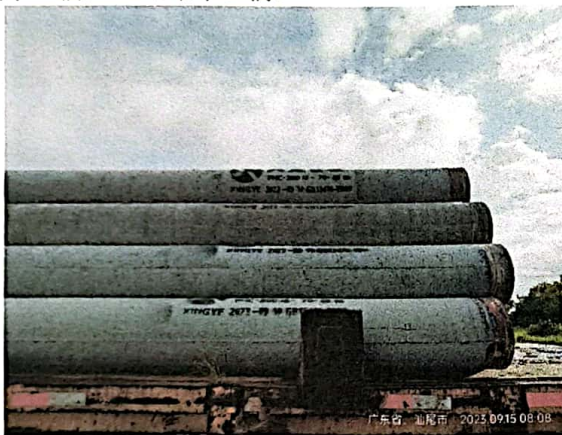


扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-71

日期及气候：2023年9月15日 阵雨 29/24℃		工程地点：光伏区D地块7#方阵	
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:20		旁站结束时间：09:20	
旁站开始时间：14:10		旁站结束时间：15:30	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx104 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，20 吨吊车 1 辆。  			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx104根936米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：[Signature] 2023年09月15日		旁站监理人员（签字）：[Signature] 2023年09月15日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-72

日期及气候：2023年9月17日 多云 31/24℃		工程地点：光伏区D地块7#方阵	
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:00 旁站结束时间：08:27		旁站开始时间：14:40 旁站结束时间：15:45	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的PHC-300 AB-70-9mx80根； 3. 施工人员2名； 4. 板车3辆，20吨吊车1辆。  			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx80根720米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 陆昌树 2023年09月17日		旁站监理人员（签字）： 蒋振平 2023年09月17日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-73

日期及气候： 2023年9月18日 晴 34/25℃		工程地点： 光伏区D地块7#方阵	
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 08:10 旁站结束时间： 09: 10		旁站开始时间： 14: 50 旁站结束时间： 17: 30	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的PHC-300 AB-70-9mx110 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，20 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx110根990米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题： 无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位： 浙江阳明电力建设有限公司		监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 温长村 2023年09月18日		旁站监理人员（签字）： 袁振年 2023年09月18日	

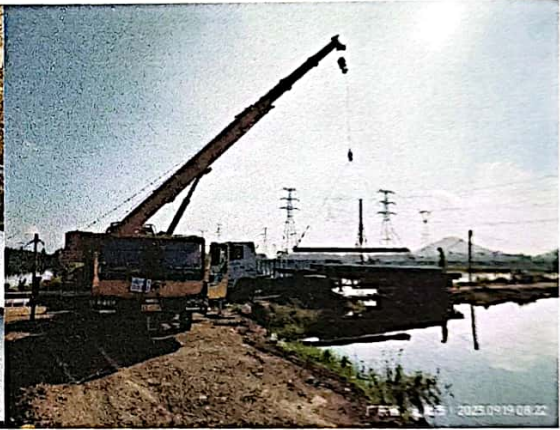

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-74

日期及气候： 2023年9月19日 多云 33/24℃	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：08:00 旁站结束时间：09:00	旁站开始时间：15: 50 旁站结束时间：16: 30
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx80 根，PHC-300AB-70-10mx22 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，20 吨吊车 1 辆。 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx80根，PHC-300AB-70-10mx22根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：  2023年09月19日	旁站监理人员（签字）：  2023年 9月 19日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-75

日期及气候： 2023年9月20日 多云 34/25℃	工程地点： 光伏区D地块7#方阵
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间： 08:00 旁站结束时间： 09: 50	旁站开始时间： 14: 50 旁站结束时间： 15: 30
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx14 根，PHC-300AB-70-10mx58 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。  	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx14根，PHC-300AB-70-10mx58根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： <u>温昌树</u> 2023年9月20日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： <u>高振平</u> 2023年9月20日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建
