

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候： 2023年8月1日 多云 31/25℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：7:55	监理旁站结束时间：10:20
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。	
 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023年08月01日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023年08月01日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-



日期及气候：2023年8月2日 多云 33/25℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：6:50	监理旁站结束时间：11:20
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，25 吨吊车 1 辆。 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 4车120根1080米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题:无	
处理意见:	
备 注:	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温崇树	旁站监理人员（签字）：高振平
2023年08月02日	2023年08月02日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目		编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-	
日期及气候：2023年8月3日 多云 35/25℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：7:40		监理旁站结束时间：9:10	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。			
			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题:无			
处理意见:			
备 注:			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023年08月03日		旁站监理人员（签字）：  2023年08月03日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年8月4日 多云转阴 33/26℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：14:30		监理旁站结束时间：15:50	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温品树 2023年08月04日		旁站监理人员（签字）：肖振平 2023年08月04日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候： 2023年8月5日 多 云 34/26℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：14:25		监理旁站结束时间：15:20	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。  			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题:无			
处理意见:			
备 注:			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023年08月05日		旁站监理人员（签字）：  2023年08月05日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年8月6日 晴转多云 33/26℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:30 监理旁站结束时间：09:10		旁站开始时间：16:50 监理旁站结束时间：17:30	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。			
			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温品坤 2023年08月06日		旁站监理人员（签字）：高振平 2023年08月06日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年8月7日 晴转多云 34/26℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:00 监理旁站结束时间：08:40		旁站开始时间：14:50 监理旁站结束时间：16:20	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，25 吨吊车 1 辆。  			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 3车90根810米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温品材 2023年8月07日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：尚振平 2023年8月07日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

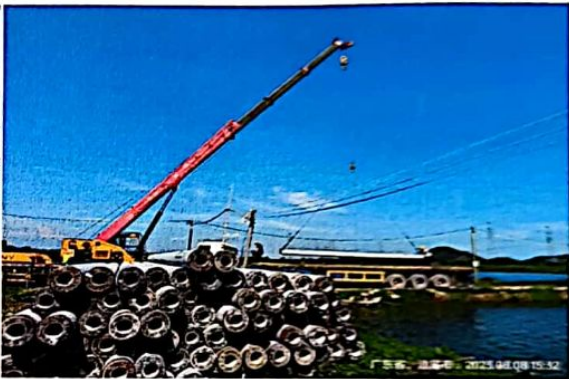



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候： 2023年8月8日 多 云 34/26℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：08:00 监理旁站结束时间：09:20	旁站开始时间：14:30 监理旁站结束时间：15:35
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，25 吨吊车 1 辆。  	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 3车90根810米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023年 08月 08日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023年 08月 08日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年8月10日 雷阵雨 32/24℃		工程地点：光伏区D地块3#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:10 监理旁站结束时间：10:10		旁站开始时间：14:30 监理旁站结束时间：15:50	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，25 吨吊车 1 辆。			
			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 4车120根1080米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：张昌村 2023年08月10日		旁站监理人员（签字）：高振平 2023年08月10日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

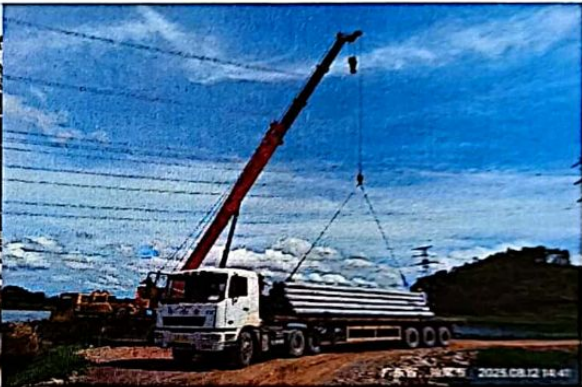


扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年8月12日 阴转多云 30/25℃		工程地点：光伏区D地块12#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
监理旁站开始时间：14:30		监理旁站结束时间：15:10	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 1 辆，25 吨吊车 1 辆。  			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 1车30根270米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：[Signature] 2023年08月12日		旁站监理人员（签字）：[Signature] 2023年08月12日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。




扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候： 2023年8月13日 阵雨 31/25℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
监理旁站开始时间：15:00	监理旁站结束时间：17:50
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，25 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 4车120根1080米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题:无	
处理意见:	
备 注:	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： 2023年08月13日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 2023年08月13日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。




扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年8月14日 阵雨 32/25℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
监理旁站开始时间：08:58	监理旁站结束时间：10:25
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，25 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 3车90根810米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：  2023 年 08 月 14 日	旁站监理人员（签字）：  2023 年 8 月 14 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候： 2023年8月15日 多云 33/27℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
监理旁站开始时间：07:50	监理旁站结束时间：10: 55
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，25 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 4车120根1080米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题:无	
处理意见:	
备 注:	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： <i>温昌树</i> 2023 年 08 月 15 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： <i>陈永年</i> 2023 年 08 月 15 日


注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年8月16日 阵雨 31/25℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
监理旁站开始时间：14:33	监理旁站结束时间：16:15
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m，PHC-300 AB-70-10m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx27根，PHC-300 AB-70-10mx31根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：  2023年8月16日	旁站监理人员（签字）：  2023年8月16日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。




扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年8月17日 阵雨 31/25℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
监理旁站开始时间：08:10	监理旁站结束时间：11:50
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m，PHC-300 AB-70-10m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，25 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx85根，PHC-300 AB-70-10mx29根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 	旁站监理人员（签字）： 
2023年08月17日	2023年08月17日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年8月18日 雷阵雨 33/25℃		工程地点：光伏区D地块10#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
监理旁站开始时间：15:10		监理旁站结束时间：16:00	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 1 辆，25 吨吊车 1 辆。			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx30根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：张昌村		旁站监理人员（签字）：高欣年	
2023年08月18日		2023年08月18日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年8月19日 雷阵雨 31/25℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
监理旁站开始时间：08:10	监理旁站结束时间：10:50
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，25 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx90根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温品树 2023 年 08 月 19 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：高振年 2023 年 08 月 19 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。





扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年8月20日 雷阵雨 31/25℃		工程地点：光伏区D地块10#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
监理旁站开始时间：15:50		监理旁站结束时间：17:25	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，25 吨吊车 1 辆。			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx90根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023 年 08 月 20 日		旁站监理人员（签字）：  2023 年 08 月 20 日	


注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候： 2023年8月21日 多云 31/22℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
监理旁站开始时间：15:00	监理旁站结束时间：16:15
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx60根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 	旁站监理人员（签字）： 
2023 年 08 月 21 日	2023 年 08 月 21 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建
