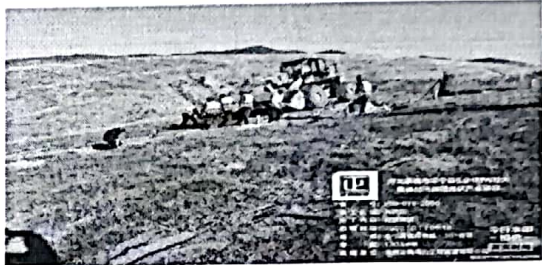



## 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目 编号：ZHJL-PZ-02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2022 年 10 月 12-14 日 晴-9-12℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 施工地点：第一、第二发电单元                                                                                                                                                                                                                                  |
| 旁站监理的部位和工序：桩基砼浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 旁站监理开始时间：7: 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 旁站监理结束时间：16: 00                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>施工情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>施工单位施工人员 10 人，施工员、安全员就位。</li> <li>施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</li> <li>混凝土为商砼，混凝土等级为 C30，汽</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>车运输砼自卸，共计 37 方。</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>监理情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。</li> <li>检查混凝土配合比、坍落度。</li> <li>现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>发现问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>现浇砼面处理高低不平。</li> <li>砼桩基表面粗糙。</li> <li>施工桩基钢筋笼外露高度、桩位不一致；</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>处理意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>安排人对现浇砼面高低不平进行处理。</li> <li>安排人对砼表面重新抹光。</li> <li>安排人对施工钢筋笼外露高度、桩位进行整改消缺。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p style="margin-left: 20px;">施工单位已整改完成。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>承包单位：天津蓝天太阳科技有限公司</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">质 检 员： </p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">日 期：2022 年 10 月 14 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>项目监理单位：正衡监理</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">旁站监理人员： </p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">日 期：2022 年 10 月 14 日</p> |

填报说明：由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。
