
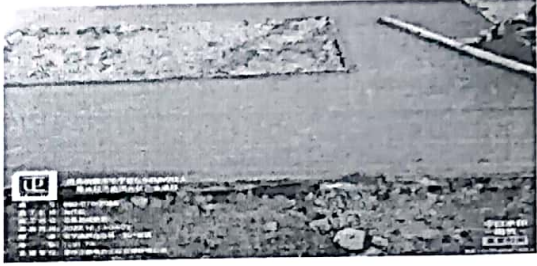




表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目 编号：ZHJL-PZ-03

| | |
|--|---|
| 日期及气候：2022 年 10 月 14 日 晴-9-12℃ | 施工地点：设备基础 |
| 旁站监理的部位和工序：箱变垫层砼浇筑 | |
| 旁站监理开始时间：7: 00 | 旁站监理结束时间：9: 00 |
| <p>施工情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 施工单位施工人员 10 人，施工员、安全员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 • 混凝土为商砼，混凝土等级为 C15，汽车运输砼自卸，共计 4 方。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div> | |
| <p>监理情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 • 检查混凝土配合比、坍落度。 • 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。 | |
| <p>发现问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 现浇砼面处理高低不平。 • 砼垫层表面粗糙。 | |
| <p>处理意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、安排人对现浇砼面高低不平进行处理。 2、安排人对砼表面重新抹光。 | |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p style="padding-left: 40px;">施工单位已整改完成。</p> | |
| <p>承包单位：天津蓝天太阳科技有限公司</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">质检员：</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">日期：2022 年 10 月 14 日</p> | <p>项目监理机构：正衡监理</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">旁站监理人员：</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">日期：2022 年 10 月 14 日</p> |

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。
