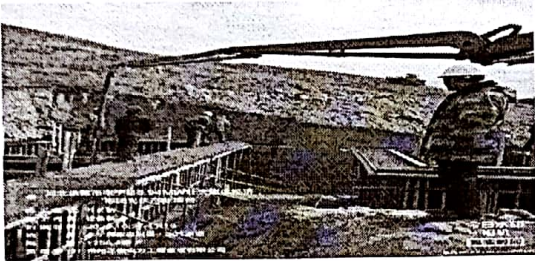
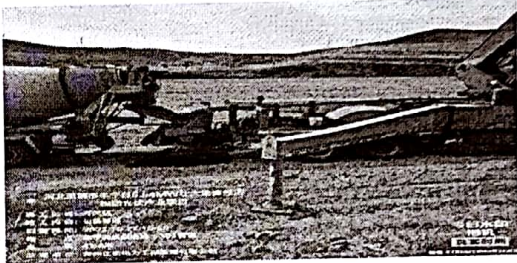


表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目 编号：ZHJL-PZ-06

日期及气候：2022 年 10 月 27 日 晴-12-10℃	施工地点：设备基础
旁站监理的部位和工序：一次舱、1#箱变基础墙砼浇筑	
旁站监理开始时间：10: 00	旁站监理结束时间：12: 30
施工情况： - 施工单位施工人员 10 人，施工员、安全员就位。 - 施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 - 混凝土为商砼，混凝土等级为 C30，汽车运输砼、汽车泵输送，共计 20 方。  	
监理情况： - 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 - 检查混凝土配合比、坍落度。 - 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： - 一次舱平台有漏振现象 - 现浇砼面处理高低不平。 - 预埋件固定点少。	
处理意见： - 安排人对一次舱平台漏振位置重新进行振捣， - 安排人对现浇砼面高低不平进行处理抹光。 - 安排木工人员重新支设模板。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成。	
承包单位：天津蓝天太阳科技有限公司 质 检 员：  日 期：2022 年 10 月 27 日	项目监理机构：正衡监理 旁站监理人员：  日 期：2022 年 10 月 27 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。
