

旁站监理记录表

工程名称：昆山旭发电子有限公司1.49MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KSXF-PZ-001

日期/天气：2022. 11. 27/晴 8℃

施工单位：苏州建德一方能源发展有限公司

旁站监理的部位或工序：7#厂房水泥支墩浇筑

旁站监理开始时间：09:00

旁站监理结束时间：14:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

当天对7#厂房北侧水泥支墩进行砼浇筑。施工前对模具进行定位复查、模具内涂刷脱模剂和杂物清理已检查，基本符合要求。施工人员 12 人，正确佩戴安全帽，设计要求强度等级达到 C30 强度，共22m³，现场采用商品混凝土。配备振捣棒 1 台，材料运输车1台，斗车4台。振捣充分密实，快挺慢提，整个时间持续约30S。预埋Φ12U型螺栓，螺栓放线定位准确，预留长度符合设计要求，表面收光到位，整个过程符合要求。



发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：李旭延

2022年11月27日

旁站监理记录表

工程名称：昆山旭发电子有限公司1.49MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KSXF-PZ-002

日期/天气：2022.11.27/晴 8℃

施工单位：苏州建德一方能源发展有限公司

旁站监理的部位或工序：3#厂房南侧电缆沟路面硬化浇筑

旁站监理开始时间：14:40

旁站监理结束时间：17:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

当天对3#厂房南侧过路电缆沟路面硬化浇筑。施工前电缆沟顶部平整到位，电缆沟进行置钢筋。施工人员 12 人，正确佩戴安全帽，四周警示到位。C30 强度，共 7m^3 ，现场采用商品混凝土。配备振捣棒 1 台，材料运输车1台，斗车0台现场开挖70公分深，宽90公分，底部压实平整，现场用 $\Phi 160$ 管镀锌钢管及 $\Phi 25$ 镀锌钢管，管口连接处隔绝处理，用混凝土包封管口连接处，管上下部用软土覆盖，上层与地面处铺设 $\Phi 12$ 钢筋网，用C30浇注与地面齐平，浇注前对原路面切口处进行洒水处理，。振捣充分密实，快挺慢提，整个时间持续约30S，整个过程符合要求。4小时左右收光到位。



发现的问题及处理情况：

无


旁站监理人员（签字）：李大海

2022年11月27日

旁站监理记录表

工程名称： 昆山旭发电子有限公司1.49MW 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-KSXF-PZ-003

日期/天气： 2022. 12. 06/晴 6℃	施工单位： 苏州建德一方能源发展有限公司
旁站监理的部位或工序： 7#厂房水泥支墩进行砼浇筑	
旁站监理开始时间： 08:00	旁站监理结束时间： 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 当天对7#厂房北侧水泥支墩进行砼浇筑。施工前对模具进行定位复查、模具内涂刷脱模剂和杂物清理已检查，基本符合要求。施工人员 13 人，正确佩戴安全帽，四周警示到位，临时用电作业规范。 C30 强度，共7m³，现场采用商品混凝土。配备振捣棒 1 台，材料运输车 1台，斗车4台。振捣充分密实，快挺慢提，整个时间持续约30S，整个过程符合要求。 	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	2022年12月06日

旁站监理记录表

工程名称：昆山旭发电子有限公司1.49MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KSXF-PZ-004

日期/天气：2022.12.08/晴 7℃

施工单位：苏州建德一方能源发展有限公司

旁站监理的部位或工序：7#厂房水泥支墩进行砼浇筑

旁站监理开始时间：08:30

旁站监理结束时间：17:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

当天对7#厂房水泥支墩进行砼浇筑。施工前对模具进行定位复查、模具内涂刷脱模剂和杂物清理已检查，基本符合要求。施工人员 13 人，正确佩戴安全帽，四周警示到位，临时用电作业规范。C30 强度，共30m³，现场采用商品混凝土。配备振捣棒 1 台，材料运输车1台，斗车4台。振捣充分密实，快提慢提，整个时间持续约30S，整个过程符合要求。



发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：

李大海

2022年12月08日

旁站监理记录表

工程名称：昆山旭发电子有限公司1.49MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KSXF-PZ-005

日期/天气：2022.12.11/多云 5℃

施工单位：苏州建德一方能源发展有限公司

旁站监理的部位或工序：培训中心电缆沟路面硬化浇筑

旁站监理开始时间：12:30

旁站监理结束时间：16:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

当天对培训中心处电缆沟进行砼浇筑。施工前电缆沟顶部平整到位，电缆沟进行置钢筋。施工人员 7人，正确佩戴安全帽，四周警示到位。C30 强度，共 7m^3 ，现场采用商品混凝土。配备振捣棒 1 台，材料运输车1台，斗车1台。底部压实平整，现场用DN160管镀锌钢管一根、DN25管两根，管口连接处隔绝处理，用混凝土包封管口连接处，管上下部用软土覆盖，上层与地面处铺设 $\Phi 12$ 钢筋网，用C30浇注与地面齐平，浇注前对原路面切口处进行洒水处理。振捣充分密实，快挺慢提，时间持续约30S，整个过程符合要求。4小时左右收光到位。



发现的问题及处理情况：

无

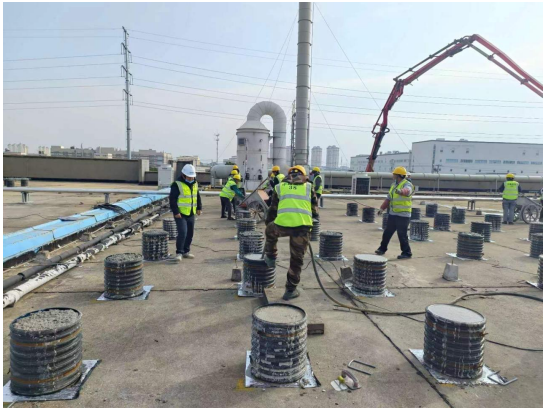
旁站监理人员（签字）：李大远

2022年12月11日

旁站监理记录表

工程名称： 昆山旭发电子有限公司1.49MW 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-KSXF-PZ-006

日期/天气： 2022.12.12/晴 3℃	施工单位： 苏州建德一方能源发展有限公司
旁站监理的部位或工序： 2#厂房水泥支墩浇筑	
旁站监理开始时间： 08:30	旁站监理结束时间： 16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 当天对2#厂房水泥支墩进行砼浇筑。施工前对模具进行定位复查、模具内涂刷脱模剂和杂物清理已检查，基本符合要求。施工人员 11人，正确佩戴安全帽，四周警示到位，临时用电作业规范。 C30 强度，共30m³，现场采用商品混凝土。配备振捣棒 1 台，材料运输车1台，斗车4台。振捣充分密实，快挺慢提，整个时间持续约30S，整个过程符合要求。检查支墩预留U型螺栓长度，约为4cm，基本可控。浇注完成320个。 	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 李太延	2022年12月12日

旁站监理记录表

工程名称： 昆山旭发电子有限公司1.49MW 分布式光伏发电项目

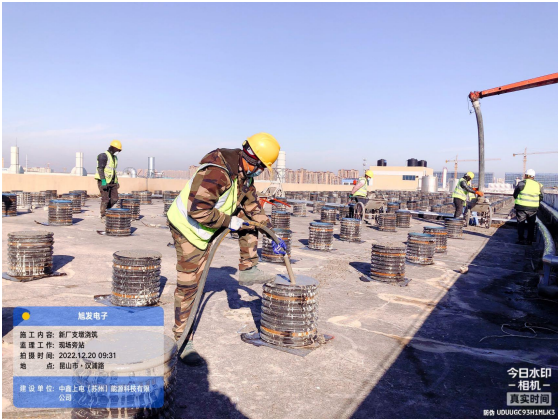
编号： ZHJL-KSXF-PZ-007

日期/天气： 2022.12.13/晴 1℃	施工单位： 苏州建德一方能源发展有限公司
旁站监理的部位或工序： 2#厂房水泥支墩浇筑	
旁站监理开始时间： 09：00	旁站监理结束时间： 16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 当天对2#厂房及培训中心水泥支墩进行砼浇筑。施工前对模具进行定位复查、模具内涂刷脱模剂和杂物清理已检查，基本符合要求。施工人员 11人，正确佩戴安全帽，警示围挡基本到位，检查支墩预留U型螺栓长度约为4cm，基本可控。混凝土用C30，用量22M³，江苏盛达飞建筑材料有限公司，泵送，浇注前对支墩模具内进行涂刷脱模剂，并对模具进行放线复测，浇注过程振捣密实到位，无漏浆，现场用电漏电保护工作正常。 	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 李大海	2022年12月13日

旁站监理记录表

工程名称： 昆山旭发电子有限公司1.49MW 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-KSXF-PZ-008

日期/天气： 2022.12.20/晴 -1℃	施工单位： 苏州建德一方能源发展有限公司
旁站监理的部位或工序： 3#厂房水泥支墩浇筑	
旁站监理开始时间： 09:30	旁站监理结束时间： 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 当天对3#厂房水泥支墩进行砼浇筑。施工前对模具进行定位复查、模具内涂刷脱模剂和杂物清理已检查，基本符合要求。施工人员 11人，正确佩戴安全帽，警示围挡基本到位，检查支墩预留U型螺栓长度约为4cm，基本可控。混凝土用C30，用量30M³，江苏盛达飞建筑材料有限公司，泵送，浇注前对支墩模具内进行涂刷脱模剂，并对模具进行放线复测，浇注过程振捣密实到位，无漏浆，现场用电漏电保护工作正常。  旭发电子 施工内容: 3#厂房支墩浇筑 监理单位: 苏州建德一方能源发展有限公司 旁站时间: 2022.12.20 09:31 地点: 昆山市·巴城镇 监理单位: 中德上海(苏州)能源科技有限公司 日期:  今日水印 一相机一 真实时间 相机: 68066C75H19A13	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 李太延	2022年12月20日
