


质量旁站监理记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目
编号:CZZH-TRMY-ZLPZ-008

日期及天气：2023.12.19 阴 7~12℃	施工单位：福建永福电力设计股份有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆敷设	
旁站监理开始时间：08 时 30 分	旁站监理结束时间：11 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 电缆敷设前，核对电缆型号、电压、规格符合设计要求。 2. 屋面电缆敷设已对桥架、线槽进行检查合格（桥架已安装牢固）；电缆敷设前已对开挖完成的电缆沟深度进行检查，符合图纸设计要求（0.8m）。 3. 电缆敷设时检查电缆未产生扭绞、打圈等现象，未受外力的挤压和损伤，无铠装压扁、护层断裂等缺陷，电缆敷设自然平直。 4. 检查各型号电缆弯曲半径符合规范要求，检查电缆间隔符合要求，敷设过程中应做好预防措施，电缆经过的孔洞或电缆进柜孔要及时补好防火泥，电缆应在按头、地沟处留有一定的余量，电缆敷设时，应排列整齐，与其他与敷设的电缆不宜交叉。 5. 检查桥架内电缆垂直敷设时，电缆在桥架的垂直段及转弯处应每隔 1.5m 进行固定绑扎固定。电缆桥架内的电缆敷设完后要及时整理使电缆排列整齐，避免交叉。 	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监人员（签字）：[Signature]	2023 年 12 月 19 日

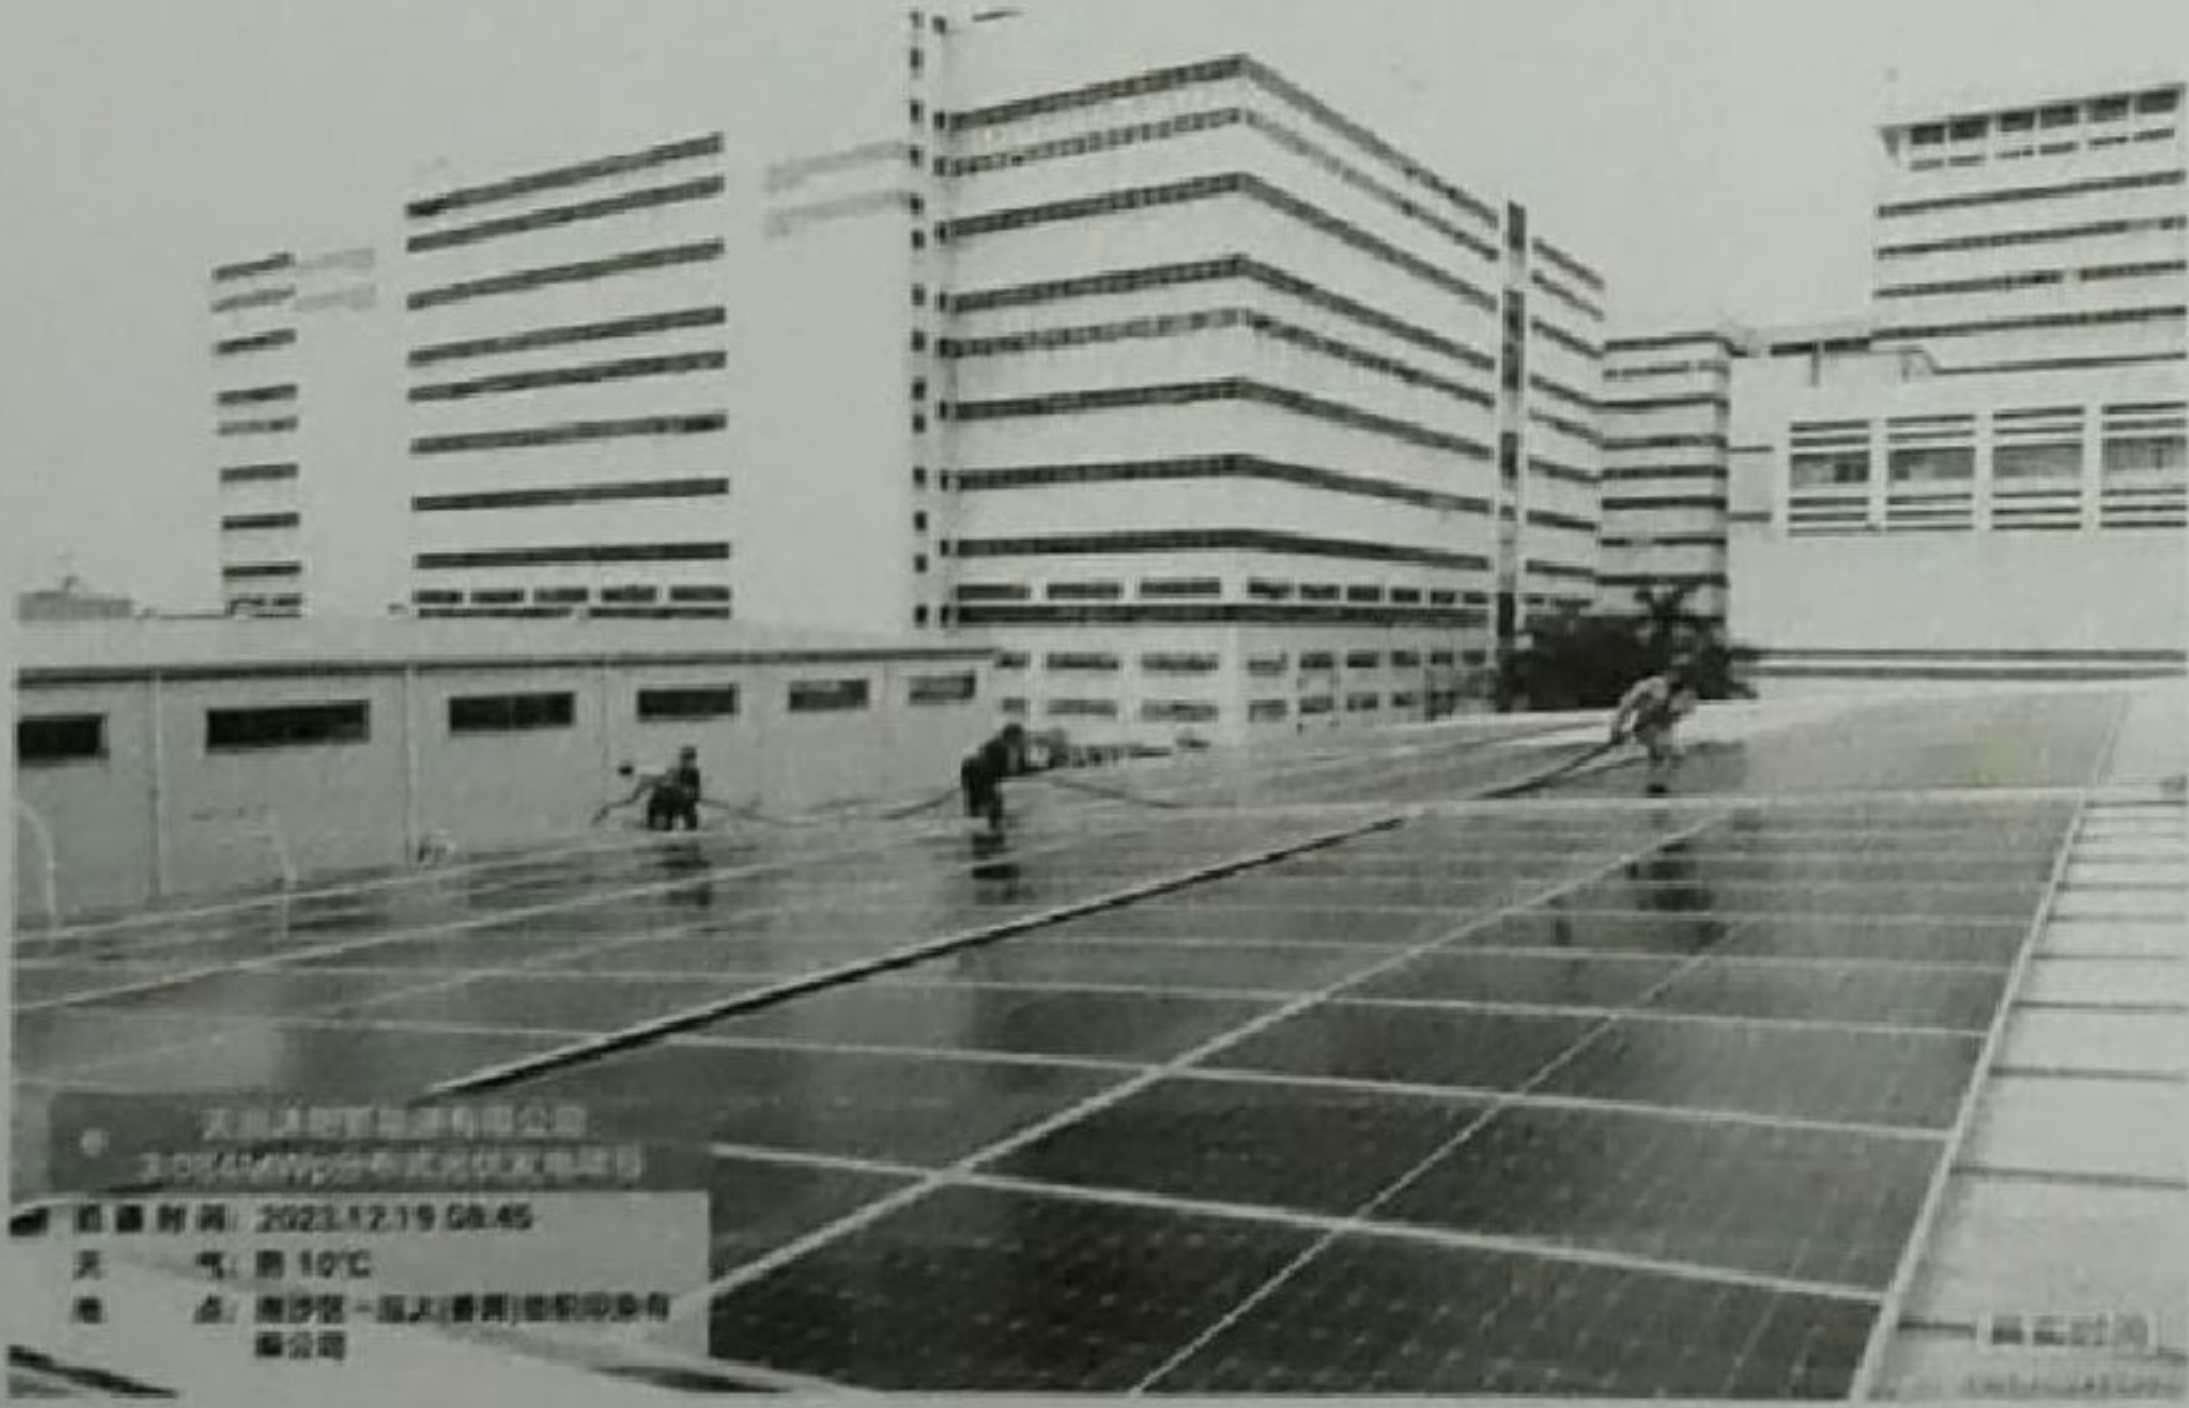
