

旁站监理记录表

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目


编号：JXM6-ZHJL-001

日期及天气：2023.05.13 晴	施工单位：浙江华伏太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序：东区车棚基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间：2023.05.13 下午 15 点 30 分	旁站监理结束时间：2023.05.13 下午 18 点 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、东区车棚基础垫层浇筑； 2、施工人员 6 人，施工机械：混凝土灌车、振捣器 1 台，浇筑顺序及方法：按照施工方案、操作工艺施工； 3、施工工具：插入式振动棒 2 根、铁锹、木抹子、钢抹子； 4、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 5、混凝土浇筑过程符合设计要求；	
发现的问题及处理情况： 1、质检员已到位。 2、施工机械良好。 3、混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子试验报告齐全。 4、混凝土塌落值 符合要求。 5、振捣方法：紧插慢拔，振捣点布置成梅花形，振捣间距不大于 500mm；振捣点时间及移位符合要求。 6、模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象。	
旁站监理人员（签字）：  2023年 5月 13日	

注：本表一式一份，监理项目部留存。



扫描全能王 创建

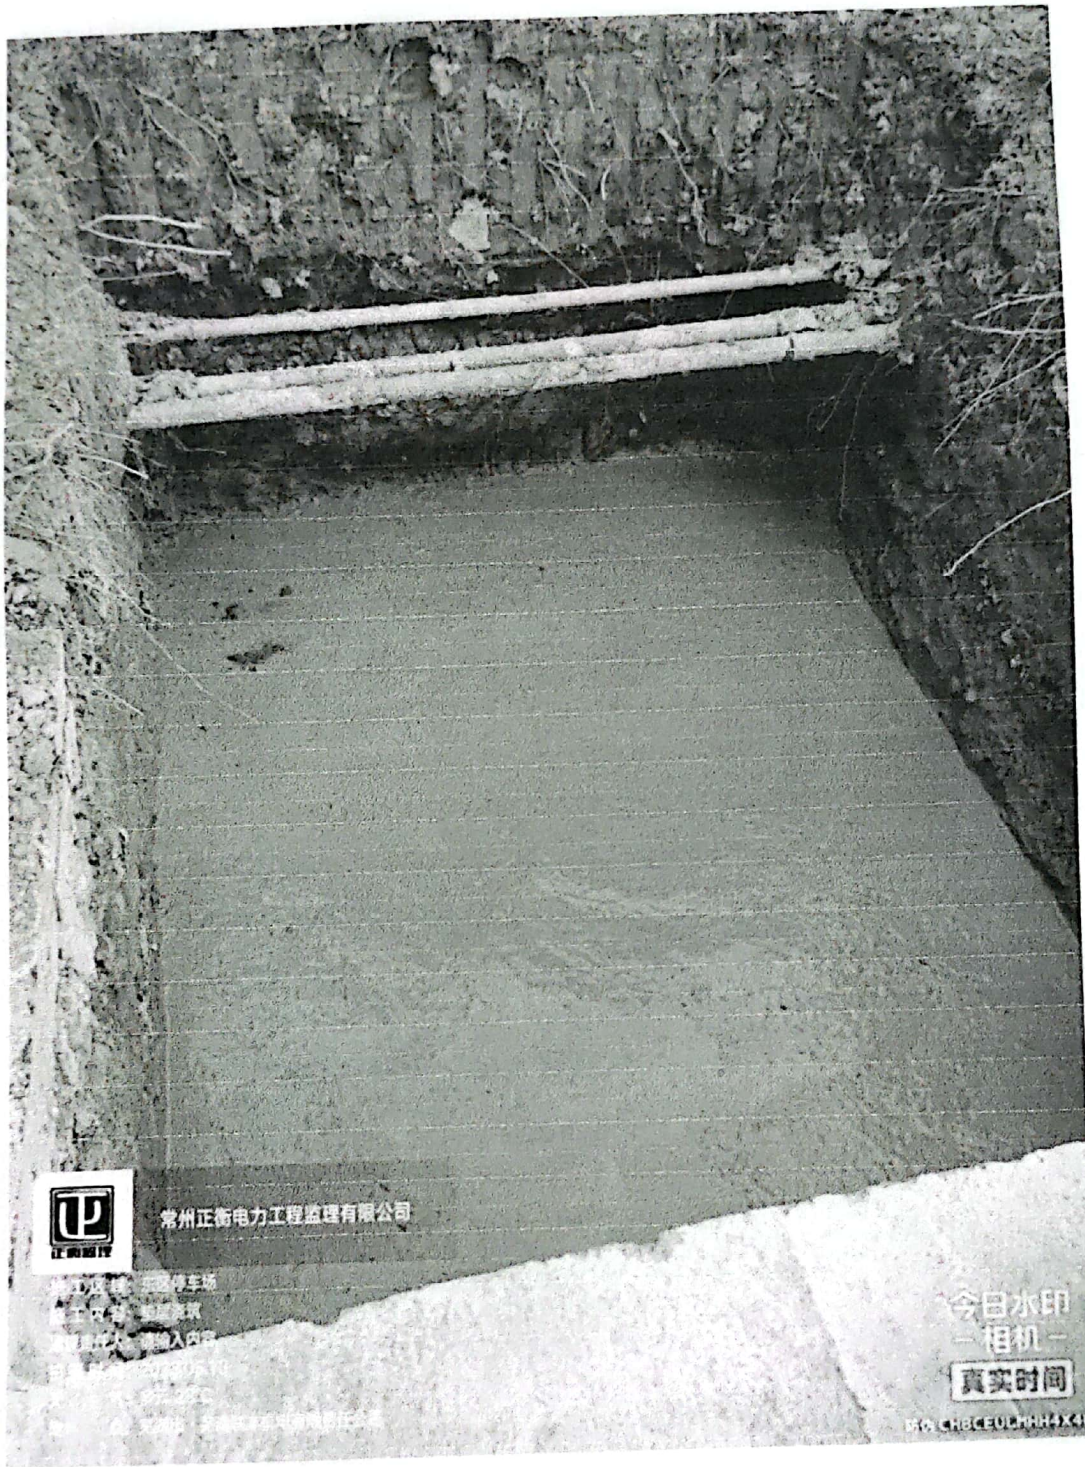

常州正衡电力工程监理有限公司

地址：常州经济开发区

联系人：张经理

电话：13921008100

传真：0519-88008100

网址：www.jzhel.com

邮编：213000

开户行：常州农村商业银行

账号：32050101000000000000

今日水印
— 相机 —

真实时间

DA-CH8CE0LPHH4X4H



扫描全能王 创建
