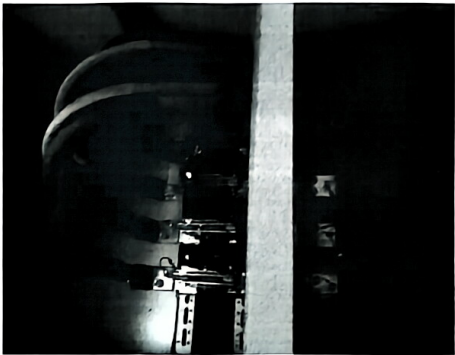


旁站监理记录表

工程名称：云南双柏县整县分布式光伏项目

编号：ZHJL-PZJL-002

日期及气候：2023年06月08日	工程地点：双柏县中山村并网点
旁站监理的部位或工序：逆变器到汇流箱电缆接线	
旁站监理开始时间：2023.06.08 8:30	旁站监理结束时间：2023.06.08 13:00
施工情况： 准备：1、安徽跨江电力有限公司负责人唐成均，施工人员3人。 2、主要设备：电缆剥皮削刀、铜接头、压钳、锯钢甲； 施工工艺：电缆头防潮→手、工具、材料清洁→电缆附件预先试装→剥皮绝缘层→铜屏蔽层处理→清洁主绝缘层表面→安装半导体管→接线。  	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、检查施工方人料机准备情况；3、电缆敷设接线时要求施工方按施工方案组织施工，管理人员到位；4、检查施工材料是否完好；5、制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：安徽跨江电力有限公司 质 检 员：唐成均 日 期：2023年06月08日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：贾金光 日 期：2023年06月08日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存1份。

