


质量旁站监理记录表


工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目
编号：ZHJL-ZHSW-001

日期及天气：2023.06.07 晴 22~31℃	施工单位：宝胜系统集成科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：设备基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间：9 时 20 分	旁站监理结束时间：11 时 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 设备基础垫层采用强度等级为 C30、坍落度为 140 ± 30 ，浇筑方量为 $18m^3$ 。 2. 施工前模板、钢筋已验收合格， $\Phi 12$ 钢筋，高度 150mm，钢筋间距 200mm，人员充足，振捣工具、设备齐全。 3. 浇筑方式为混凝土罐车自卸，人力配合，施工人员进行振捣、找平、压光。 4. 经检查，浇筑中混凝土振捣均匀到位，混凝土浇筑符合施工方案及国家工程建设强制性标准要求。	
	 上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目 工 序：混凝土垫层浇筑 拍摄时间：2023.06.07 10:41 地 点：黄浦区·上海中华商务联合印刷有限公司 天气：晴 24℃ 监理单位：宝胜系统集成科技股份有限公司 旁站监理：宝胜系统集成科技股份有限公司
发现的问题及处理情况： 1. 部分模板有开裂现象，已现场及时修补。	
旁站监理人员（签字）：高琰斌	2023 年 06 月 07 日

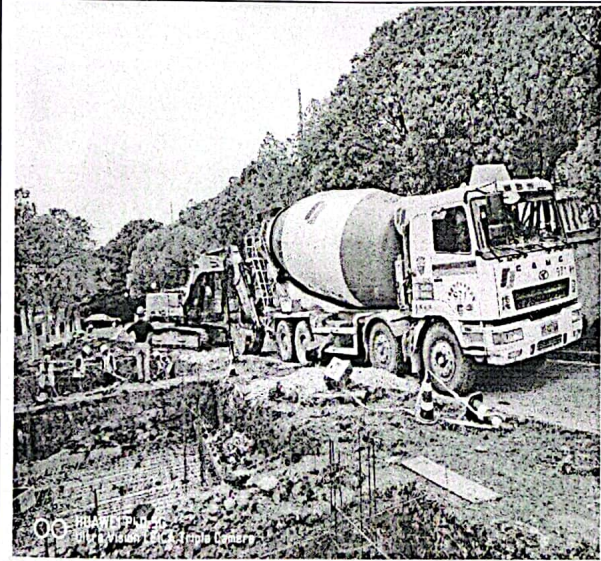

质量旁站监理记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目
编号:ZHJL-ZHSW-002

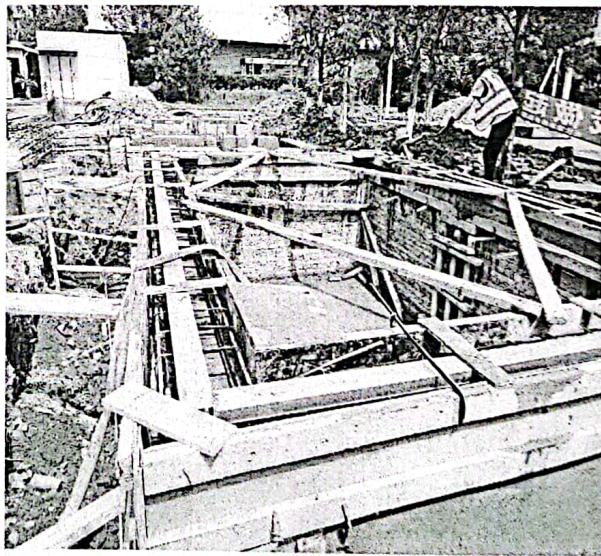日期及天气：2023.06.12 晴 24~33℃	施工单位：宝胜系统集成科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：设备基础柱、圈梁浇筑	
旁站监理开始时间：14 时 20 分	旁站监理结束时间：15 时 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 设备基础柱、圈梁采用强度等级为 C30、坍落度为 140 ± 30，浇筑方量为 6m^3。 2. 施工前模板、钢筋已验收合格，$\Phi 12$ 钢筋，高度 150mm，钢筋间距 200mm，预埋方钢尺寸符合要求，人员充足，振捣工具、设备齐全。 3. 浇筑方式为混凝土罐车自卸，人力配合，施工人员进行振捣、找平、压光。 4. 经检查，浇筑中混凝土振捣均匀到位，混凝土浇筑符合施工方案及国家工程建设强制性标准要求。	
	
发现的问题及处理情况： 1. 柱振捣深度较浅，已现场重新振捣，深度达 1m。	
旁站监理人员（签字）： 高逸斌 2023 年 06 月 12 日	

