

旁站监理记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JL-PZ-61

旁站的关键部位、关键工序	东郑光伏区9#、12#、15#箱变基础圈梁、顶板、梁、构造柱浇筑混凝土	施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023年12月03日9时00分	旁站结束时间	2023年12月03日11时40分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

一、施工情况：

- 当班施工负责人：1人、质量、安全专职人员：2人、1人；
- 当班施工作业人员共计：6人；其中振捣、下料各：1人、5人、泵送等特岗专业操作：1人；
- 砼浇筑施工机械设备、工具和施工用料、水、电等准备工作到位情况：已到位□未到位□；
- 砼设计强度等级：C30；砼材料与配合比报告是否经检验试验：是□否□；砼计量检测等器具是否经检验备齐：是□否□；
- 运输罐车：1台；输送泵车：1台，搅拌机：1台，商砼供货单位：平陆丰源混凝土拌合有限公司；
- 砼浇筑采用3米长插入式振动棒：1台；
- 砼浇筑从8:50开始至12:00完成，当班浇筑数量：10m³。


二、监理情况：

- 钢筋、模板验收是否符合设计要求：是□否□；
- 检查混凝土浇筑前是否进行安全技术交底：是□否□；
- 检查混凝土振捣是否符合要求：是□否□；
- 检查混凝土面收光是否符合要求：是□否□；
- 检查预埋件位置是否符合设计要求：是□否□；
- 当班砼塌落度抽样检测：1次，检测值：18.30cm（设计值：16cm至20cm）；
- 当班砼制作试块（见证取样）抗压试块1组，抗渗试块1组，同条件试块1组，共计3组。

旁站发现的问题及处理情况：无

旁站监理人员（签字）：[Signature] 2023年12月03日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

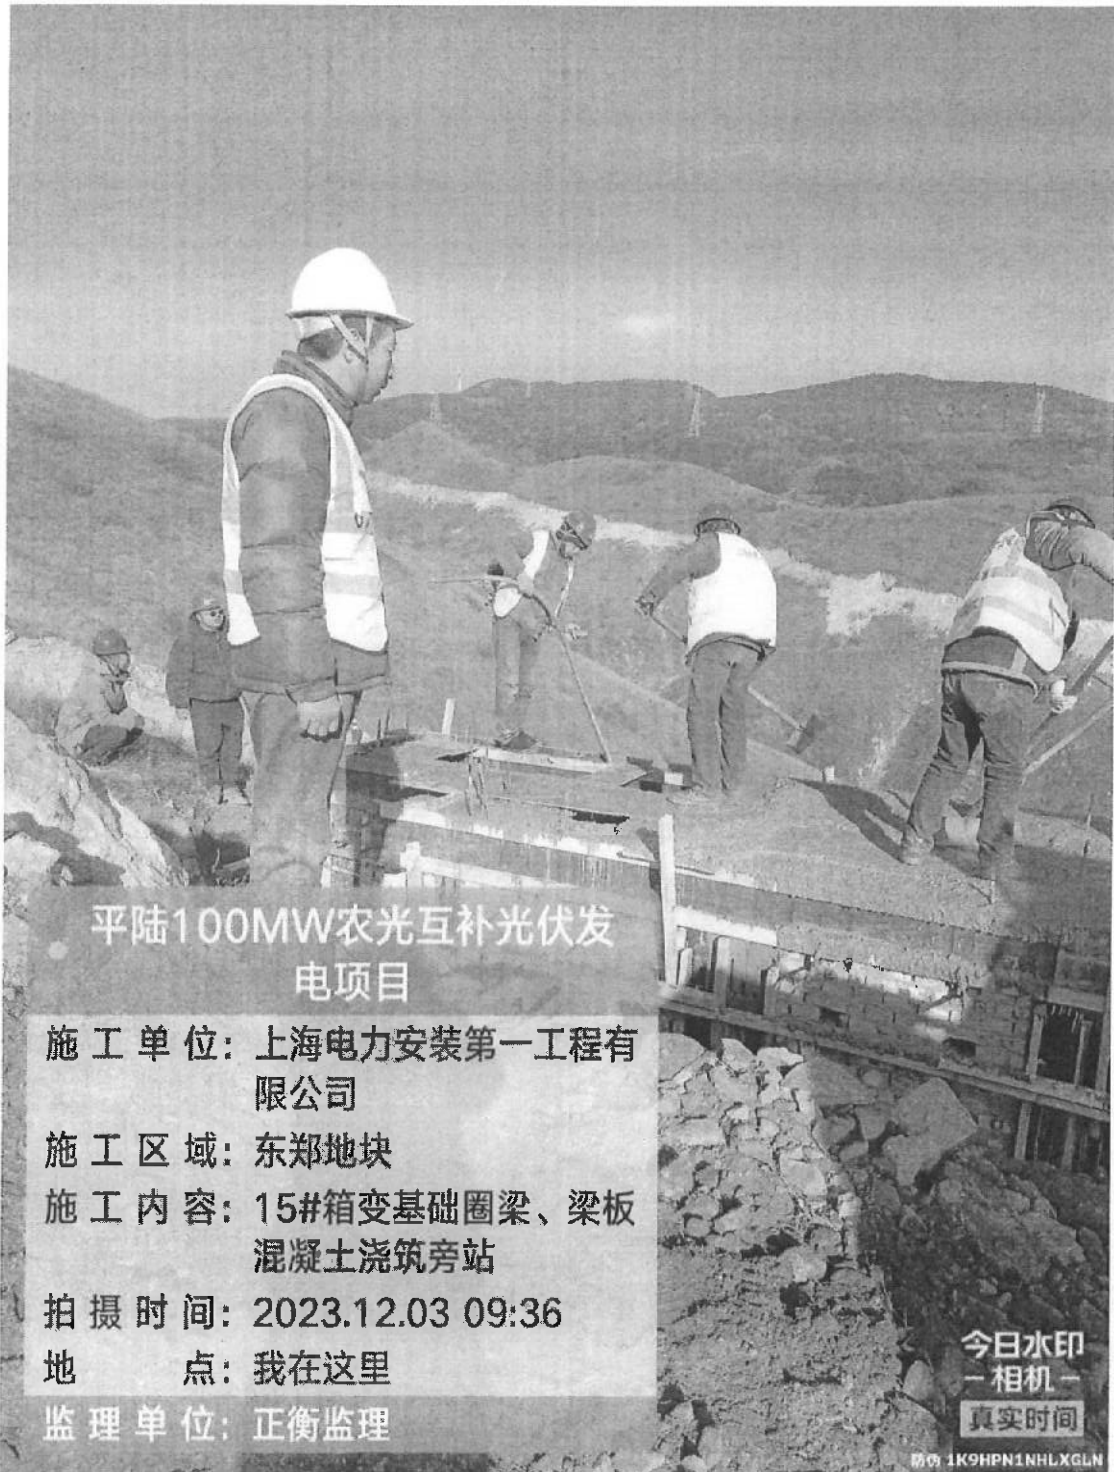

平陆100MW农光互补光伏发电项目

施工单位：上海电力安装第一工程有限公司

施工区域：东郑地块

施工内容：15#箱变基础圈梁、梁板
混凝土浇筑旁站

拍摄时间：2023.12.03 09:36

地点：我在这里

监理单位：正衡监理

今日水印
- 相机 -
真实时间

防伪 1K9HPN1NHLXGLN
