

旁站监理记录表

工程名称：平陆 100WM 农光互补光伏发电项目 东郑光伏区

编号：HDZQ-JL-PZ-073

旁站的关键部位、关键工序	9# 10# 11# 12# 箱变吊装	施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2024 年 01 月 09 日 08 时 30 分	旁站结束时间	2024 年 01 月 09 日 19 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

一、施工情况：现场人员及设备：项目经理 1 人、安全员 1 人、指挥 1 人、工人 8 人，25t 汽车吊 2 台、装载机 1 台。吊装前施工单位对工人进行了安全技术交底以及作业指导，9# 10# 11# 12# 箱变从风场路材料堆场运往场区对应的各基础进行吊装就位，今日吊装一切正常。

二、监理情况：一、检查吊装现场是否有安全技术交底及管理人员是否到岗，现场有安全技术交底、管理人员均到岗。二、检查吊装设备的合格证、检验报告以及操作人员的相关证书，设备及操作人员的相关证书齐全有效。三、检查设备的钢丝绳吊梁、吊钩是否有缺陷，经检查无缺陷。四、对箱变的二次运输及过程吊装进行跟踪及旁站。


旁站发现的问题及处理情况：9# 箱变吊装过程中有个工人站在吊装物体下，立即要求该工人走开，对吊装物保持一定安全距离。

旁站监理人员（签字）：

100武

2024 年 01 月 09 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

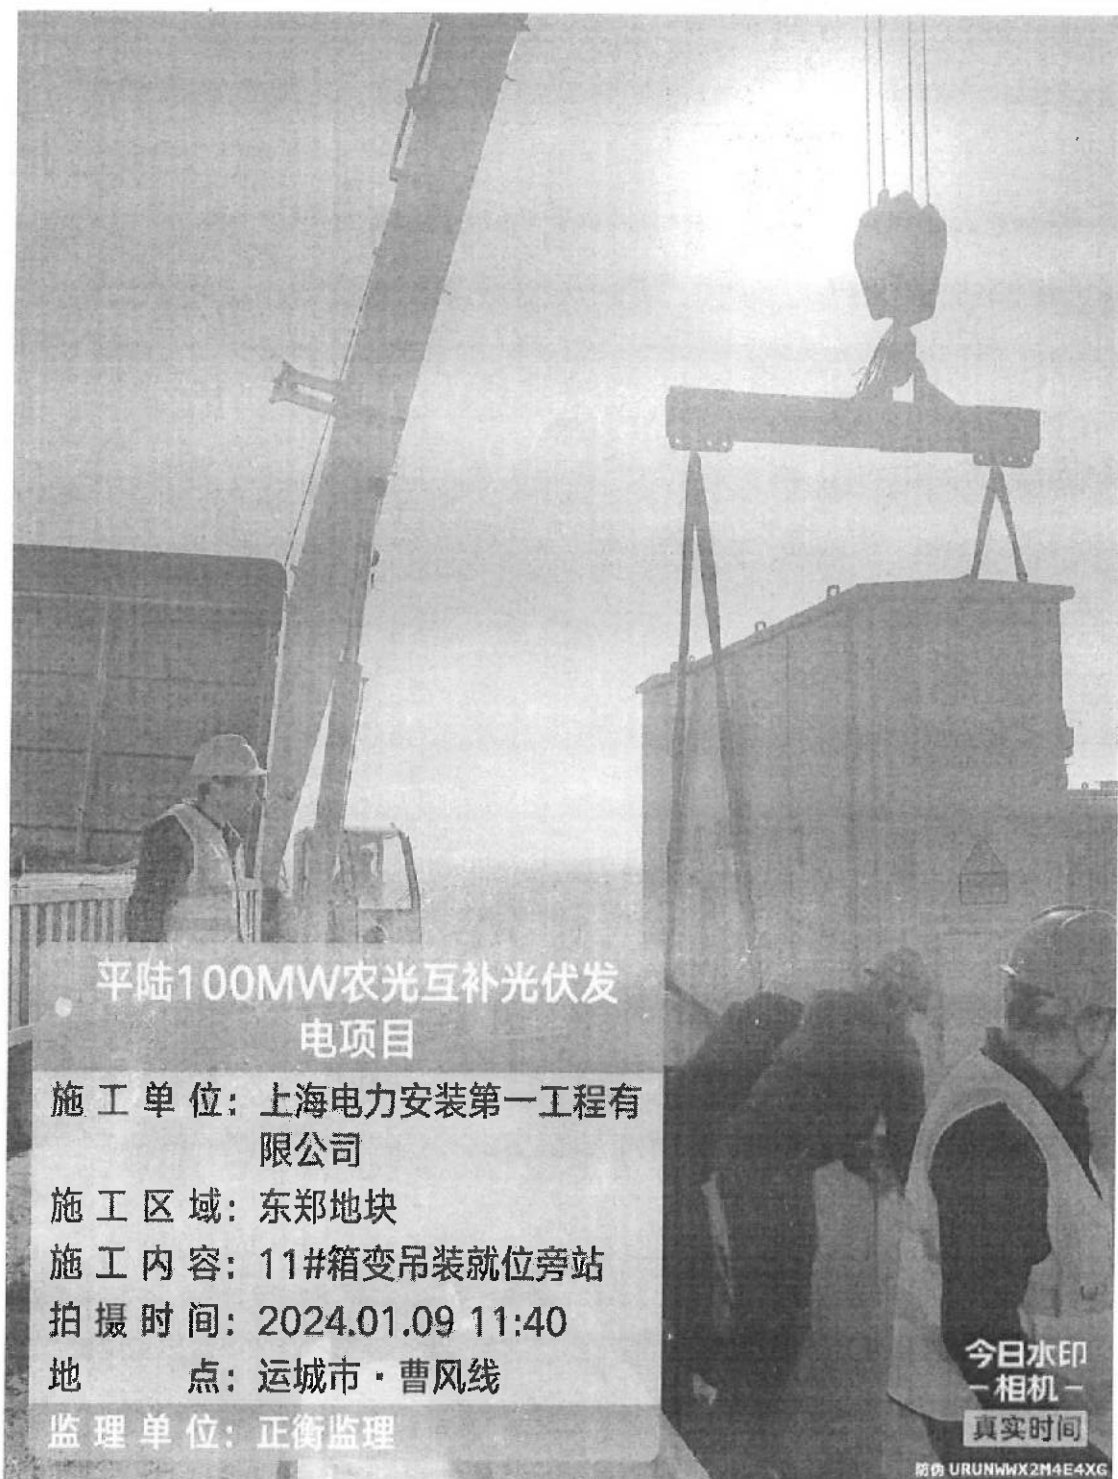

平陆100MW农光互补光伏发电项目

施工单位：上海电力安装第一工程有限公司

施工区域：东郑地块

施工内容：11#箱变吊装就位旁站

拍摄时间：2024.01.09 11:40

地点：运城市·曹风线

监理单位：正衡监理

今日水印
—相机—
真实时间

防伪 URUNWXX2M4E4XG
