

旁站监理记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JL-PZ-35

旁站的关键部位、关键工序	东郑光伏区15#、18# 19#区域方阵地锚桩浇筑	施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023年 10月 16日 07时 50分	旁站结束时间	2023年 10月 16日 18时 00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

一、施工情况：

- 1、当班施工负责人：1人、质量、安全专职人员：2人、1人；
- 2、当班施工作业人员共计：33人；其中振捣、下料各：3人、30人、泵送等特岗专业操作：1人；
- 3、砼浇筑施工机械设备和施工用料、水、电等准备工作到位情况：已到位☒未到位☐；
- 4、砼设计强度等级：C30；砼材料与配合比报告是否经检验试验：是☒否☐；砼计量检测等器具是否经检验备齐：是☒否☐；
- 5、桩孔是否清理干净：是☒否☐；
- 6、运输罐车：2台；输送泵车：1台，搅拌机：1台，商砼供货单位：平陆丰源混凝土拌合有限公司；
- 7、砼浇筑采用1.4米和3米长插入式振动棒：2台、1台；
- 8、砼浇筑从 06:40 开始至 18:20 完成，当班浇筑数量：16.97 m3。

二、监理情况：

- 1、孔深、桩间距等验收是否符合设计要求：是☒否☐；
- 2、检查混凝土浇筑前是否进行安全技术交底：是☒否☐；
- 3、检查混凝土振捣是否符合要求：是☒否☐；
- 4、检查保护帽振捣收光是否符合要求：是☒否☐；
- 5、检查地锚桩外露钢管长度是否符合设计要求：是☒否☐；
- 6、当班砼塌落度抽样检测：2次，检测值：182mm、196mm（设计值：160 mm 至 200 mm）；
- 7、当班砼制作试块（见证取样）标养试块 1 组，同条件试块 1 组，共计 2 组。


旁站发现的问题及处理情况：19#区域地锚桩浇筑有两根前后立柱桩保护帽偏离桩中心分别为90mm、80mm，现场要求施工方整改，重新做保护帽，并要求阵列桩浇筑前拉通线定桩中心以及调桩垂直度，整改符合要求。

旁站监理人员（签字）：

100武

2023年 10月 16日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

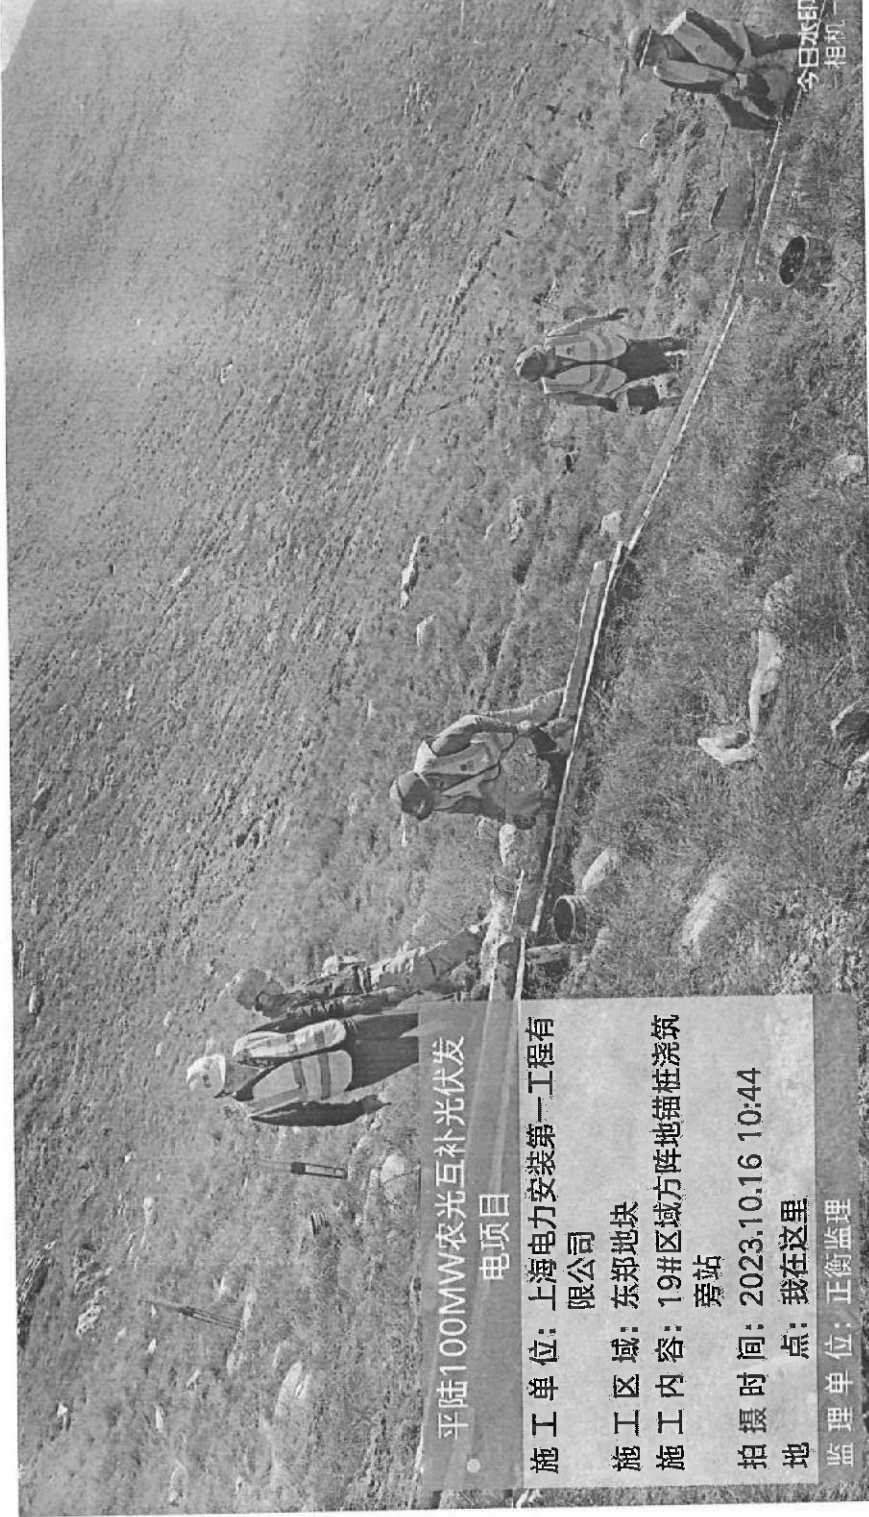

今日水印相机

平陆100MW农光互补光伏发电

电项目

施工单位: 上海电力安装第一工程有

限公司

施工区域: 东郊地块

施工内容: 19#区域方阵地锚桩浇筑

旁站

拍摄时间: 2023.10.16 10:44

地点: 我在这里

监理单位: 正衡监理
