

旁站监理记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JL-PZ-36

旁站的关键部位、关键工序	东郑光伏区15#、19# 区域方阵地锚桩浇筑	施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023年 10月 17日 08时 00分	旁站结束时间	2023年 10月 17日 11时 45分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

一、施工情况：

- 1、当班施工负责人： 1人 、 质量、安全专职人员： 2人 、 1人 ；
- 2、当班施工作业人员共计： 33 人；其中振捣、下料各： 2 人、 31 人、泵送等特岗专业操作： — 人；
- 3、砼浇筑施工机械设备和施工用料、水、电等准备工作到位情况：已到位 ☒ 未到位 ☐ ；
- 4、砼设计强度等级： C30 ；砼材料与配合比报告是否经检验试验：是 ☒ 否 ☐ ；砼计量检测等器具是否经检验备齐：是 ☒ 否 ☐ ；
- 5、桩孔是否清理干净：是 ☒ 否 ☐ ；
- 6、运输罐车： 1 台；输送泵车 — 台，搅拌机 — 台，商砼供货单位： 平陆丰源混凝土拌合有限公司 ；
- 7、砼浇筑采用 3米和1.4米 长插入式振动棒： 各1 台；
- 8、砼浇筑从 06:50 开始至 12:00 完成，当班浇筑数量： 6.23 m³。


二、监理情况：

- 1、孔深、桩间距等验收是否符合设计要求：是 ☒ 否 ☐ ；
- 2、检查混凝土浇筑前是否进行安全技术交底：是 ☒ 否 ☐ ；
- 3、检查混凝土振捣是否符合要求：是 ☒ 否 ☐ ；
- 4、检查保护帽振捣收光是否符合要求：是 ☒ 否 ☐ ；
- 5、检查地锚桩外露钢管长度是否符合设计要求：是 ☒ 否 ☐ ；
- 6、当班砼塌落度抽样检测： 两 次，检测值： 177mm、170mm （设计值： 160 mm 至 200 mm）；
- 7、当班砼制作试块（见证取样）标养试块 — 组，同条件试块 — 组，共计 两 组。

旁站发现的问题及处理情况： 无

旁站监理人员（签字）： 邵武 2023年 10月 17日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

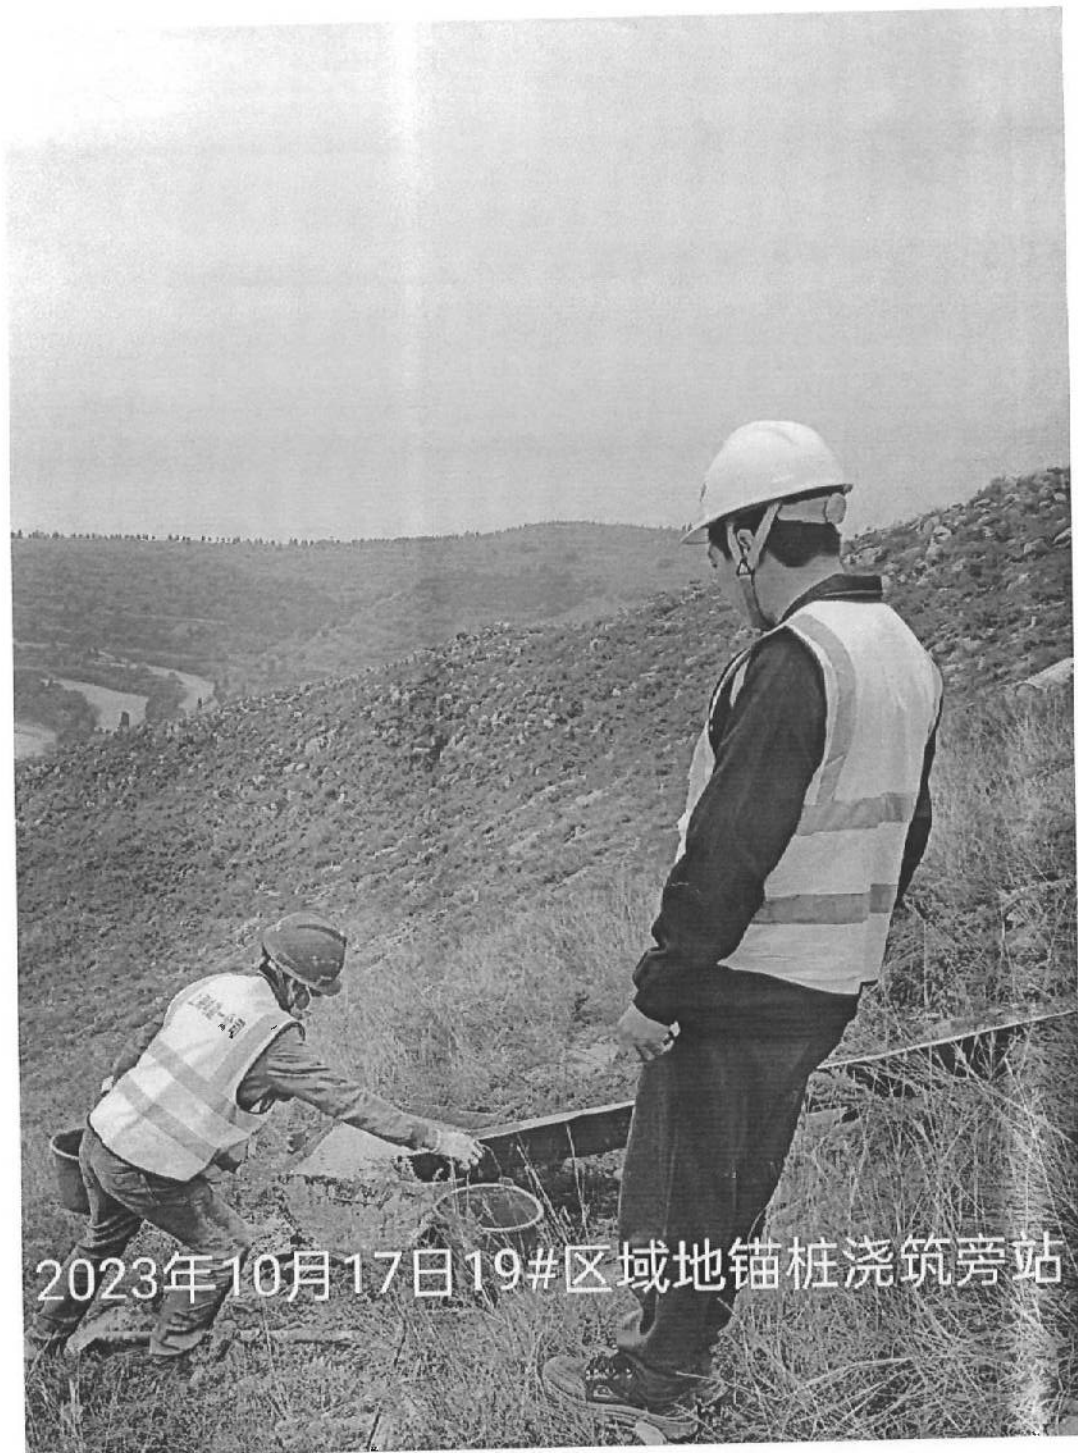

2023年10月17日19#区域地锚桩浇筑旁站
