

# 旁站监理记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JL-PZ-16

|              |                           |        |                           |
|--------------|---------------------------|--------|---------------------------|
| 旁站的关键部位、关键工序 | 东郑光伏区9#、11#、13#区域方阵地锚桩浇筑  | 施工单位   | 上海电力安装第一工程有限公司            |
| 旁站开始时间       | 2023年 09 月 08 日 07 时 50 分 | 旁站结束时间 | 2023年 09 月 08 日 17 时 00 分 |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

## 一、施工情况：

- 1、当班施工负责人：1人、质量、安全专职人员：2人、1人；
- 2、当班施工作业人员共计：30人；其中振捣、下料各：2人、28人、泵送等特岗专业操作：1人；
- 3、砼浇筑施工机械设备和施工用料、水、电等准备工作到位情况：已到位 ☒ 未到位 ☐；
- 4、砼设计强度等级：C30；砼材料与配合比报告是否经检验试验：是 ☐ 否 ☐；砼计量检测等器具是否经检验备齐：是 ☒ 否 ☐；
- 5、桩孔是否清理干净：是 ☒ 否 ☐；
- 6、运输罐车：1台；输送泵车：1台，搅拌机：1台，商砼供货单位：平陆丰源混凝土拌合有限公司；
- 7、砼浇筑采用 1.4 米长插入式振动棒：2台；
- 8、砼浇筑从 7:10 开始至 18:30 完成，当班浇筑数量：8.85 m<sup>3</sup>。

## 二、监理情况：

- 1、孔深、桩间距等验收是否符合设计要求：是 ☒ 否 ☐；
- 2、检查混凝土浇筑前是否进行安全技术交底：是 ☐ 否 ☐；
- 3、检查混凝土振捣是否符合要求：是 ☒ 否 ☐；
- 4、检查保护帽振捣收光是否符合要求：是 ☒ 否 ☐；
- 5、检查地锚桩外露钢管长度是否符合设计要求：是 ☒ 否 ☐；
- 6、当班砼塌落度抽样检测：两次，检测值：190mm、182mm（设计值：160 mm 至 200 mm）；
- 7、当班砼制作试块（见证取样）标养试块 1 组，同条件试块 1 组，共计 2 组。


旁站发现的问题及处理情况：9#区域方阵地锚桩浇筑工人私自对混凝土搅拌料加水，导致混凝土强度及坍落度不符合要求，要求施工方暂停浇筑，对此盘搅拌的混凝土要求作废处理。

旁站监理人员（签字）：



2023 年 09 月 08 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

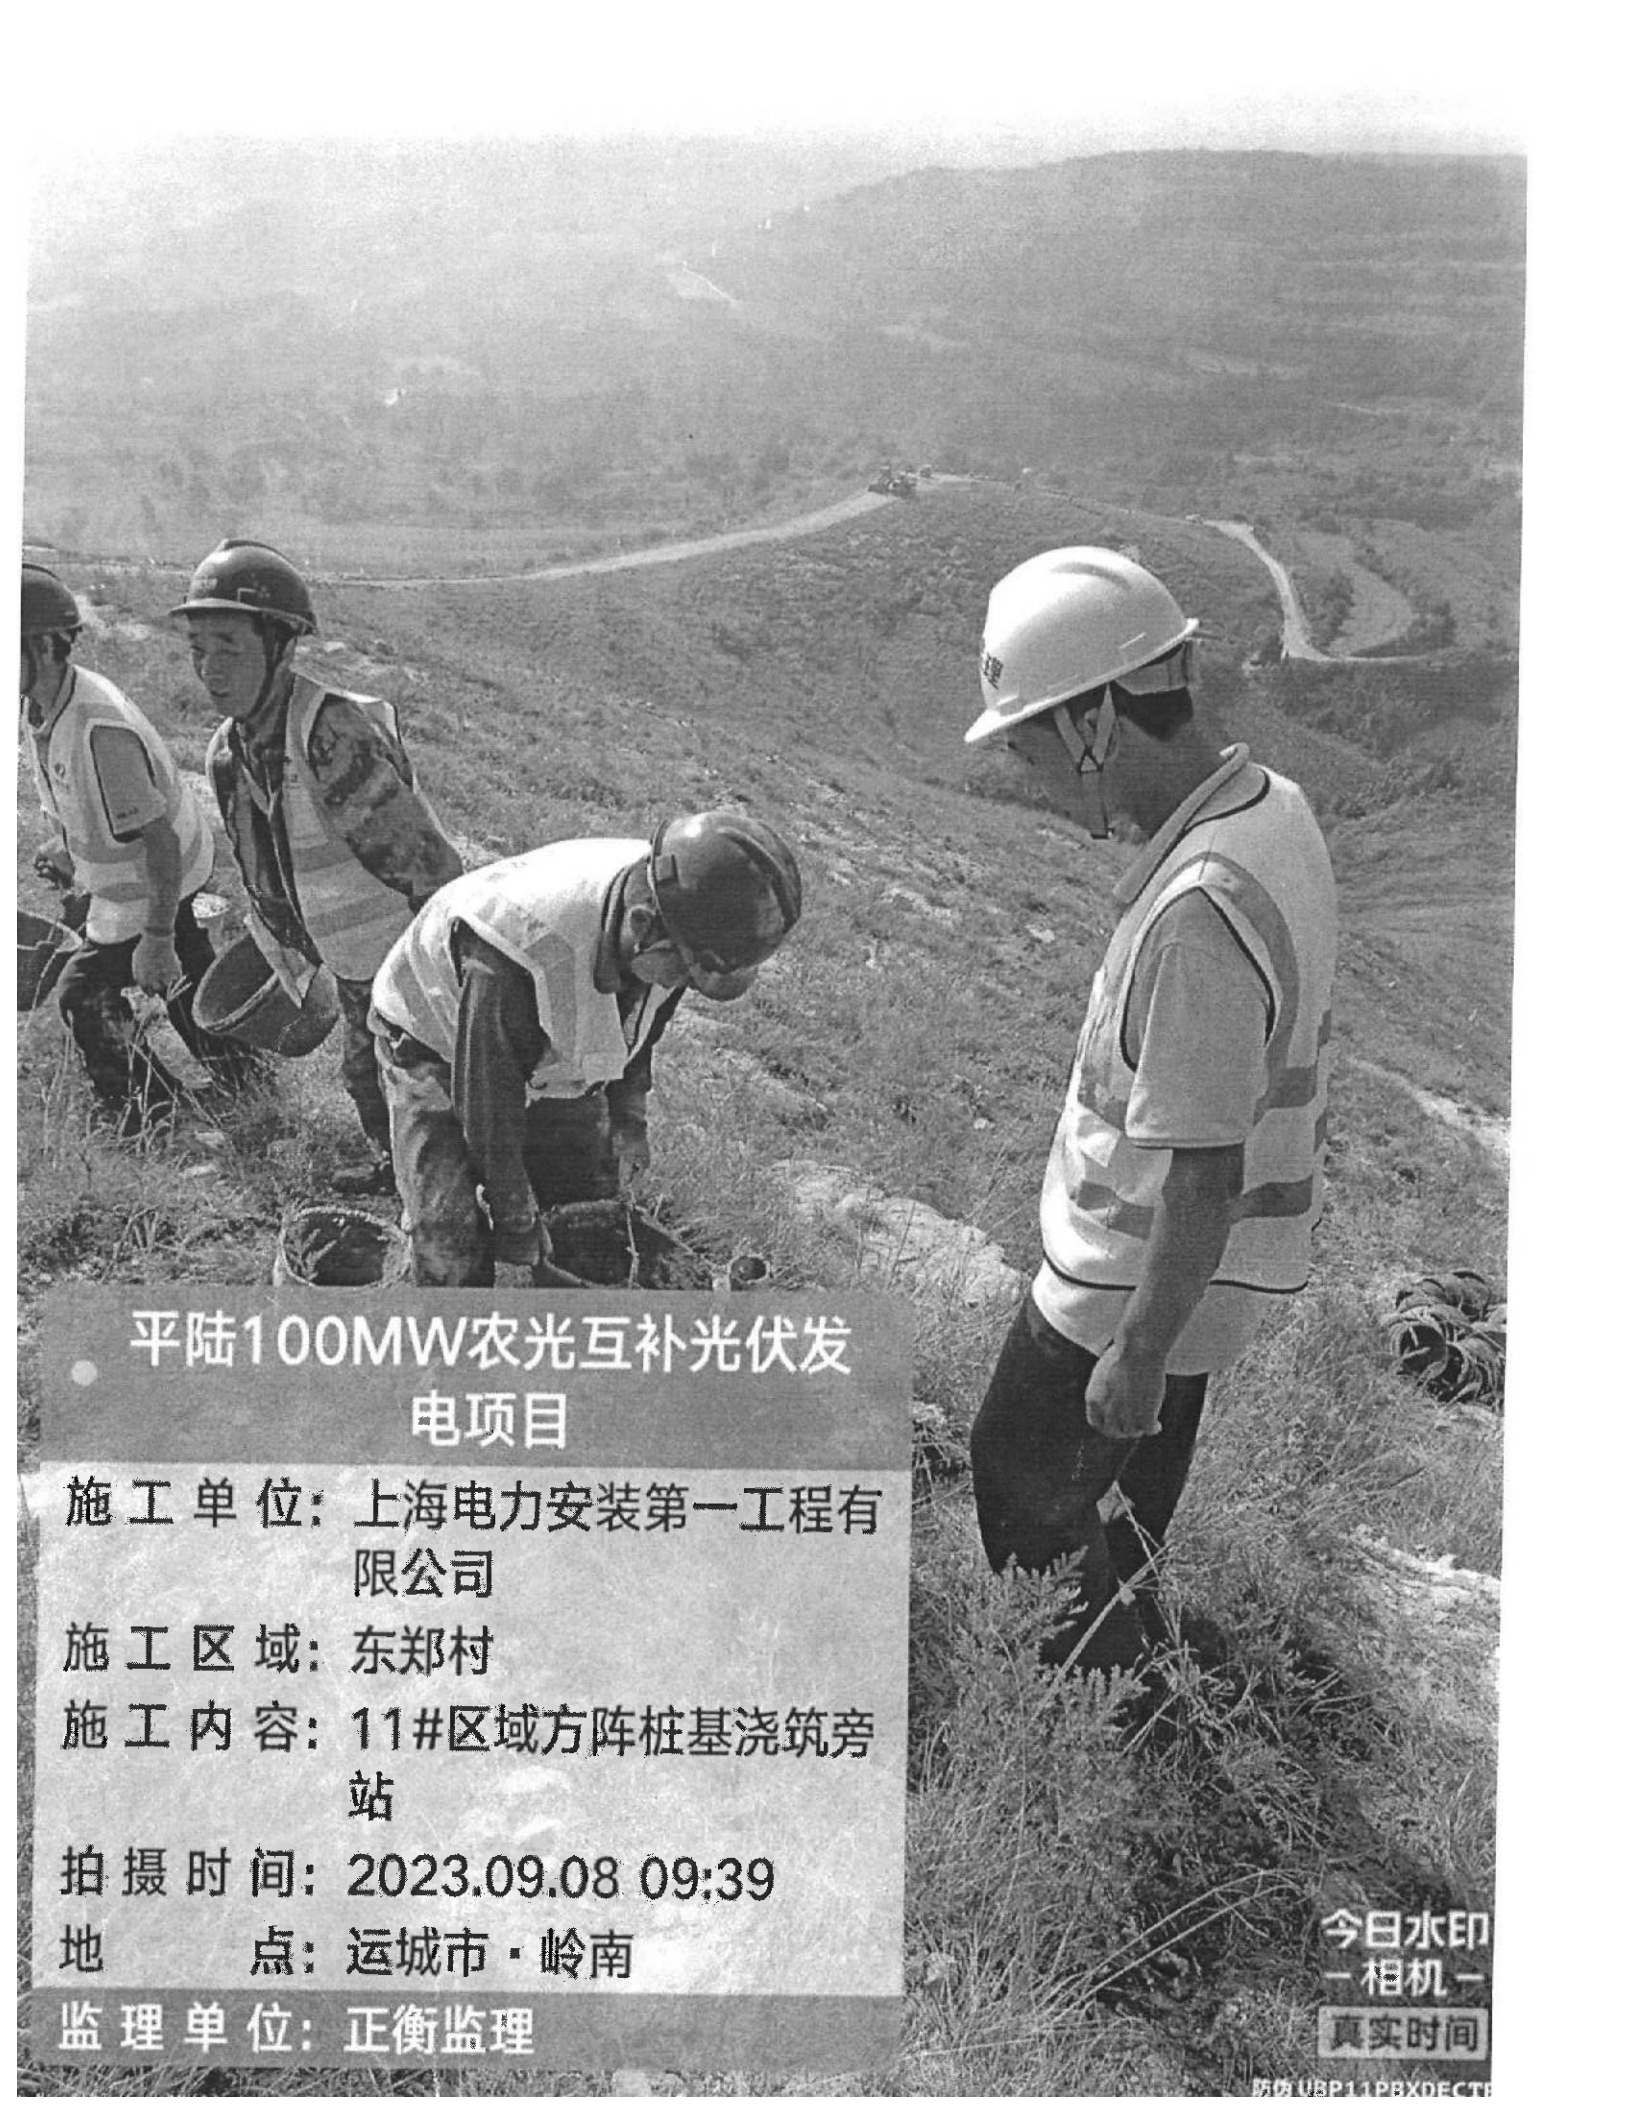

## 平陆100MW农光互补光伏发电项目

施工单位：上海电力安装第一工程有限公司

施工区域：东郑村

施工内容：11#区域方阵桩基浇筑旁站

拍摄时间：2023.09.08 09:39

地点：运城市·岭南

监理单位：正衡监理

今日水印  
— 相机 —  
真实时间

防伪 USP11PBXDECT
