

旁站监理记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JL-PZ-07

旁站的关键部位、关键工序	东郑光伏区 22# 区域方阵地锚桩浇筑	施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023年 08月 30日 8 时 分	旁站结束时间	2023年 08月 30日 18 时 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

一、施工情况：

- 1、当班施工负责人： 王 、 质量、安全专职人员： 王 、 王 ；
- 2、当班施工作业人员共计： 35 人；其中振捣、下料各： 2 人、 33 人、泵送等特岗专业操作： 1 人；
- 3、砼浇筑施工机械设备和施工用料、水、电等准备工作到位情况：已到位 ☒ 未到位 ☐ ；
- 4、砼设计强度等级： C30 ；砼材料与配合比报告是否经检验试验：是 ☒ 否 ☐ ；砼计量检测等器具是否经检验备齐：是 ☒ 否 ☐ ；
- 5、桩孔是否清理干净：是 ☒ 否 ☐ ；
- 6、运输罐车： 1 台；输送泵车 1 台，搅拌机 1 台，商砼供货单位： 平陆丰源混凝土拌合有限公司 ；
- 7、砼浇筑采用 2m、1.5m 米长插入式振动棒：各 1 台；
- 8、砼浇筑从 7:30 开始至 18:30 完成，当班浇筑数量： 3.36 m³。

二、监理情况：


- 1、孔深、桩间距等验收是否符合设计要求：是 ☒ 否 ☐ ；
- 2、检查混凝土浇筑前是否进行安全技术交底：是 ☒ 否 ☐ ；
- 3、检查混凝土振捣是否符合要求：是 ☒ 否 ☐ ；
- 4、检查保护帽振捣收光是否符合要求：是 ☒ 否 ☐ ；
- 5、检查地锚桩外露钢管长度是否符合设计要求：是 ☒ 否 ☐ ；
- 6、当班砼塌落度抽样检测： 2 次，检测值： 170mm 、 176mm （设计值： 160 mm 至 200 mm）；
- 7、当班砼制作试块（见证取样）标养试块 1 组，同条件试块 1 组，共计 2 组。

旁站发现的问题及处理情况： 有 4 个保护帽偏离板中心，要求偏离的保护帽拆除，按我定位重新浇筑。

旁站监理人员（签字）： 王

2023年 08 月 30 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

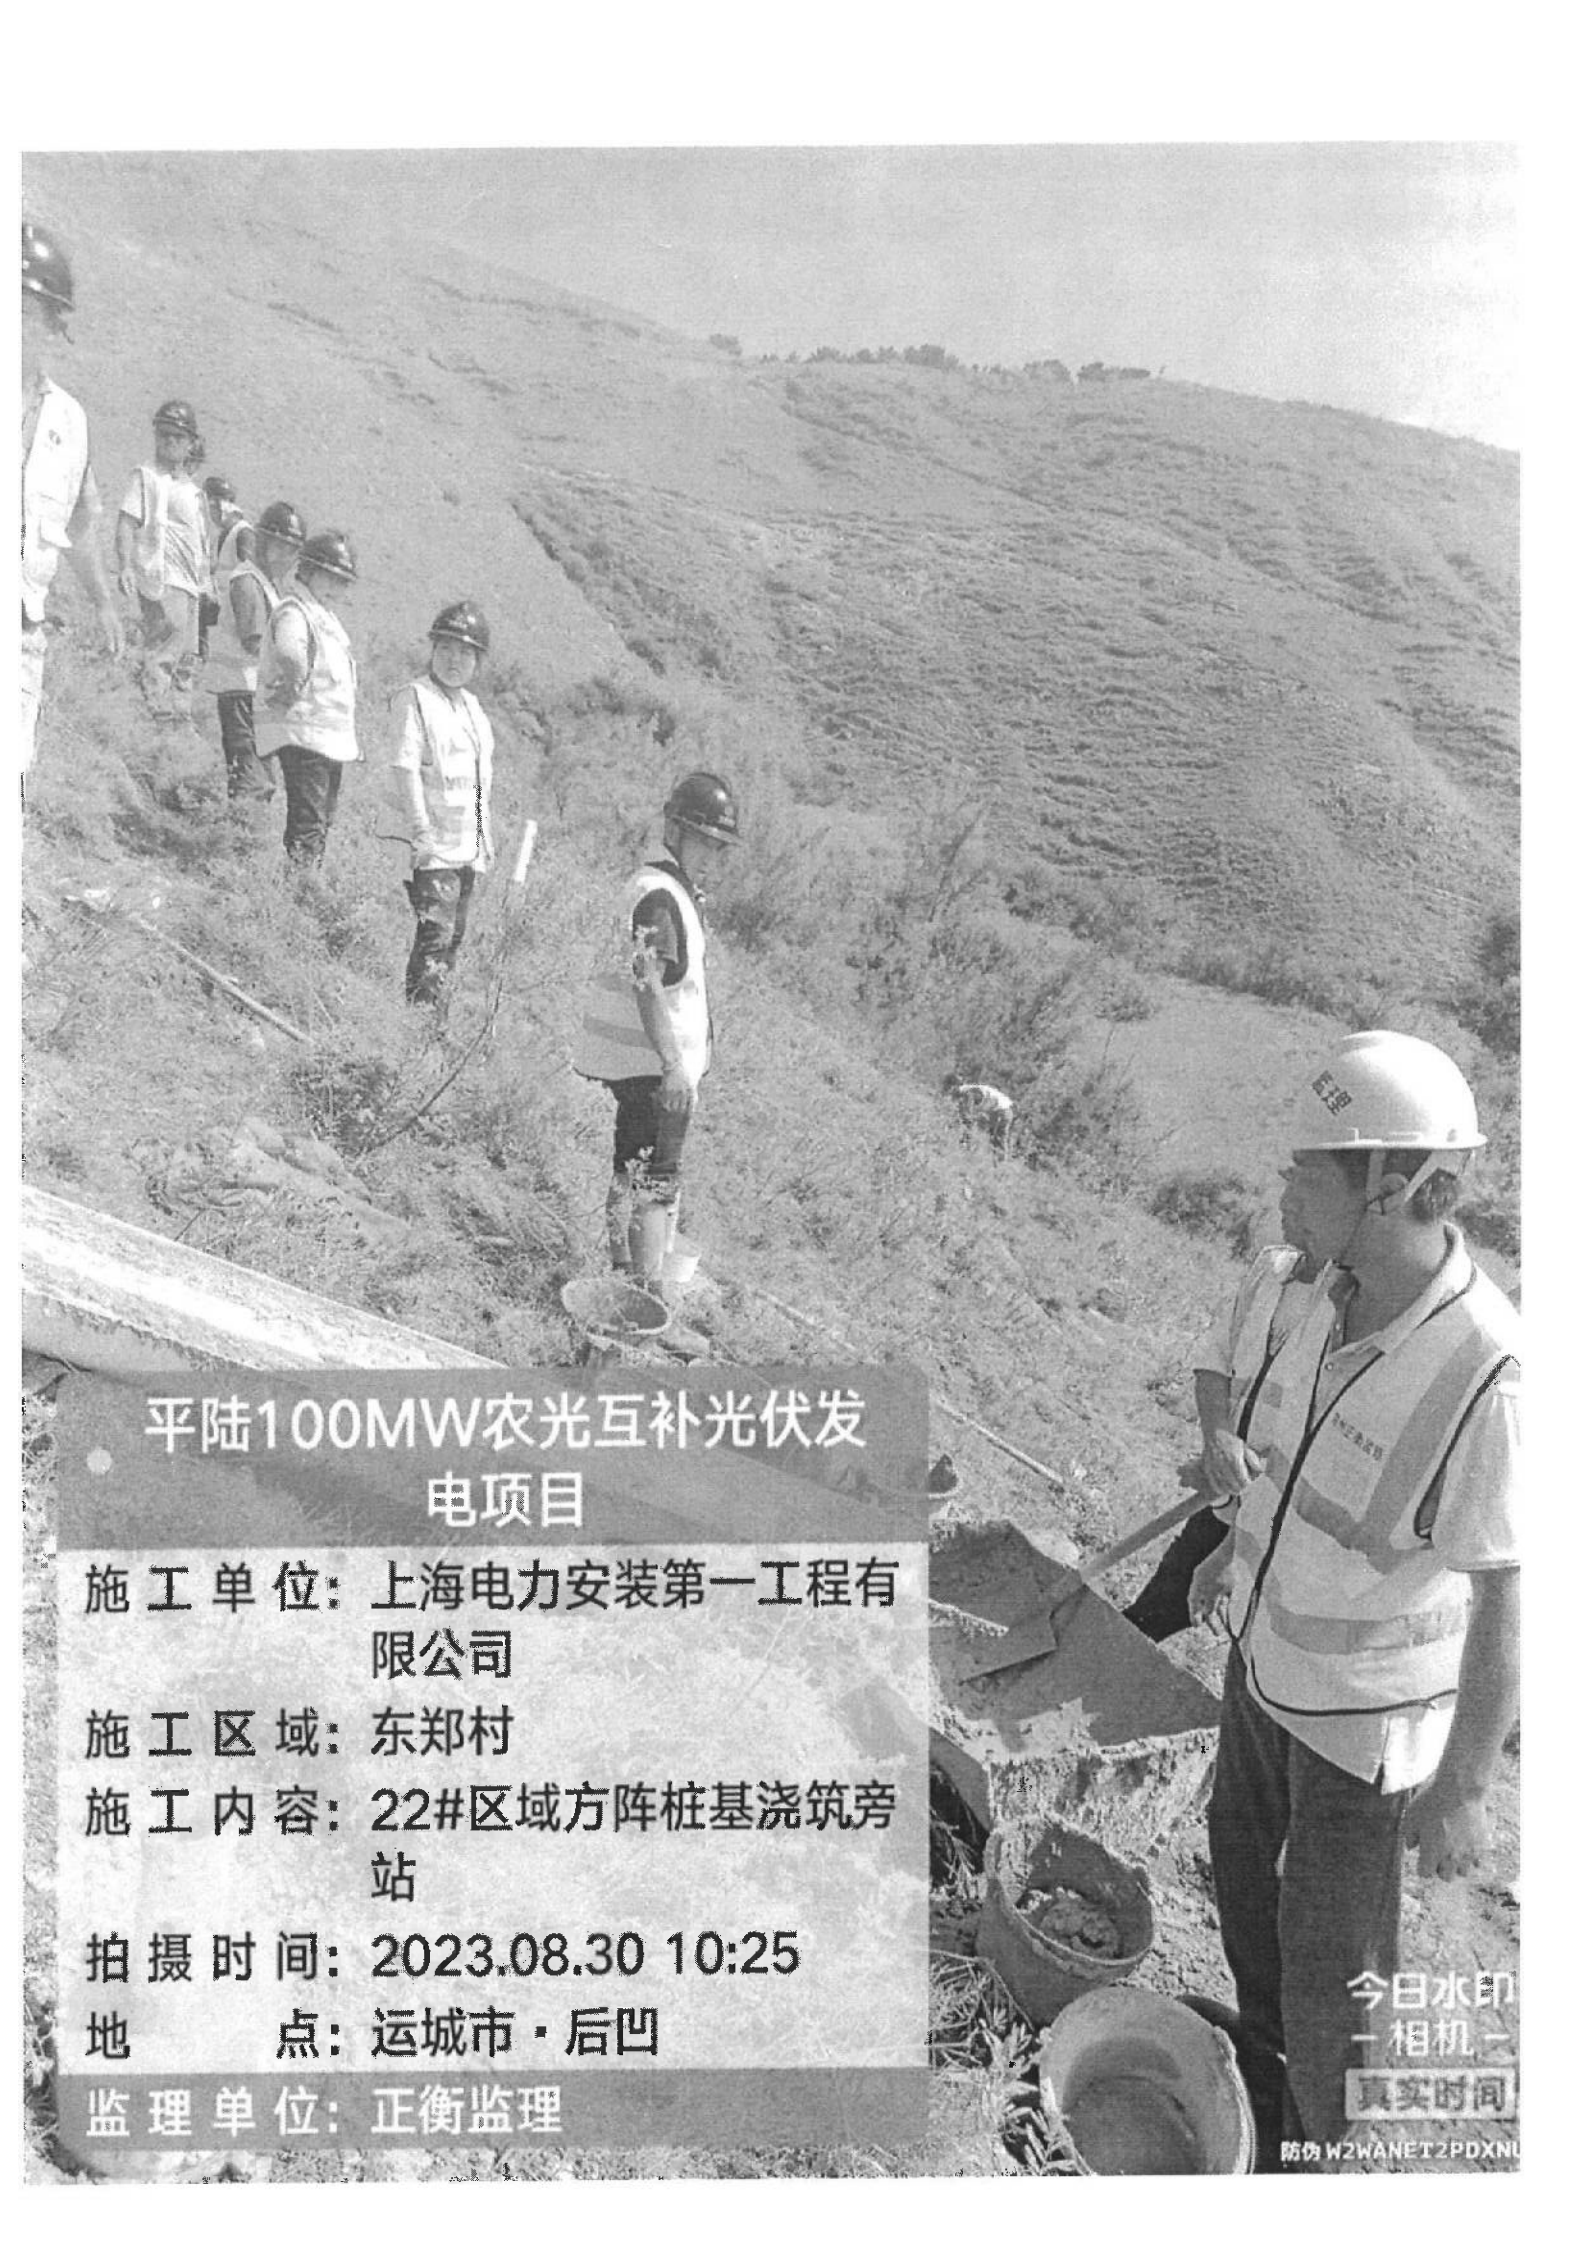

平陆100MW农光互补光伏发电项目

施工单位：上海电力安装第一工程有限公司

施工区域：东郑村

施工内容：22#区域方阵桩基浇筑旁站

拍摄时间：2023.08.30 10:25

地点：运城市·后凹

监理单位：正衡监理

今日水印
—相机—

真实时间

防伪 W2WANET2PDXNU
