

旁站监理记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JL-PZ-48

旁站的关键部位、关键工序	东郑光伏区 10 #箱变基础圈梁、顶板、梁、构造柱浇筑混凝土	施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023年 11 月 22 日 15 时 00 分	旁站结束时间	2023年 11 月 22 日 17 时 20 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

一、施工情况：

- 1、当班施工负责人：1人、质量、安全专职人员：1人、1人；
- 2、当班施工作业人员共计：5人；其中振捣、下料各：1人、4人、泵送等特岗专业操作：1人；
- 3、砼浇筑施工机械设备、工具和施工用料、水、电等准备工作到位情况：已到位 ☒ 未到位 ☐；
- 4、砼设计强度等级：C30；砼材料与配合比报告是否经检验试验：是 ☒ 否 ☐；砼计量检测等器具是否经检验备齐：是 ☒ 否 ☐；
- 5、运输罐车：1台；输送泵车：1台，搅拌机：1台，商砼供货单位：平陆丰源混凝土拌合有限公司；
- 6、砼浇筑采用 3 米长插入式振动棒：1台；
- 7、砼浇筑从 15:00 开始至 17:20 完成，当班浇筑数量：330 m³。

二、监理情况：

- 1、钢筋、模板验收是否符合设计要求：是 ☒ 否 ☐；
- 2、检查混凝土浇筑前是否进行安全技术交底：是 ☒ 否 ☐；
- 3、检查混凝土振捣是否符合要求：是 ☒ 否 ☐；
- 4、检查混凝土面收光是否符合要求：是 ☒ 否 ☐；
- 5、检查预埋件位置是否符合设计要求：是 ☒ 否 ☐；
- 6、当班砼塌落度抽样检测：1次，检测值：190 cm（设计值：160 cm 至 200 cm）；
- 7、当班砼制作试块（见证取样）抗压试块 1 组，抗渗试块 1 组，同条件试块 1 组，共计 3 组。


旁站发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：



2023年 11 月 22 日

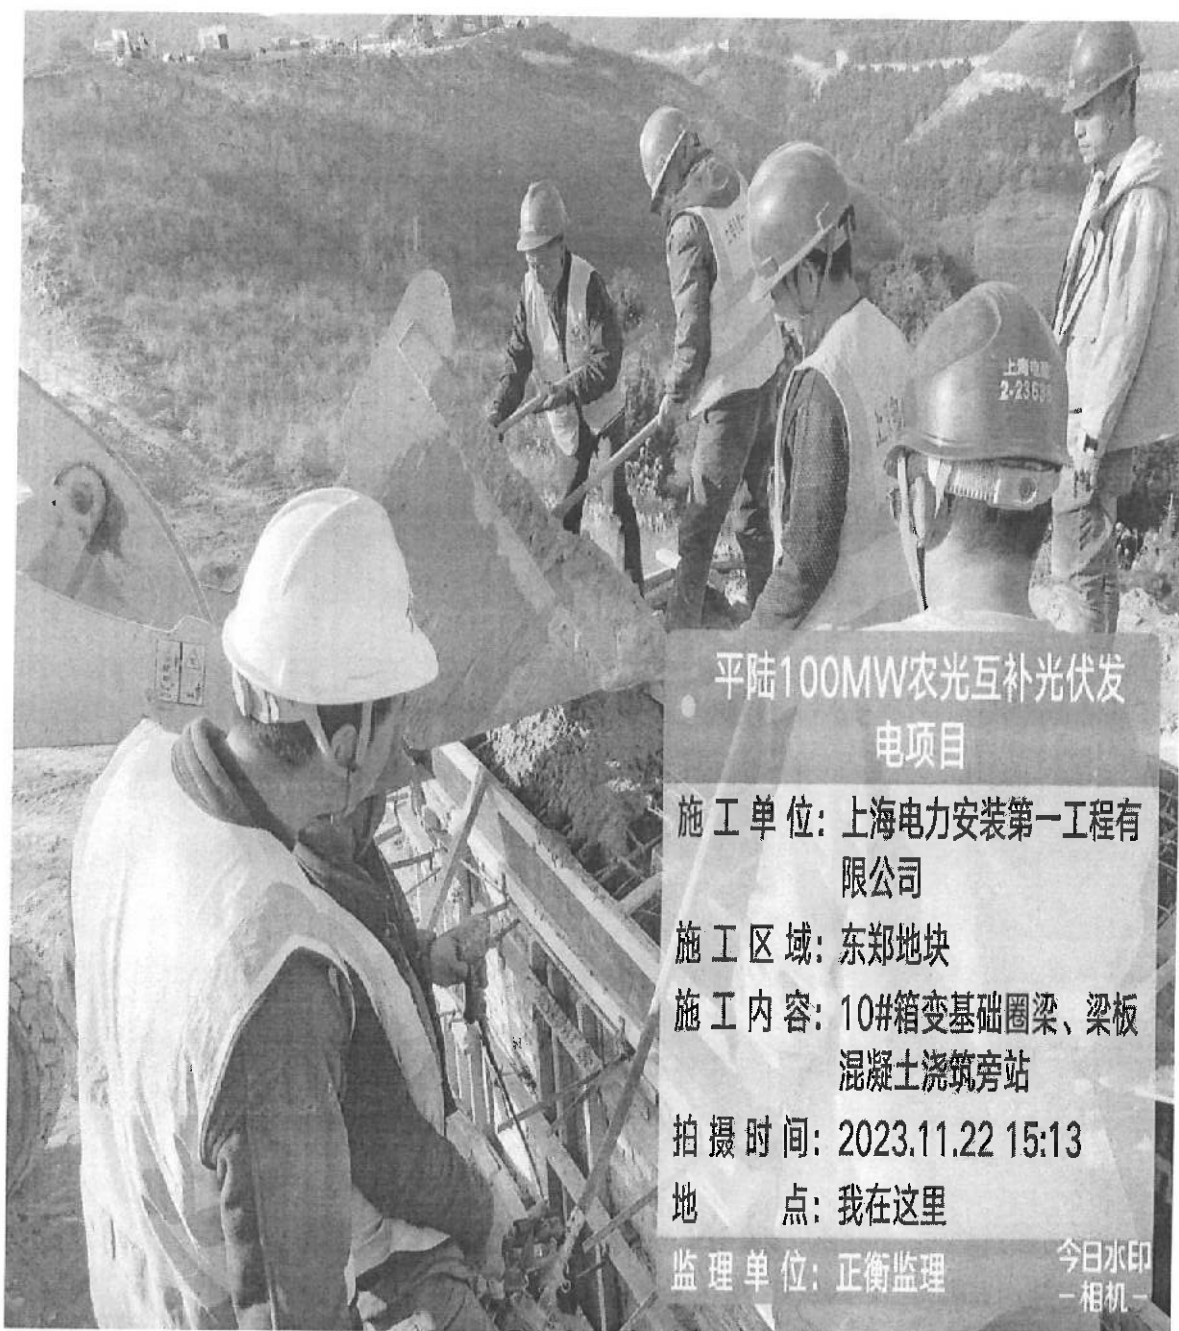

平陆100MW农光互补光伏发电项目

施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司

施工区域: 东郑地块

施工内容: 10#箱变基础圈梁、梁板
混凝土浇筑旁站

拍摄时间: 2023.11.22 15:13

地点: 我在这里

监理单位: 正衡监理

今日水印
—相机—
