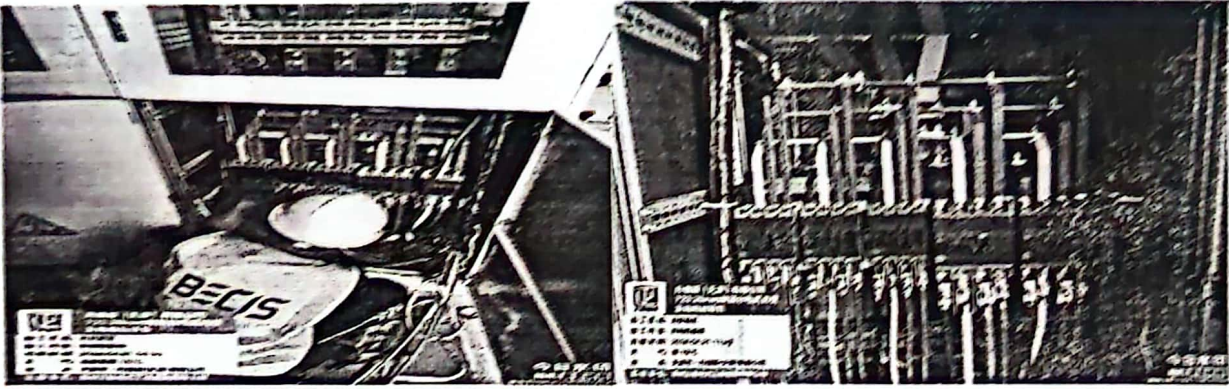


电气旁站监理记录表

希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

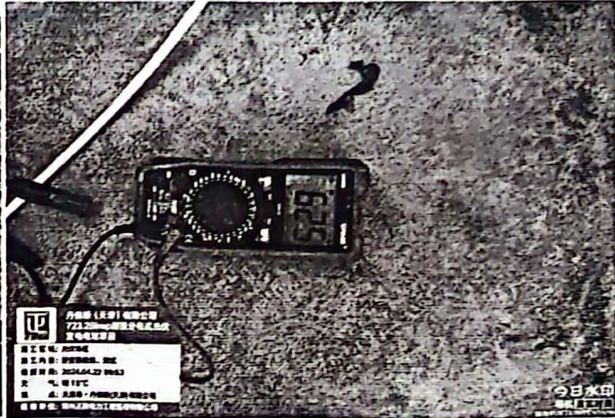


编号: ZHJL-DQPZ-001

日期及气候: 2024.04.21 晴	工程地点: 天津丹佛斯福源道厂区
旁站监理的部位及工序: 并网柜接线、并柜	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 6 人。 3、检查集电母排、电压及规格。 4、铜排连接制作符合规范要求。 5、接地线联接牢固。 6、外观检查整齐有序、固定强度符合要求。 7、施工人员良好制作工艺。	
	
监理情况: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。 施工器具和材料已准备完成。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品	
发生情况: 无	
处理意见: 无	
施工企业: 浙江华伏太阳能科技有限公司 项目部 (签字):  2024年4月21日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字):  2024年4月21日

电气旁站监理记录表

希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

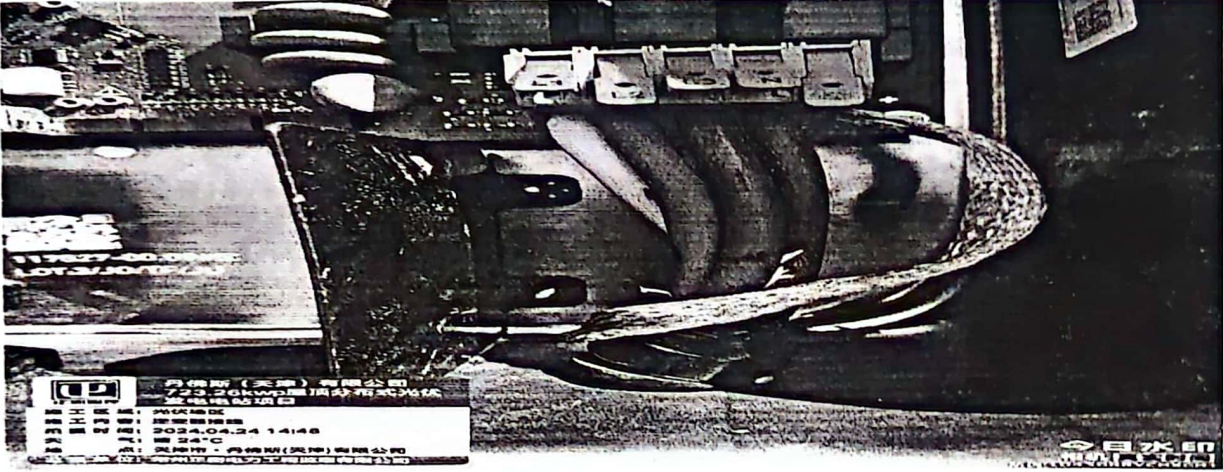
编号: ZHJL-DQPZ-002

日期及气候: 2024. 04. 22 晴	工程地点天津丹佛斯福源道厂区
旁站监理的部位及工序: 逆变器直流侧接线、测试	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 <u>4</u> 人。 3、检查电缆型号、电压及规格。 4、电缆绝缘检查。 5、接线端子压接牢固, 电缆头头制作符合规范要求。 6、施工人员良好制作工艺。 	
监理情况: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。 施工器具和材料已准备完成。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品	
发生情况:无	
处理意见:无	
施工企业: 浙江华伏太阳能科技有限公司	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司
项目部(签字):  2024年4月22日	旁站监理人员(签字):  2024年4月22日

电气旁站监理记录表

希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DQPZ-003

日期及气候: 2024.04.22 晴	工程地点天津丹佛斯福源道厂区
旁站监理的部位及工序: 逆变器交流侧接线、测试	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 <u>4</u> 人。 3、检查电缆型号、电压及规格。 4、电缆绝缘检查。 5、接线端子压接检查。 6、施工人员良好制作工艺。 	
监理情况: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。 施工器具和材料已准备完成。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品	
发生情况: 5NB02号逆变器交流电缆接线部位与电缆型号不适配, 电缆头无法制作。	
处理意见: 与逆变器厂家沟通对接线部位做结构性调整或更换逆变器, 此事情处理结束前此逆变器禁止并网发电。	
施工企业: 浙江华伏太阳能科技有限公司 项目部 (签字):  2024年4月22日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字):  2024年4月22日
